


PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES

DANS LA REGION DU CENTRE DE LA RD CONGO

« PRISE »

Rapport Annuel d'Avancement d'Activités 2017

Carte représentant la zone du projet

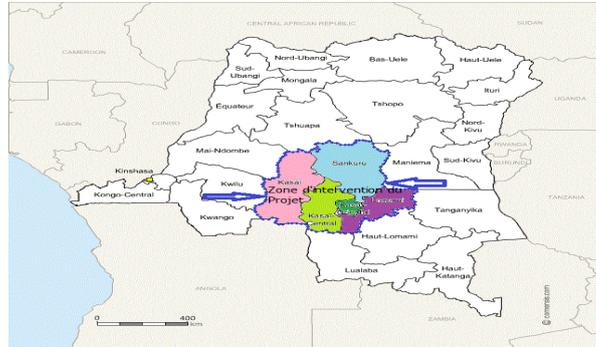

EP Domiongo/Mweka (situation avant)

EP Domiongo (situation après travaux)

Travaux de construction des écoles, centres de santé et latrines en cours

Période du rapport : Du 01 janvier au 31 décembre 2017

Un projet du :

Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC)



Financé par :

La Banque Africaine de Développement (BAD)



Février 2018

A. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET	41
B. SATISFACTION DES CONDITIONS DES PRETS ET DONNS.	42
C. EVENEMENTS SAILLANTS AU 31 DECEMBRE 2017.	44
D. Contrats signés par PRISE au 31 décembre 2017	45
E. Activités sans engagements au 31 décembre 2017	65
F. QUELQUES PHOTOS RECENTES DES REALISATIONS DU PROJET	67

DONNÉES DU RAPPORT

RAPPORT D'AVANCEMENT D'ACTIVITES			
Titre, sigle et code du projet : Projet de Renforcement des Infrastructures Socio- Economiques « PRISE ». RDC-BAD : P-CD-E00-002		Agence d'Exécution : Unité d'Exécution du Projet/ Ministère du Développement Rural - Secrétariat Général du Développement Rural	
Secteur : AEPA ; EDUCATION <i>ET</i> SANTE		Date du dernier rapport : le 15 Novembre 2017	
Type de rapport : Rapport annuel <i>d'activités 2017</i>		Période : 01 Janvier au 31 Décembre 2017	
		Niveau : National	
Date de démarrage des activités du projet :		Date d'achèvement des activités du projet :	
Prévue : Janvier 2014		Effective : 15 juillet 2014	
		Estimation initiale : 30 novembre 2018	
		Estimation actuelle : Novembre 2019	
		Dernier décaissement :	
		Estimation initial : 30 juin 2019	
		Estimation actuelle : 30 Juin 2020	

TABLE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES

ACE	Agence Congolaise de l'Environnement
AEP	Alimentation en eau potable
AEPA	Alimentation en eau potable et assainissement
AGR	Activités Génératrices des Revenus
AMI	Avis à manifestation d'intérêt
ANO	Avis de non objection
AO	Appel d'offres
AOI	Appel d'offres international
AON	Appel d'offres national
APD	Avant-Projet Détaillé
APS	Avant-Projet Sommaire
AT	Assistance technique
BAD	Banque africaine de développement
CDFO	Congo Democratic Field Office
CEP –O	Cellule d'Exécution des Projets de la REGIDESO
CFEN	Consultation de fournisseurs à l'échelon national
CMFG ou CMG	Centre Multifonctionnel Genre
CN	Coordination Nationale
DAO	Dossier d'appel d'offres
DAOI	Dossier d'appel d'offres international
DAON	Dossier d'appel d'offres national
DNO	demande de l'avis de non objection
DP	Demande de Proposition
DPD	Demande de Paiement Direct
DSCRP	Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté
EIES	Etude d'impact environnemental et social
FAD	Fonds africain de développement
FEF	Facilité en Faveur des Etats Fragiles

GEFAE	Genre Famille et Enfant
HIMO	Haut intensité de main-d'œuvre
IEC	Information Education Communication
KFW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Coopération Financière Allemande)
KOC /KOCC	Kasaï Occidental
KOR	Kasaï Oriental
LBS	Liste des biens et services
LR	Liste Restreinte
MECNT	Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
MIN-ENER	Ministère de l'Energie
MI	Manifestation d'Intérêt
ODD	Objectifs de Développement Durable
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
OVD	Office de Voirie et Drainage
PGES	Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PM	Passation des Marchés
PNA/DAS	Programme National d'Assainissement/Direction d'Assainissement du MECNT
PNSD	Plan National Stratégique de Développement
PTBA	Programme de Travail et Budget Annuel
REGIDESO	Régie de Distribution d'Eau de la RD Congo
RWSSI	Rural Water Supply and Sanitation Initiative
ST	Spécifications Techniques
TDR	Termes de référence
UC	Unité de compte (du Groupe de la Banque africaine de développement)
UEP	Unité d'Exécution du Projet
USD	United States Dollar (Dollar Américain)

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des Accords qui régissent le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques (PRISE), ce dernier a l'obligation de présenter un rapport annuel d'activités suivant les **prévisions initiales du projet** mentionnées dans le rapport d'évaluation du Projet et le **Plan de Travail et Budget Annuel** adopté par le Comité de Pilotage et ayant reçu l'Avis de Non Objection de la BAD.

Le présent document est le rapport annuel pour l'année 2017 du projet qui a commencé en 2014 pour une durée prévisionnelle de cinq (5) ans avec un budget global de **105,178 millions d'UC équivalent à 158,184 millions USD** au moment de la signature de l'accord. Le Projet PRISE est financé par la BAD avec quatre (4) sources de financement (Prêt FAD, don FAD, RWSS Trust Fund et FEF). Ce rapport annuel 2017 du PRISE présente l'état d'avancement physique des activités du projet et les exécutions financières cumulées réalisées au 31 décembre 2017 ainsi qu'une analyse des activités réalisées en 2017.

Il convient de signaler que les accords pour la mise en œuvre du PRISE ont été signés le 07 janvier 2014 mais la mobilisation effective de l'équipe du projet n'a eu lieu que le 15 juillet 2014 et le premier décaissement n'est intervenu que le 07 octobre 2014. Ainsi, il faut souligner qu'au 31 décembre 2017, le projet a totalisé 40 mois d'opérationnalité, soit les 2/3 de la durée estimée de 60 mois. La mise en œuvre du PRISE connaît un retard causé notamment par :

- i. L'actualisation des études de l'AEP Mbuji-Mayi sous la gestion de la REGIDESO et le financement de la KFW qui ont pris deux ans, constituant un préalable à tout lancement du processus d'acquisition pour cette activité alors que les contraintes liées à ce processus n'étaient pas prises en compte dans le calendrier initial de mise en œuvre du Projet. Il faut noter qu'au cours de la mise en œuvre, il s'est avéré impératif techniquement de réaliser simultanément les travaux avec ceux financés par la KFW compte tenu de leur implication sur terrain mais aussi d'actualiser les études de 2004 qui n'étaient plus adaptées à l'évolution de la situation sur terrain ;
- ii. le retard dans le processus d'approbation, par la BAD, de certaines acquisitions, particulièrement les travaux d'AEP de Mbuji Mayi et les travaux d'AEP en milieu rural dont les coûts sont estimés à environ 45% du budget global du projet;
- iii. l'insécurité qui a duré plus de 10 mois dans la zone du projet (avec un arrêt des travaux dans la plupart des chantiers et une perturbation du calendrier des acquisitions des mobiliers scolaires et équipements médicaux) qui a sûrement retarder la date d'achèvement des activités du projet. **Cette situation mérite une attention particulière lors de la revue à mi-parcours ;**
- iv. Le retard dans le processus de mise en vigueur du Prêt qui a duré plus de 32 mois ;
- v. Le processus de validation des sites d'interventions, la durée des études géophysiques et des mini-réseaux et l'actualisation des études des infrastructures scolaires, des centres de santé et des latrines publiques ont décalé le calendrier initial de démarrage des travaux sur terrain ;
- vi. Le retard des certains ANO sur les activités importantes du Projet

Ces différentes raisons imprévues au début de la mise en œuvre du Projet ont impacté négativement et de façon significative la performance du Projet et entraîneront sans nul doute, la prorogation du délai d'exécution du Projet.

Il faut rappeler qu'au 31 décembre 2016, PRISE a connu un taux d'engagement de 20,4% (soit 32 277 521 USD), un cumul des décaissements de **16 877436 USD** soit un taux de décaissement de 10,7% par rapport au budget global du projet et un taux moyen d'exécution physique globale de 16,8%.

L'ensemble de contrats signés par PRISE représentent 48 575 859 **USD** au 31 décembre 2017 contre **32 227 521 USD en fin 2016**, soit des nouveaux engagements de **16 348 338 USD** ont été pris cette année, soit une augmentation de 50,1%. Le taux d'engagement par rapport au budget global du projet est actuellement de 30,7% et a connu une amélioration de 10 points de % par rapport à 2016 où ce taux était de 20,4%. Sur ces engagements, un montant de 27 489 956 **USD** a été payé, donc un taux de paiement de 56,6%, donc une augmentation de 4 points de % par rapport à 2016 où il était de 52,3%. Ces décaissements représentent un taux de décaissement de 17,4% par rapport au budget global contre 10,7% au 31 décembre 2016.

Le présent rapport, qui présentera l'état de mise en œuvre du PTBA 2017 et la situation des activités du projet au 31 décembre 2017, comprend essentiellement quatre parties :

- (i) la présentation du Projet ;
- (ii) l'exécution ou les réalisations du PRISE de 2014 à 2016 et la présentation du PTBA 2017;
- (iii) Situation des activités du projet au 31 décembre 2017 (suivi des marchés ; exécution financière, exécution physique, exécution du PTBA 2017, la prise en compte des aspects genre et environnementaux)
- (iv) Difficultés rencontrées

Le rapport se termine par une conclusion suivie des annexes suivantes

- a. Suivi de la mise en œuvre du projet.
- b. Satisfaction des conditions des prêts et dons.
- c. Evènements saillants au 31 décembre 2017.
- d. Les contrats signés au 31 décembre 2017.
- e. Les activités sans engagements au 31 décembre 2017
- f. Quelques photos des réalisations du PRISE

I. PRESENTATION DU PROJET

A. Aperçu général

Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques dans la région centre de la RDC (PRISE) fait partie des projets qui ont été conçus pour la mise en œuvre du plan de développement de la RDC de 2011 à 2015 : le DSCR II (Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté de deuxième génération). Le PRISE contribue à la réalisation du troisième pilier du DSCR II qui visait « l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain » en se concentrant sur l'Alimentation en Eau Potable (AEP), la construction des écoles, des centres de santé et des latrines publiques. Il faut signaler que le projet s'est aussi occupé de la voirie urbaine de Tshikapa en vue de protéger contre les érosions les conduites du système de l'AEP de cette ville.

I.A.1 Données synthèses du projet


Tableau 1 Données synthèses du PRISE

Libellé	Descriptif sommaire				
Pays	République Démocratique du Congo				
Titre du Projet :	Projet de renforcement des Infrastructures Socio - économiques.				
Numéro du Projet :	P-CD- E00-002				
Sources de financement	Prêt FAD :	Don FAD :	RWSSI	FEF	
Numéro des Dons et Prêt :	2100150030344	2100155026317	5800155001251	5900155005901	
Date d'approbation du Don/Prêt :	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	
Date de signature d'accord :	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	
Date d'entrée en vigueur :	13/07/2016	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	
Date d'entrée en vigueur du 1 ^{er} décaissement :		07/10/2014	07/10/2014		
Source/Coût total du projet :	(en USD)	(en UC)	Montant (en %)		
Prêt FAD :	2 218 341,00	1 475 000,00	1,40%		
Don FAD :	65 459 859,00	43 525 000,00	41,38%		
RWSSI (soit 5,9537 millions d'euros au taux de juillet 2013 de 1UC = 1,14982 €)	7 787 504,88	5 178 000,00	4,92%		
FEF	82 717 800,00	55 000 000,00	52,29%		
TOTAL	158 183 504,88	105 178 000,00	100%		
Sources de financement	Prévu/Affecté	Décaissement au 31 décembre 2017		Engagements au 31 décembre 2017	
	en USD	Montant en USD	en %/Prévu	en USD	%/Prévu
Prêt FAD :	2 218 721,05	1 900 767,74	85,67%	1 949 505,37	87,87%
Don FAD :	65 459 845,56	15 174 975,62	23,18%	17 881 272,18	27,32%
RWSSI	7 787 319,02	635 295,28	8,16%	1 478 033,35	18,98%
FEF	82 717 620,38	9 778 917,15	11,82%	27 226 729,18	32,92%
TOTAL	158 183 506,01	27 489 955,79	17,38%	48 535 540,08	30,68%
Composante	Montant Total	Décaissement au 31 décembre 2017		Engagé au 31 décembre 2017	
	Prévu/Affecté(en USD)	Montant en USD	% Prévu	Engagements en USD	%/Prévu
Infrastructures d'AEPA, Sanitaire et Scolaire:	135 366 670,65	20 065 569,28	14,82%	40 498 162,09	29,92%
Etudes et Renforcement des Capacités :	11 318 366,42	3 456 202,89	30,54%	3 577 693,92	31,61%
Gestion et Coordination du projet :	11 498 468,94	3 968 183,62	34,51%	4 459 684,07	38,79%
TOTAL	158 183 506,01	27 489 955,79	17,38%	48 535 540,08	30,68%
Catégorie des dépenses	Montant Total	Décaissement au 31 décembre 2017		Engagements au 31 décembre 2017	
	Prévu/Affecté(en USD)	Montant en USD	% Prévu	Engagements en USD	%/Prévu
Biens	19 643 636,44	3 344 145,51	17,02%	5 934 324,46	30,21%
Travaux	110 649 419,31	17 084 832,27	15,44%	34 893 388,93	31,54%
Services	19 719 885,40	2 557 915,33	12,97%	3 204 763,65	16,25%
Fonctionnement	5 164 408,07	2 859 082,64	55,36%	2 859 082,64	55,36%
Divers	3 006 156,79	1 643 980,04	54,69%	1 643 980,40	54,69%
TOTAL	158 183 506,01	27 489 955,79	17,38%	48 535 540,08	30,68%
Date limite estimée du dernier décaissement :	30-Juin-19				
Durée du Projet :	5 ans (Janvier 2014 - janvier 2019) – Clôture 30 juin 2019				
Coordonnateur National :	Corneille KABAMBA MANONGO (Mr)				
Responsable du projet/BAD	Bruno ZALI ZALI (Mr)				

I.A.2 La Zone d'intervention du projet

Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques dans la région du centre de la RDC (PRISE) couvre les deux anciennes Provinces du Kasai actuellement démembrées en cinq nouvelles Provinces, à savoir: le Kasai, le Kasai Central, le Kasai Oriental, la Lomami et le Sankuru. Cette aire du Projet comptait, selon l'INS, une population d'environ 8,2 millions d'habitants en 2014, soit 12% de la population du pays. Les bénéficiaires directs des résultats du projet étaient estimés à 3,3 millions de personnes au début du projet. Les sites d'intervention s'articulent autour de l'axe Ilebo-Tshikapa-Kananga-Mbuji-Mayi qui fait partie de cinq (5) zones prioritaires de développement du Gouvernement pour la période 2012-2016.

I.A.3 ORGANIGRAMME DU PRISE

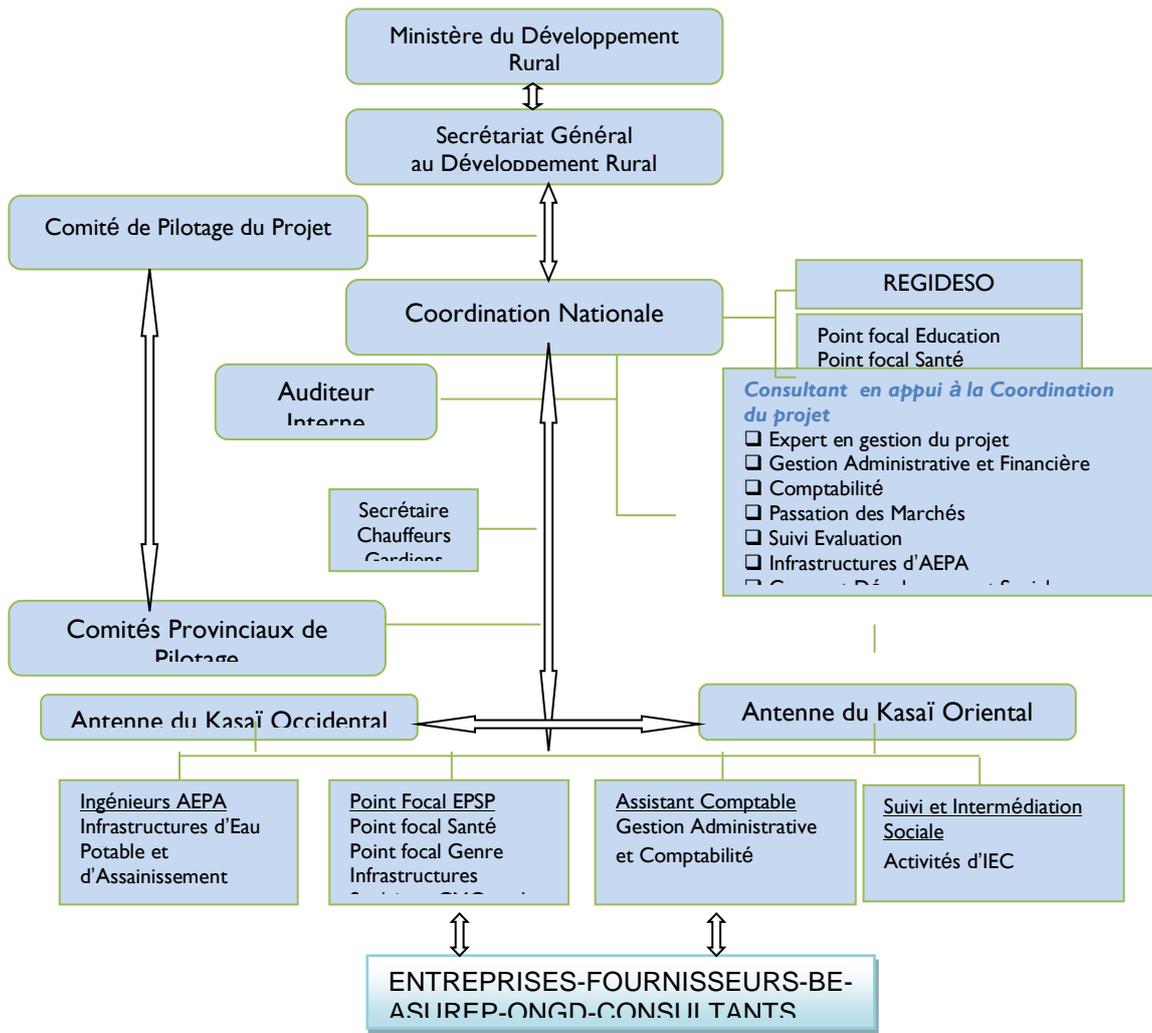

3

B. Description du projet

I.B.1 But et Objectif du projet

L'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires des populations de 5 Provinces de l'ex Kasai. De façon spécifique, le projet devra assurer durablement l'accès de la population à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation de base et aux soins de santé primaires et contribuer à créer des conditions favorables à la promotion de l'investissement privé dans la zone d'intervention du PRISE.

I.B.2 Composantes et objectifs spécifiques

Pour atteindre les objectifs du projet, les principales actions retenues sont regroupées dans les trois composantes ci-après :

Composante A : Développement des infrastructures (AEPA, écoles, centres de santé, centre Genre)

Composante B : Etudes et Renforcement des capacités

Composante C : Coordination et Gestion du Projet

Le tableau suivant donne les activités détaillées du projet et leur coût par composante :

Tableau 1.1 : Coût, sous composantes et activités par composante du PRISE

Composante	Coût (millions d'UC)	Sous-composantes	Activités
A) Développement des infrastructures (AEPA, écoles, centres de santé, centre Genre)	89,95 (85,53%)	Milieu rural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réalisation de 60 systèmes d'AEP ; 2. Construction de 494 latrines publiques ; 3. Construction et équipement de 60 écoles, 4. Construction et équipement de 60 centres de santé, 5. Construction et équipement d'un Centre Multifonctionnel Genre ; 6. Suivi et contrôle des travaux ; 7. Campagne d'IEC pour l'AEPA.
		Milieu urbain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construction de 3 châteaux d'eau 2 Réhabilitation de 272.100 ml du réseau d'AEP de Mbujimayi ; 3. Acquisition de 6 groupes électrogènes pour le système d'AEP de Tshikapa ; 4. Travaux de lutte antiérosive pour la protection des conduites du système d'AEP de Tshikapa ; 5. Suivi et contrôle des travaux ; 6. Campagne d'IEC pour AEP ;
B) Etudes et Renforcement des capacités	7,52 (7,14%)	Milieu rural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboration de la stratégie de mise en œuvre du sous-secteur de l'AEP en milieu rural ; 2. Réalisation d'une étude de mise en place d'un réseau pilote de suivi des ressources en eau du fleuve Kasai ; 3. Réalisation des études socio-économiques; 4. Elaboration d'un répertoire société civile et PTF du Genre ; 5. Renforcement des capacités des homologues du projet du SGDR (formations aux procédures d'acquisition, décaissement et gestion financière) ; 6. Renforcement des capacités des acteurs locaux (formations en maintenance et gestion des ouvrages) ; 7. Formation de 1000 femmes pour le développement des Activités Génératrices de Revenus; 8. Le renforcement des capacités des membres des 60 unités de gestion des systèmes d'AEP.
		Milieu urbain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réalisation de l'étude de la centrale hydroélectrique de Tshikapa ; 2. Renforcement des capacités des Ministères bénéficiaires du projet.
C) Coordination et Gestion du projet	7,71 (7,33%)	Milieus urbain et rural	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fonctionnement (salaires ; indemnités ; frais de missions ; consommables ; carburant...) 2. Elaboration du manuel de procédures ; 3. Audits des comptes.

I.B.3 Groupes Cibles

Les groupes cibles du projet sont les **populations du milieu rural** de la région du centre de la RDC (Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru), particulièrement les enfants vivant dans le milieu rural de cette région. Le Projet contribue à l'autonomisation économique des **femmes et des jeunes**.

En **milieu urbain**, le choix de **la ville de Mbuji-Mayi**, principal centre urbain de cette région, se justifie par le fait qu'elle comptait en 2014 selon l'INS près de trois (3) millions de personnes, soit environ la moitié de la population de la province du Kasaï Oriental, mais ne disposait que d'un embryon de système d'AEP très vétuste qui ne couvrait qu'une très faible partie des besoins de sa population. La BADEA avait déjà financé, à hauteur de 8,3 millions d'UC, les ouvrages de production d'eau potable (captage et conduite de transfert jusqu'au réservoir de Bakwa Kapanga). L'intervention du projet porte sur la réalisation des ouvrages de stockage et d'une partie du réseau de distribution. Elle sera complétée par un financement de la KFW pour un montant de 17,4 millions d'UC, qui sera utilisé pour la production de l'énergie électrique et participera également à la réhabilitation et l'extension du réseau.

A **Tshikapa**, le Projet a déjà permis de garantir le fonctionnement du système AEP de cette ville qui a été financé par la BAD dans le cadre du PEASU. En effet, étant donné que la fourniture de l'énergie électrique pour le fonctionnement des installations de la REGIDESO, construites par PEASU, n'était pas assurée, le PRISE: i) a acquis et installé des groupes électrogènes (avec une provision de carburant et des lubrifiants) et a fourni les produits chimique qui sont déjà utilisés pour la fourniture de l'énergie électrique permettant l'exploitation de l'usine ; ii) est en train de réaliser une étude de faisabilité pour la construction d'une micro-centrale hydro-électrique qui assurera une solution pérenne pour la fourniture de l'énergie électrique aux installations d'AEP/TSHIKAPA, iii) a assuré les travaux de lutte antiérosive pour la protection des ouvrages AEPA réalisées dans le cadre du Projet PEASU en construisant dans la ville 6,9 km de route asphaltée ou bétonnée avec caniveaux.

I.B.4 CADRE LOGIQUE

Impacts

(1.1) Taux de prévalence des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans réduit à 15% en 2020. ; (1.2) Taux de mortalité infanto juvénile réduit à 60 pour mille en 2020 ; (1.3) Taux Brut de fréquentation dans le primaire augmenté à 93,2 % en 2018

Effets

2.2.Taux d'accès à l'eau potable amélioré à 40% en 2018 ; (1.2) Taux d'accès à l'assainissement amélioré à 23 % en 2018
(2.1) Populations bénéficiant des soins de santé augmentée à 1 000 000 en 2018 ; (2.2) Population additionnelle bénéficiant d'un enseignement primaire de qualité est de 36 000 enfants en 2018 ; (3.1) Nombre de femmes gérantes des AGR est de 1 000 en 2018.

Produits

(1.1.) Système d'AEP pour la ville de Mbuji-Mayi réalisé et 60 systèmes AEP dont 23 solaires réalisés en milieu rural; (1.2) 272 100 ml de réseau réhabilité et/ou réalisés à Mbuji-Mayi; (1.3) 6 groupes électrogènes d'une puissance totale de 1350Kva installés à Tshikapa ; (1.4) 494 latrines publiques construites ; (1.5) 60 écoles construits ou réhabilités et équipés ; (1.6) 01 CMG construit et équipé ; (1.7) 60 centres de santé construits ou réhabilités et équipés ; (1.8.) 2 260 emplois permanents créés dont 15 00 (66 %) pour les femmes

(2.1) 26 matériels roulants ; 61 équipements de bureaux ; 20 équipements techniques ; (2.2) 1000 femmes supplémentaires formées et appuyées
(2.3) 62 comités mixtes mis en place
(2.4) 310 membres formés dont 40 % de femmes

(4.1) 20 rapports d'avancement ;
(4.2) 5 rapports d'audit ; (4.3) 20 rapports ?

Activités

Composante A : Développement des infrastructures 1) Travaux d'AEP ; (2) Travaux d'assainissement ; (3) Construction d'écoles, de centres de santé et d'un centre Genre ; (4) Actions d'IEC pour AEP et Assainissement ; (5) surveillance et contrôle des travaux.

Composante B : Etudes et Renforcement des capacités : (1) Appui en équipements de bureau et équipements techniques de terrain ; (2) Formation des membres de la coordination du projet et des acteurs locaux de terrain ; (3) Etudes.

Composante C : Gestion du projet :
Activités de gestion du projet

A. APERCU DES ACTIVITES DES ANNEES 2014, 2015 ET 2016.

Le PRISE a débuté effectivement à la mi-juillet 2014 et le premier décaissement en faveur du projet est intervenu le 07 octobre 2014. Au cours du dernier trimestre 2014, le projet s'est attelé principalement à l'installation des Antennes Provinciales à Kananga (pour les Provinces de l'ex Kasai Occidental) et Mbuji Mayi (pour les Provinces de l'ex Kasai Oriental) en vue du démarrage des activités sur terrain. Cela fut suivi des missions d'identification des sites d'intervention, de l'organisation de l'atelier national de lancement officiel du PRISE, de la signature du contrat pour l'élaboration des manuels des procédures et du lancement du DAOI pour l'acquisition des groupes électrogènes pour la mise en service des installations d'AEP Tshikapa et permettre l'achèvement du PAESU. Au cours de la même année, les TDRs pour le recrutement de l'Assistance Technique et l'Audit externe pour la période 2014 - 2015 ont été publiés et les processus d'acquisition des équipements et matériels pour le fonctionnement du projet ont été lancés et les conditions du premier décaissement ont été ainsi satisfaites.

L'année 2015, a été consacrée essentiellement aux activités suivantes :

- (i) L'acquisition des équipements et matériels pour le fonctionnement du projet,
- (ii) Le recrutement de l'Assistance Technique : l'expert International en Passation des marchés, l'Expert International en gestion financière et l'Expert International en Comptabilité ;
- (iii) les études de faisabilité pour la construction ou la réhabilitation des écoles, des centres de santé et des latrines publiques pour définir le budget opérationnel,
- (iv) Le démarrage des travaux de construction du CMFG de Mbuji Mayi,
- (v) Le démarrage des travaux de construction des bâtiments de la Direction Nationale de l'hygiène à Kinshasa ;
- (vi) Le démarrage des travaux de lutte antiérosive et de protection des ouvrages d'AEP Tshikapa,
- (vii) L'achat de carburant pour les essais et la mise en service de l'usine d'AEP Tshikapa,
- (viii) Les travaux de réhabilitation des bureaux de la Coordination Nationale et des Antennes Provinciales du Projet,
- (ix) L'organisation des ateliers provinciaux de lancement du PRISE
- (x) L'élaboration, la validation et l'approbation du manuel des procédures administratives, de gestion financière et comptabilité et de passation des marchés du PRISE et du PGES ;
- (xi) le lancement des processus pour le recrutement des firmes pour la réalisation des études géophysiques en vue de l'implantation des mini-réseaux d'AEP en milieu rural et de l'étude de faisabilité pour la construction de la microcentrale de Lovua à Tshikapa.

L'année 2016 a été principalement consacrée aux activités suivantes :

- (i) les études géophysiques et l'élaboration du DAOI pour l'implantation de 60 mini réseaux d'AEP e milieu rural ;
- (ii) le lancement du DAOI des travaux d'AEP Mbuji Mayi,
- (iii) l'achèvement des travaux de lutte anti érosive notamment par la réalisation d'une voirie moderne de 6.9 Km avec ouvrages connexes pour la protection des ouvrages d'AEP à Tshikapa sous financement du Don et du Prêt FAD ;
- (iv) l'achèvement de la construction et l'équipement du CMFG de Mbuji Mayi ,
- (v) l'achèvement des travaux de la Direction Nationale de l'Hygiène du Ministère de la santé à Kinshasa
- (vi) le lancement du processus de Passation des Marchés pour les travaux de de l'AEP Mbuji-Mayi. Le rapport d'analyse des offres relatives aux travaux et la proposition d'attribution ont été envoyés à la BAD le 26/10/2016 pour ANO, La BAD a demandé un complément d'information, sur l'analyse des offres, qui lui a été envoyé. L'ANO est en attente.

- (vii) l'étude de faisabilité de la microcentrale de Lovua à Tshikapa dont l'APS a été validée,
- (viii) le recrutement de l'Assistance Technique Expert AEPA, Genre et Développement Social, Suivi-Evaluation, Audit Externe des comptes du Projet.
- (ix) L'appui au fonctionnement des installations d'AEP Tshikapa avec la mise à disposition de 245 mètres cubes de carburant, 17 mètres cubes de lubrifiant et 750 tonnes des produits de traitement de l'eau de boisson
- (x) L'organisation d'un voyage d'études pour le renforcement des capacités des acteurs locaux.
- (xi) L'appui à la réhabilitation des bureaux de la CN et des antennes.

B. PREVISIONS DE DEPENSES POUR 2017


Les prévisions de dépenses pour l'année 2017 se chiffrent à 53 706 275,95, soit 34% du budget global du projet et réparties par composante et source de financement selon le tableau suivant :

Tableau 2.1 : Répartition des dépenses prévisionnelles de PRISE en 2017 par composante.

Composante	Montant en UC	Montant en USD
Composante A	32 592 595,16	49 017 959,41
Composante B	1 579 202,00	2 375 056,64
Composante C	1 538 112,64	2 313 259,89
Total	35 709 909,80	53 706 275,94

Le graphique suivant illustre cette répartition :


Graphique 2.1 : Répartition des prévisions des dépenses du PRISE en 2017 par composante

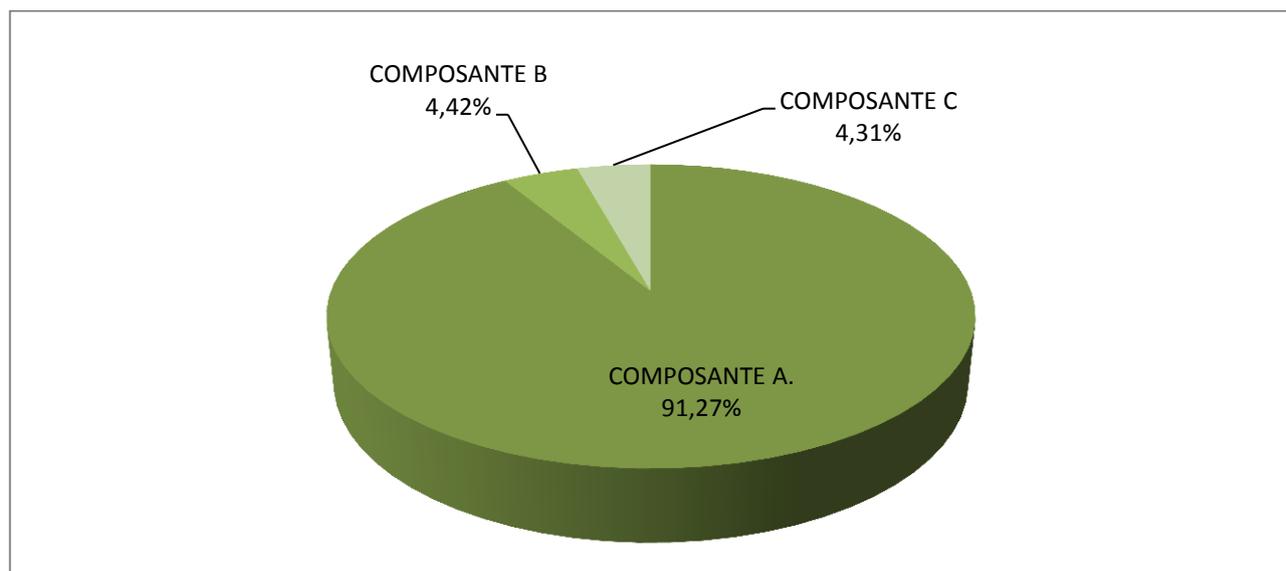

On observe dans ce graphique que les dépenses prévisionnelles du projet en 2017 sont concentrées sur la composante A qui concerne les travaux d'infrastructures (91,27%). Les composantes B concernant les études et le renforcement de capacités et C pour la Coordination Nationale avec respectivement 4,42% et 4,31% n'interviennent que très faiblement dans les dépenses du PRISE avec moins de 10% des dépenses prévisionnelles du PRISE en 2017.

En ce qui concerne les sources de financement pour 2017, le graphique suivant nous renseigne :


Graphique 2.2 : Répartition des prévisions des dépenses du PRISE en 2017 par source de financement

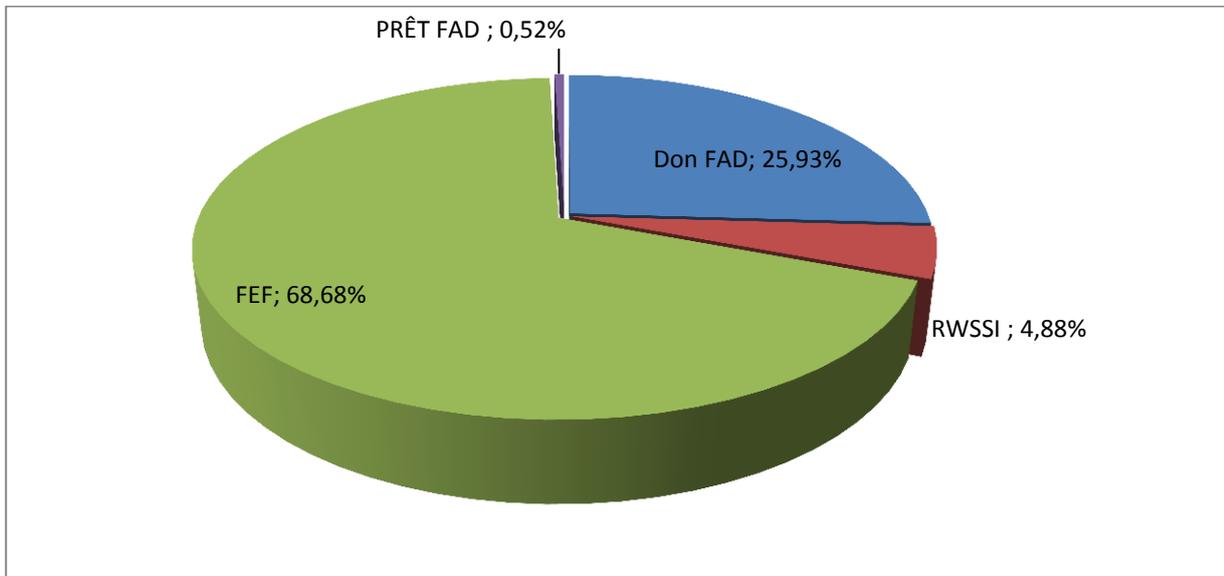

Les dépenses du projet en 2017 proviendront essentiellement des Facilités pour les Etats Fragiles (68,68%) et du don FAD (25,93%). Ces deux sources de financement représentent 95% des ressources du PRISE. Le fonds RWSSI et le prêt FAD participent aux dépenses du projet avec respectivement 4,88% et 0,52%.

Si on s'intéresse aux catégories des dépenses, on peut observer le graphique suivant :

Graphique 2.3 : Répartition des dépenses par catégorie des dépenses

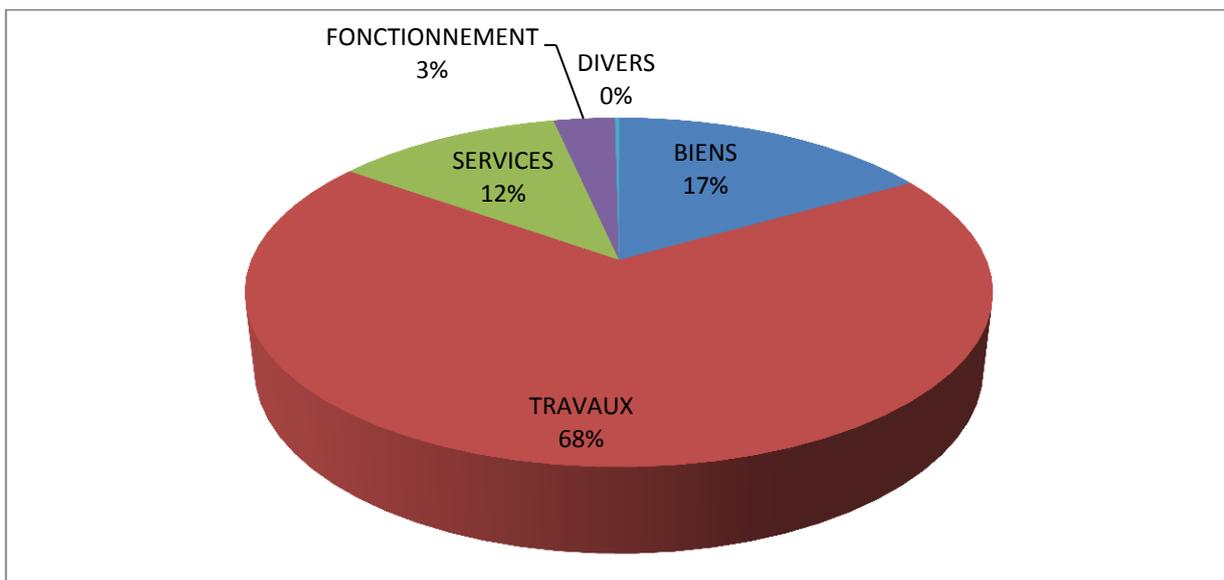

Il ressort de ce graphique que ce sont les travaux avec 68% des dépenses qui occupent la première place suivi de l'acquisition des biens (17%) et des prestations des services (12%). Le fonctionnement (3%) et les divers (0%) ne constituent que des faibles proportions des prévisions des dépenses du projet en 2017.

III. SITUATION DES ACTIVITES DU PROJET au 31 décembre 2017 (suivi des marchés ; exécution financière et exécutions physique)

III.1 Situation des marchés au 31 décembre 2017

Au 31 décembre 2017, PRISE a signé 119 contrats pour un montant de 48 575 859 USD (y compris les 2 859 083 USD des dépenses cumulées de fonctionnement) qui sont repartis par composante et catégorie de la façon suivante :

Tableau 3.1 : Répartition des contrats signés par PRISE au 31 décembre 2017 par composante et catégorie

Catégorie	Composante			Ensemble
	Composante A	Composante B	Composante C	
Travaux	71	0	0	71
Biens	9	10	4	23
Services	1	3	18	22
Divers	3	0	0	3
Ensemble	84	13	22	119

La composante A a connu la signature de 84 contrats (soit 70,6% de l'ensemble des contrats) dont 71 pour les travaux, 13 contrats pour la composante B et 22 contrats pour la composante C. Le Projet a signé 23 contrats pour les biens et 22 contrats pour les services.

Tableau 3.2 : Répartition des montants (en USD) des contrats signés par PRISE par composante et catégorie au 31 décembre 2017

Catégorie	Composante			Ensemble	%
	Composante A	Composante B	Composante C		
Travaux	35 295 393			35 295 393	72,7%
Biens	4 930 182	469 946	132 600	5 532 728	11,4%
Services	272 995	1 509 340	1 462 340	3 244 675	6,7%
Fonctionnement			2 859 083	2 859 083	5,9%
Divers		1 643 980		1 643 980	3,4%
Ensemble	40 498 570	3 623 266	4 454 023	48 575 859	100,0%
%	83,4%	7,5%	9,2%	100,0%	

Il ressort de ce tableau que 40 498 570 USD des engagements du Projet, soit 83,4%, concernent le développement des Infrastructures de la composante A. Pour la composante B qui concerne les études et le renforcement des capacités, les contrats signés représentent 3 623 266 USD soit 7,5% des engagements. La composante C qui concerne la Coordination et la gestion du Projet prend 9,2% des engagements du PRISE avec 4 454 023 USD.

Si on s'intéresse à la répartition des engagements de PRISE par catégorie, on constate que ce sont les travaux qui logiquement ont la grande partie des engagements avec 35 295 393 USD soit 72,7%. Ils sont suivis par les biens puis les services qui prennent respectivement 5 532 728 USD (11,4%) et 3 244 675 USD (6,7%). Le fonctionnement avec 2 859 083 USD et les Divers avec 1 643 980 se partagent moins de 10% des engagements du PRISE à la fin de l'année 2017.

Pour l'efficacité du Projet, on peut analyser le tableau suivant qui donne les produits réalisés ou en cours de réalisation par type d'infrastructures.

Tableau 3.3 : Taux d'engagement physique des produits par type d'infrastructures au 31 décembre 2017

Type d'infrastructure	Nombre contracté	Nombre attendu	Taux d'engagement physique
Latrines	505	494	102%
Ecoles	60	60	100%
Centres de santé	60	60	100%
CMG	1	1	100%
Bureau du Projet	3	3	100%
Direction Nationale de l'Hygiène	1	1	100%
Voirie urbaine (kms)	6,9	6,9	100%
AEP en milieu urbain	0	1	0%
AEP en milieu rural	0	60	0%

Il ressort de ce tableau qu'au 31 décembre 2017, le Projet a signé tous les contrats prévus pour la construction de 60 écoles et 60 Centres de Santé ciblés et 505 latrines publiques sur une prévision globale de 494 latrines. Toutes ces infrastructures sont en cours de construction et devraient être terminées, équipées et opérationnelles en 2018. Pour les bâtiments administratifs en appui aux ministères impliqués tels que le CMFG de Mbuji Mayi, la Direction Nationale de l'hygiène et les bureaux du Projet, ils sont déjà achevés et réceptionnés et connaissent donc des taux de réalisations de 100%. Par contre, les AEP tant en milieu urbain (Mbuji Mayi) que rural dont les contrats ne sont pas encore signés connaissent des taux de réalisations de 0% et constituent une grande préoccupation pour le projet.

III.2 Exécution physique du PRISE des travaux sur le terrain au 31 décembre 2017

Le taux global d'exécution physique du projet a atteint 27,1% au 31 décembre 2017 et est présenté par composante dans le tableau qui suit :

Tableau 3.4 : Taux global d'exécution physique des travaux du PRISE par composante au 31 décembre 2017

Composante	Budget prévisionnel ajusté en USD	Taux d'exécution global final (%)
Composante A	133 324 197	21,3
Composante B	11 318 366	76,7
Composante C	10 074 219	48,9
Ensemble	154 716 782	27,1

Il ressort de ce tableau que c'est la composante A qui accuse un taux global d'exécution le plus faible avec 21,3% à cause bien entendu du non démarrage des travaux de l'AEP Mbuji-Mayi, de mini réseaux en milieu rural et de la mission de contrôle et surveillance des travaux des écoles, des Centres de Santé et des latrines publiques qui représentent ensemble les 55% du budget de cette composante. Avec 48,9% la composante C connaît pratiquement la moitié de son exécution tandis que la composante B est déjà à 76,7% de son exécution, donc approche les 80% à la quatrième année après le démarrage du Projet ce qui est appréciable.

Pour les travaux ayant déjà démarrés au PRISE au 31 décembre 2017, leur taux moyen d'exécution physique est de 73,9% alors qu'il était au 30 juin 2017 de 56%. Il y'a eu une augmentation au second semestre de l'année de 17 points de % due à la reprise des travaux dans la plupart des chantiers grâce à la baisse de l'insécurité qu'a connue la région de mise en œuvre du PRISE. Il convient de signaler que les travaux qui n'ont pas encore démarrés (avec un taux d'exécution physique = 0) ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette moyenne. Il faut aussi noter que la moyenne qui a été calculé pour obtenir cet indicateur est une moyenne arithmétique pondérée des taux d'exécution physique des activités avec comme poids pour chaque produit le montant du contrat. Même si on tient compte des contrats signés dont les travaux n'ont pas encore démarrés, ce taux est de 66% et reste élevé.

Sur un total d'engagements cumulés du Projet de 48 575 859 USD au 31 décembre 2017, les activités dont les contrats ont été signés mais qui n'ont pas encore démarrés constituent 5 179 526 USD des engagements du Projet et traduisent les efforts fournis pour la signature de nouveaux contrats au second semestre de 2017. Les activités qui ont déjà démarrés représentent 43 396 334 USD et le tableau suivant nous donne leur taux par niveau d'avancement des travaux :

Tableau 3.5: Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE ayant déjà démarrés selon leur niveau d'avancement au 31 décembre 2017

Niveau d'avancement	Taux moyen d'exécution physique	Engagements en USD	% des engagements
Travaux en cours	55,1	25 242 231	58,2%
Travaux terminés	100	18 154 103	41,8%
Ensemble	73,9	43 396 334	100,0%

Il ressort de ce tableau que pour les travaux en cours d'exécution, ce taux est de 55,1% alors qu'il était de 26,9% au 30 juin 2017. Il y'a donc une augmentation de près de 28 points de % au deuxième semestre de 2017. On peut expliquer cette hausse par une certaine accalmie qui règne maintenant dans la zone du Projet où l'insécurité diminue. Il est certain que le taux d'exécution physique d'une activité qui est terminée est de 100% ; ce qui donne un taux moyen des travaux terminés de 100%. Les engagements pris par PRISE pour les travaux déjà terminés sont de 18 154 103 USD.

Pour l'exécution physique spatiale du projet, on peut se pencher sur le tableau suivant :

Tableau 3.6: Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE ayant déjà démarrés par ancienne Province au 31 décembre 2017

Ancienne Province	Taux moyen d'exécution physique
Kinshasa	82,6
Kasaï Oriental	58,7
Kasaï Occidental	76,7
Ensemble	73,9

C'est à Kinshasa et au Kasai Occidental que les travaux ont connu une bonne exécution physique avec des taux moyen d'exécution physique respectivement 82,6 et 76,7% tandis qu'au Kasai Oriental, les travaux avancent moins vite avec un taux moyen d'exécution physique de 58,7%.

Si on s'intéresse aux nouvelles Provinces, on peut regarder le tableau suivant :

Tableau 3.7: Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE ayant déjà démarrées par nouvelle Province au 31 décembre 2017

Nouvelle Province	Taux moyen d'exécution physique	Engagements en USD
Kinshasa	82,6	1 771 150
Kasai Oriental	70,0	4 549 848
Lomami	54,8	3 438 864
Sankuru	59,5	2 895 529
Kasai Central	51,5	8 121 388
Kasai	89,7	15 330 225
Ensemble	73,9	36 107 005(*)

(*) : Cette somme ne prend pas en compte les engagements qui sont pris par les Projet pour les activités qui concerne plus d'une Province.

A la fin de l'année 2017, c'est le Kasai qui a connu le plus fort taux moyen d'exécution grâce à l'achèvement des travaux de lutte anti-érosive de protection des ouvrages de l'AEP REGIDESO avec la voirie à Tshikapa avec 89,7%. Le Kasai Oriental avec 70% suivi du Sankuru avec 59,5% connaissent des taux d'exécution intermédiaires tandis que la Lomami et le Kasai Central avec respectivement 54,8% et 51,5% viennent en queue du peloton.

Par composante, on peut se pencher sur le tableau suivant.

Tableau 3.8 : Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE ayant déjà démarrées selon la composante au 31 décembre 2017

Composante	Taux moyen d'exécution physique (%)	Engagements en USD	% des engagements
Composante A	69	35 319 044	81,4%
Composante B	97,5	3 623 267	8,3%
Composante C	93,1	4 454 023	10,3%
Ensemble	73,9	43 396 334	100,0%

Les composantes B et C avec respectivement 97,5 et 93,1% des taux moyens d'exécution sont assez avancés tandis que la composante A avec 69% connaît une faible exécution par rapport à la moyenne générale du Projet de 73,9% mais avec une sensible amélioration de près de 19 points de % par rapport au deuxième trimestre 2017 où il était de 48%. Les taux moyens de réalisation physique des composantes B et C sont restés stables et assez élevés au-delà de 90%.

Le tableau suivant nous renseigne sur l'exécution des travaux par catégorie.

Tableau 3.9 : Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE ayant déjà démarrées selon la catégorie au 31 décembre 2017

Catégorie	Taux moyen d'exécution physique	Engagements en USD
Travaux	69,5	30 115 867
Biens	68,4	5 532 728
Services	87,7	3 244 676
Fonctionnement	100,0	2 859 083
Divers	100,0	1 643 980
Ensemble	73,9	43 396 334

Les activités ayant trait au fonctionnement et aux divers ont été entièrement exécutées en 2017 et ceux concernant les services avec 87,7% ont connu un bon taux moyen d'exécution et une certaine stabilité par rapport aux deuxième et troisième trimestres passé où il était au-delà de 83%. Les taux moyens d'exécution physique dans la catégorie des travaux et des biens se sont améliorés de 18 points de % passant de 51,2% à 69,5% pour les premiers et de 34 points de % passant de 34,6 à 68,4% pour les seconds. Le fonctionnement comprend également les prestations des assistances techniques au Projet.

Par type d'infrastructure, le tableau suivant nous renseigne :

Tableau 3.10 : Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE ayant déjà démarrées selon le type d'infrastructure ou de service au 31 décembre 2017

Type d'infrastructure	Taux moyen d'exécution physique	Engagements en USD	% des engagements
Latrines publiques	65,7	3 578 426	8,2%
Ecoles	57,9	9 077 433	20,9%
Centres de santé	45,4	7 570 353	17,4%
CMG	100	488 926	1,1%
Bureau du Projet	100	69 017	0,2%
Direction Nationale de l'Hygiène	100	168 111	0,4%
Voirie urbaine	100	8 862 331	20,4%
Service	87,8	3 267 945	7,5%
Equipements	89,3	946 518	2,2%
Fonctionnement	100	2 859 083	6,6%
Construction pour AEP Tshikapa	100	984 443	2,3%
Fournitures pour AEP Tshikapa	100	1 643 980	3,8%
Equipements scolaires	57,8	1 057 020	2,4%
Equipements de santé	57,4	2 822 748	6,5%
Ensemble	73,9	43 396 334	100,0%


Bien qu'en nette amélioration, les Centres de Santé, les écoles et les latrines publiques sont les infrastructures qui connaissent une exécution avec des taux moyens d'exécution physique respectifs de 45,4%, 57,9% et 65,7% par rapport à la moyenne générale de 73,9%.

Les bâtiments administratifs sont terminés avec des taux d'exécution de 100% pour les Bureaux du Projet, de la Direction Nationale de l'hygiène et du CMFG avec des taux d'exécution physique de 100%.

III.3 EXÉCUTIONS FINANCIÈRES DU PRISE AU 31 DÉCEMBRE 2017.

L'ensemble de contrats signés par PRISE représentent 48 575 859 USD au 31 décembre 2017 contre 32 227 521 USD en fin 2016, soit des nouveaux engagements de 16 348 338 USD ont été pris cette année, soit une augmentation de 50,1%. Le taux d'engagement par rapport au budget global du projet est actuellement de 30,7% et a connu une amélioration de 10 points de % par rapport à 2017 où ce taux était de 20,4%. Sur ces engagements, un montant de 27 489 956 USD a été payé, donc un taux de paiement de 56,6%, donc une augmentation de 4 points de % par rapport à 2016 où il était de 52,3%. Ces décaissements représentent un taux de décaissement de 17,4% par rapport au budget global contre 10,7% au 31 décembre 2016. Le graphique suivant donne les indicateurs globaux de l'exécution du projet au 30 septembre 2017.

Graphique 3.1 : Taux de décaissement, d'engagement, et d'exécution physique des activités du PRISE au 31 décembre 2017

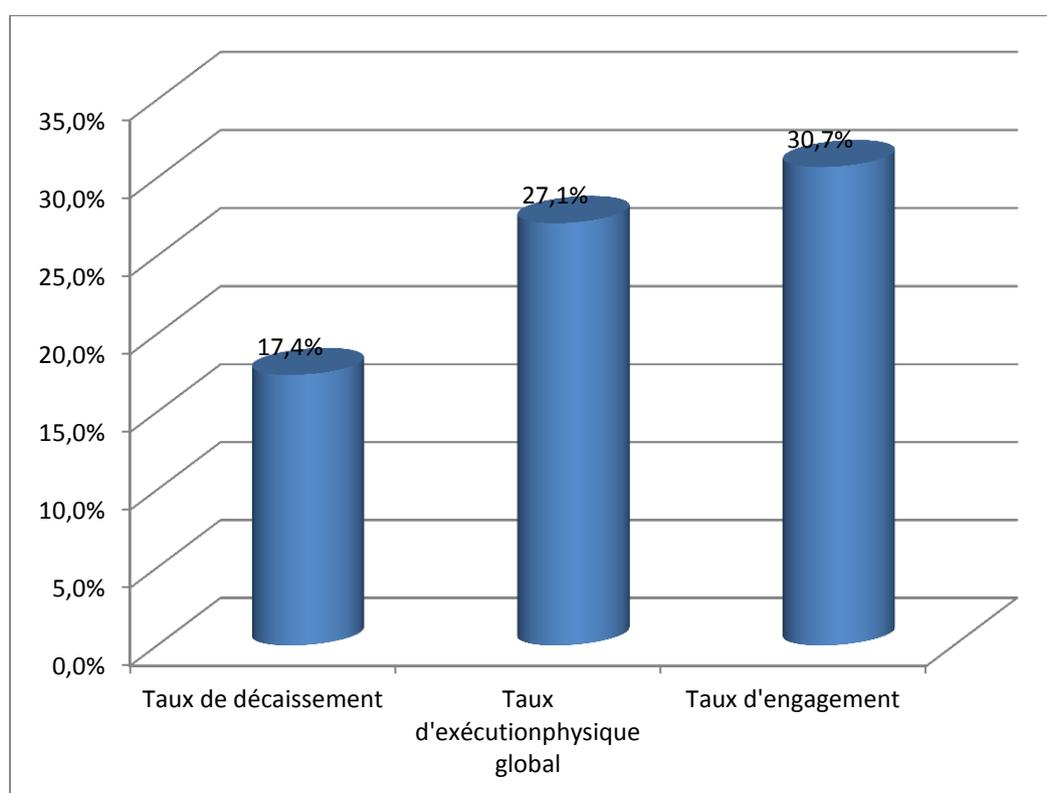

Il ressort de ce graphique que le Projet connaît un taux d'exécution physique globale de 27,1% de 4 points de % en deçà du taux d'engagements qui est de 30,7% avec un taux de décaissement estimé à 17,4%.

Par composante, le tableau suivant nous donne les informations y relatives :


Tableau 3.11 : Taux de décaissement, d'engagement et de paiement (en USD) au 31 décembre 2017 par composante

Composante	Budget Global	Décaissements 2014, 2015 et 2016	Cumul des décaissements au 31/12/2017	Taux de décaissement au 31/12/2017	Solde d'engagements à payer au 31/12/2017	Engagements au 31 décembre 2017	Engagements au 31 décembre en %	Taux d'engagement au 31/12/2017	Taux de paiement au 31 décembre 2017
	(1)	(2)	(7)=(5)+(2)	(8)=(7)/(1)	(9)=(10)-(7)	(10)		(11)=(10)/(1)	(7)/(10)
Composante A	135 366 671	11 482 640	20 065 569	14,8%	20 432 593	40 498 162	83,4%	29,9%	49,6%
Composante B	11 318 366	2 539 636	3 456 203	30,5%	121 491	3 577 694	7,4%	31,6%	96,6%
Composante C	11 498 469	2 855 160	3 968 184	34,5%	491 500	4 459 684	9,2%	38,8%	89%
Total	158 183 506	16 877 436	27 489 956	17,4%	21 045 584	48 535 540	100%	30,7%	56,6%

Au 31 décembre 2017, les engagements de la composante A du PRISE représentent 83,4% des engagements totaux et sont du même niveau que le budget global qui lui est consacré, c'est-à-dire 85,6% mais les décaissements de cette composante ne contribuent qu'à 73% sur les décaissements totaux. Quant aux composantes B et C, les parts de leurs engagements (7,4 et 9,2%) sont proches de leurs parts budgétaires qui sont respectivement de 7,1 et 7,3%. Leurs taux de paiement sont très élevés car ils sont respectivement de 96,6 et 89% alors que celui de la composante A n'est que de 49,55%, donc très faible par rapport aux deux autres composantes.

De ce tableau, on peut tirer le graphique suivant :

Graphique 3.2 : Taux de décaissement et d'engagement au 31 décembre 2017 par composante

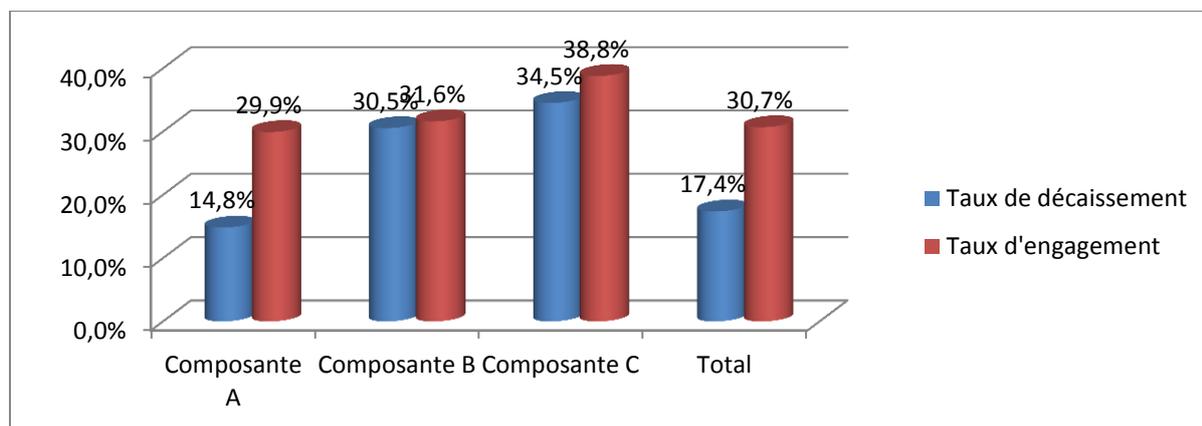

Il ressort de ce graphique que les taux d'engagements des trois composantes sont assez proche du taux d'engagement global qui est 30,7% même si la composante C a une valeur plus élevée (38,8%) que les composantes A (29,9%) et B (31,6%). Quant au taux de décaissement qui est de 17,4% dans l'ensemble, il est tiré vers le haut par les composantes B et C pour lesquels ce taux est respectivement de 34,5 et de 30,8% contre 14,8% pour la composante A. Il en est de même pour le taux de paiement qui est nettement plus élevé pour les composantes B (96,6%) et de C (89%) contre 49,5% pour la composante A donnant une valeur globale de 56,6%.

En s'intéressant aux catégories, on peut analyser le tableau suivant :


Tableau 3.12 : Taux de décaissement, d'engagement et de paiement au 31 décembre 2017 par catégorie

Catégories	Budget Global en USD	Décaissements 2014, 2015 et 2016 en USD	Cumul des décaissements au 31/12/2017 en USD	Taux de décaissement au 31/12/2017 en USD	Solde d'engagements à payer au 31/12/2017	Engagements au 31 décembre 2017 en USD	Engagements au 31 décembre en %	Taux d'engagement au 31/12/2017	Taux de paiement au 31 décembre 2017
	(1)	(2)	(7)=(5)+(2)	(8)=(7)/(1)	(9)=(10)-(7)	(10)		(11)=(10)/(1)	(7)/(10)
TRAVAUX	110 649 419	9 750 419	17 082 026	15,4%	17 811 363	34 893 389	71,9%	31,5%	49,0%
BIENS	19 643 636	2 164 899	3 416 222	17,4%	2 518 102	5 934 324	12,2%	30,2%	57,6%
SERVICES	19 719 885	1 280 534	2 560 831	13,0%	643 932	3 204 764	6,6%	16,3%	79,9%
Divers	3 006 157	1 482 982	1 571 794	52,3%	72 187	1 643 980	3,4%	54,7%	95,6%
FONCTIONNEMENT	5 164 408	2 198 601	2 859 083	55,4%		2 859 083	5,9%	55,4%	100,0%
Total	158 183 506	16 877 436	27 489 956	17,4%	21 045 584	48 535 540	100,0%	30,7%	56,6%

Au 31 décembre 2017, les gros des dépenses du projet ont été consacrées aux travaux avec 17 082 026 USD, soit 62,1% des dépenses totales du PRISE alors qu'elles représentaient 57% au 31 juin 2017, donc une augmentation de 5 points de %. L'acquisition des biens, le fonctionnement et les prestations de services avec respectivement 12,4%, 10,4%, et 9,3% des dépenses pour chacune des catégories ainsi que les divers 5,7% se partagent le reste des dépenses du projet. Les engagements pour les travaux représentent 34 893 389 USD, soit 71,9% et l'acquisition des biens avec 12,2% (5 934 324 USD) ont pris 84 % des montants des contrats signés par le Projet.

Le graphique suivant nous donne les indicateurs d'exécution financière par catégorie :

Graphique 3.3 : Taux de décaissement et d'engagement au 31 décembre 2017 par catégorie

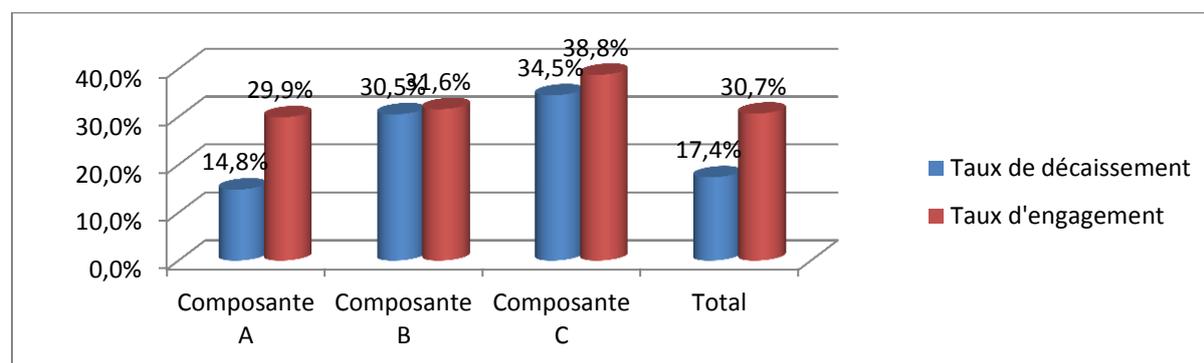

Si le projet a connu un taux d'engagement global de 30,7%, ce sont les divers et le fonctionnement avec respectivement 55,4% et 54,7% du niveau de cet indicateur qui connaissent les niveaux d'engagements les plus élevés. L'acquisition des biens avec un taux d'engagement de 30,2% et les travaux avec 31,5% sont dans le voisinage de la moyenne générale tandis que les services connaissent le taux d'engagement le plus faible avec 16,3% bien en deçà de la moyenne générale. C'est aussi dans le fonctionnement et les divers que les taux décaissements (55,4 et

52,3%) ont été les plus élevés. L'acquisition des biens, les services et les travaux accusent des taux de décaissements se situant autour de 15% connaissent un retard dans leur exécution financière.

Le tableau qui suit, nous renseigne sur l'exécution financière par source de financement.


Tableau 3.13 : Taux de décaissement, d'engagement et de paiement au 31 décembre 2017 par source de financement

Catégorie	Budget Global	Décaissements en 2014, 2015 et 2016 en USD	Cumul des réalisations au 31/12/2017	Taux de décaissement au 31/12/2017	Niveau global d'engagement au 31/12/2017	Engagements au 30 décembre 2017	Engagement au 31 décembre en %	Taux d'engagement au 31/12/2017	Taux de paiement au 31 décembre 2017
	(1)	(2)	(7)=(5)+(2)	(8)=(7)/(1)	(9)=(10)-(7)	(10)		(11)=(7+9)/(1)	(7)/(10)
Don FAD	65 459 846	12 682 164	15 174 976	23,18%	2 706 296	17 881 272	36,8%	27,3%	84,9%
Prêt FAD	2 218 721	1 569 819	1 900 768	85,67%	48 738	1 949 505	4,0%	87,9%	97,5%
Don RWSSI	7 787 319	323 925	635 295	8,16%	842 738	1 478 033	3,0%	19%	43%
Don FEF	82 717 620	2 301 529	9 778 917	11,82%	17 447 812	27 226 729	56,1%	32,9%	35,9%
Total	158 183 506	16 877 436	27 489 956	17,38%	21 045 584	48 535 540	100%	30,7%	56,6%

Les gros du budget proviennent des FEF (52,3%) et du Don FAD (41,1%). Ces deux sources de financement ont eu à pourvoir 92,9% des engagements du Projet avec 56,1% pour le FEF et 36,8% pour le Don FAD. des engagements totaux. Ces deux sources de financement, qui représentent 93,7% du budget du Projet, ont fourni 92,9% des engagements du PRISE au 31 décembre 2017 et 103 millions USD sur les 110 millions, soit 94% des ressources encore financières disponibles pour le Projet. Les fonds du RWSSI sont encore de 6,3 millions soit près 5,8% des ressources non encore entamées par le Projet.

Le graphique suivant illustre le niveau de financement du Projet par source de financement.

Graphique 3.4 : Taux de décaissement et d'engagement au 31 décembre 2017 par source de financement

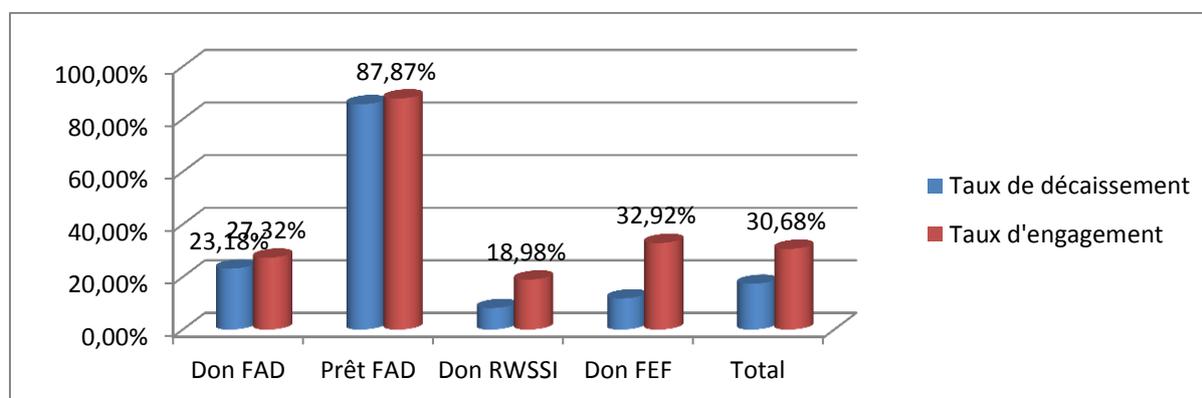

On observe que le prêt FAD connaît la meilleure exécution financière, avec au 31 décembre 2017 un taux d'engagement de 87,9% et un taux de décaissement de 85,7%. Le don FAD et le FEF, les plus gros pourvoyeurs du PRISE, connaissent des taux d'engagement autour de la moyenne

générale (qui est de 30,7%) avec respectivement 27,3 et 32,9%. Si le don FAD connaît un bon taux de décaissement de 23,2% nettement au-dessus de la moyenne générale de 17,4%, le FEF et le RWSSI connaissent de très faible taux de décaissement par rapport à la moyenne générale avec respectivement 11,8 et 8,2%.

Enfin, il convient de signaler que les processus d'attribution de contrats pour deux activités majeures qui comprennent plus de 46% des ressources financières du Projet qui entraînent influencent négativement la mise en œuvre du PRISE. Il s'agit notamment des travaux d'AEP Mbuiji – Mayi et des travaux d'AEP en milieu rural (60 mini-réseaux) qui attendent les ANO de la BAD.

3.4. Exécution du PTBA 2017

En ce qui concerne l'exécution du PTBA 2017, sur des prévisions des dépenses de 53 706 276 USD soit 34% du budget total du Projet qui est de 158 183 506 USD Le PTBA de 2017 représentait près de 3 fois les décaissements du PRISE de 2014 à 2016 c'est-à-dire les 3 premières années de mise en œuvre du Projet avec **16 877 436 USD**. Un montant de 10 612 520 USD a été soit décaissé en 2017 soit un taux de réalisation de 20%. Il convient de signaler que les réalisations du Projet en 2017 représentent 39% des décaissements cumulés du Projet (27 489 956 USD) pour ces 4 premières années c'est-à-dire de 2014 à 2017.

On peut se référer aux tableaux qui suivent pour une analyse par composante, par catégorie et par source de financement.

Au 31 décembre 2017 par composante, le tableau suivant nous donne les informations pertinentes.

Tableau 3.14 : Taux de réalisation du PTBA 2017 au 31 décembre 2017 par composante

Composante	Budget Global en USD	Décaissements en 2014, 2015 et 2016 en USD	Budget de réalisation 2017			
			Budget/PTBA 2017 en USD	Flux de décaissement du 01 octobre au 31 décembre 2017 en USD	Décaissements en USD du 01/01 au 31/12/2017	Taux de décaissement PTBA 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)
Infrastructures d'AEP, sanitaires et scolaires	135 366 671	11 482 640	49 017 959	4 720 267	8 582 930	17,5%
Etudes et renforcement des capacités	11 318 366	2 539 636	2 375 057	180 095	916 566	38,6%
Coordination et gestion du projet	11 498 469	2 855 160	2 313 260	153 664	1 113 024	48,1%
Total	158 183 506	16 877 436	53 706 276	5 054 026	10 612 520	19,8%

Le PTBA 2017 avait prévu des dépenses de 53 706 276 USD,.. Au 31 décembre 2017, le taux de réalisation n'est que de 19,8% qui est due essentiellement à la faiblesse de réalisation de la composante A qui a connu un taux de réalisation de 17,5% alors qu'elle représente 91,3% des prévisions budgétaires du PRISE pour 2017. Le faible taux de réalisation des activités de la composante A et celui de catégorie des travaux, qui est de 20%

comme le montre le tableau qui suit, sont dus à la non signature des contrats, par conséquent au non décaissement des fonds, pour les travaux de l'AEP de Mbuji Mayi (5 133 412 USD) et 60 mini réseaux en milieu rural (7 208 814 USD) qui étaient projetés avec les paiements des avances au démarrage. En effet, ces 2 types d'infrastructures dont les attributions de marchés entraînent pour des problèmes de procédures entraînent le non engagement et donc le non décaissement de 12 342 226 USD, soit 23% du budget prévisionnel du PRISE de 2017. En plus, les infrastructures scolaires (10 992 068 USD), sanitaires (8 778 566 USD) et les latrines (3 586 723 USD) soit au total 23 357 357 USD et 43,5% du budget 2017, bien que la quasi-totalité des contrats ont été signés, ont connu un retard d'exécution et un faible taux de décaissement qui a un impact négatif sur le taux de réalisation du PTBA 2017. La non signature des contrats des AEP en milieu rural et la faiblesse du décaissement pour les infrastructures scolaires, sanitaires et les latrines qui représentent 66,5% du PTBA 2017 expliquent en grande partie le faible taux de réalisation du programme de cette année.

Pour l'état d'exécution du PTBA 2017 par catégorie, on peut se référer au tableau suivant :

Tableau 3.15 : Taux de réalisation du PTBA 2017 au 31 décembre 2017 par catégorie

Catégorie	Budget Global en USD	Réalizations 2014, 2015 et 2016 en USD	Budget de réalisation 2017			
			Budget/PTBA 2017 en USD	Flux de réalisation du 01 octobre au 31 décembre 2017 en USD	Réalizations du 01/01 au 31/12/2017 en USD	Taux de réalisation PTBA 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)
TRAVAUX	110 649 419	9 750 419	36 629 726	3 468 944	7 331 607	20,0%
BIENS	19 643 636	2 164 899	8 962 076	1 251 323	1 251 323	14,0%
SERVICES	19 719 885	1 280 534	6 296 473	333 759	1 280 297	20,3%
Divers	3 006 157	1 482 982	114 154		88 812	77,8%
FONCTIONNEMENT	5 164 408	2 198 601	1 703 846		660 481	38,8%
Total	158 183 506	16 877 436	53 706 276	5 054 026	10 612 520	19,8%

Outre les travaux dont la faiblesse du taux d'exécution a été expliquée ci-dessus avec la composante A du Projet, on constate la non réalisation totale de la catégorie biens due surtout à la non signature des contrats de fourniture des équipements d'exhaure (5 083 696 USD), soit 56,7% du budget annuel de cette catégorie, à cause des problèmes de procédures et au retard de fourniture des équipements scolaires (1 033 596 USD) et médicaux (2 822 748 USD) sur sites bien que ces équipements sont déjà en stock dans les centres de dispatch (Kananga et Mbuji Mayi) à cause de la situation d'insécurité qui était imprévue et qui a retardée la construction des ouvrages devant les recevoir et la lenteur dans les procédures douanières. Il convient de signaler que les équipements scolaires et médicaux sont en train d'être livrés et ont connu un début de paiement qui a amélioré le taux de réalisation de la catégorie des biens qui est passé de 0% au troisième trimestre à 14% à la fin de l'année 2017. Les services ont connu 20,3% de taux de décaissement (proche de la moyenne générale) par rapport aux prévisions de 2017 pour cette catégorie à cause de l'abandon des missions de surveillance et contrôle des infrastructures scolaires, sanitaires et d'assainissement ainsi que la non attribution des contrats des missions d'IEC qui consomment la grande partie du budget de cette catégorie. Il convient de signaler la faiblesse de la consommation des frais de fonctionnement (38,8%) due à la non organisation de formation internationale (202 178 USD) et à la réduction du nombre de stagiaires de 52 à 6 et de

la durée de leurs stages qui a fait que sur les 174 600 USD prévus sur ce poste, environ 20 000 USD seulement ont été utilisés. La catégorie Divers avec 77,8% de réalisation connaît une exécution acceptable cette année.

Pour la réalisation du PTBA 2017 par source de financement, on peut analyser le tableau suivant :

Tableau 3.16 : Taux de réalisation du PTBA 2017 au 31 décembre 2017 par source de financement

Source de financement	Budget Global en USD	% Budget	Décaissements en 2014, 2015 et 2016 en USD	Budget de réalisation 2017			
				Budget/PTB A 2017 en USD	Flux de réalisation du 01 octobre au 31 décembre 2017 en USD	Réalisations du 01/01 au 31/12/2017 en USD	Taux de réalisation PTBA 2017
	('1)		('2)	('3)	('4)	('5)	('6)=('5)/('3)
Don FAD	65 459 846	41,4%	12 682 164	13 924 920	409 691	2 492 812	17,9%
Prêt FAD	2 218 721	1,4%	1 569 819	279 469		330 949	118,4%
Don RWSSI	7 787 319	4,9%	323 925	2 618 674	174 838	311 370	11,9%
FEF	82 717 620	52,3%	2 301 529	36 883 212	4 469 498	7 477 388	20,3%
Total	158 183 506	100,0%	16 877 436	53 706 276	5 054 026	10 612 520	19,8%

Au 31 décembre 2017, les ressources du prêt FAD ont été totalement consommées tandis que celles du don FAD, du don RWSSI et FEF n'ont été utilisées respectivement qu'à 17,9, 11,9 et 20,3%. La faiblesse d'utilisation de ces ressources provient du fait qu'elles devaient financer des travaux, des biens et des ressources dont les contrats n'ont pas encore été signés ou dont les contrats ont été signés mais dont les travaux ont connu un retard dans leur exécution à cause surtout de l'insécurité qui a régné dans la zone du Projet avec comme conséquence le non décaissement des fonds.

III.5. Economies et perte de change réalisées

Le budget prévisionnel des activités pour lesquelles le Projet a signé des contrats est de 63 367 970 USD tandis que les montants des contrats signés est de 48 575 860 USD. Par rapport au budget prévisionnel, il se dégage que le Projet a donc réalisé des économies de 14 792 110 USD pour ces différents contrats signés car les montants des contrats ont souvent été inférieurs aux budgets. Il convient de signaler particulièrement l'étude géophysique pour laquelle le Projet a économisé 3 348 142 USD car elle a coûté 655 400 USD pour un budget de 4 003 542 USD. Il y a également les travaux de lutte anti érosive pour la protection de l'AEP Tshikapa qui ont permis d'économiser 2 612 347 USD et la fourniture du carburant au profit de la REGIDESO de Tshikapa qui a permis d'économiser 834 845 USD. Ainsi donc les travaux de l'AEP Tshikapa ont permis de gagner au moins 3 447 192 USD. Il faut aussi noter deux activités que le PRISE ne va plus réaliser qui permettent de faire des économies substantielles de plus de 3 millions USD. Il s'agit de la mobilisation du cabinet avec l'expert en gestion de Projet dont le budget prévisionnel était de 1 176 405 USD et de la mission de contrôle et suivi des écoles, des Centres de Santé et des latrines avec un budget de 2 042 474 USD.

Ces économies peuvent être éclatées par composante dans le tableau suivant :


Tableau 3.17 : Economies réalisées par PRISE au 31 décembre 2017 par composante

Composante	Budget prévisionnel en USD	Montant des contrats en USD	Economies en USD	Economies en %
Composante A	47 618 124	40 498 570	7 119 554	48,1%
Composante B	8 800 390	3 623 267	5 177 123	35,0%
Composante C	6 949 456	4 454 023	2 495 433	16,9%
Total	63 367 970	48 575 860	14 792 110	100,0%

Ce sont les composante A avec 7 119 554 USD (soit 48,1%) et la composante B avec 5 177 123 USD (soit 35%) qui ont permis au PRISE d'économiser plus de 83 % des fonds prévisionnels.

Si on s'intéresse aux catégories des dépenses, le graphique qui suit nous renseigne.

Graphique 3.5 : Economies réalisées par PRISE au 31 décembre 2017 par catégorie

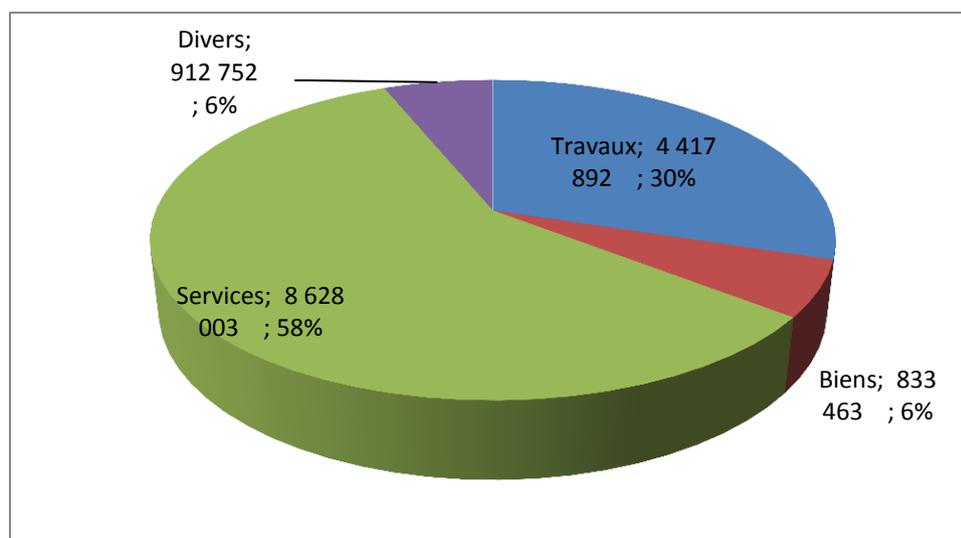

Ce sont les services avec 8 628 003 USD, soit 58% du total des économies et les travaux avec 4 417 892 USD (30%) qui ont permis au Projet d'économiser 88% des fonds prévisionnels.

Par source de financement, le tableau suivant nous renseigne :

Tableau 3.18 : Economies réalisées par PRISE au 31 décembre 2017 par source de financement

Source de financement	Budget prévisionnel en USD	Montant du contrat en USD	Economies en USD	Economies en %
Prêt FAD	1 949 507	1 949 505	2	0,0%
Don FAD	27 594 803	18 078 575	9 516 228	64,3%
RWSS Trust Fund	5 607 565	1 926 900	3 680 665	24,9%
FEF	28 216 095	26 620 880	1 595 215	10,8%
Total	63 367 970	48 575 860	14 792 110	100,0%

C'est donc à travers le don FAD qu'a été réalisé la grande partie des économies avec 64,4% suivi de RWSSI qui a permis d'économiser 25% des fonds avec 3,68 millions USD.

Tableau 3.19 : Economies réalisées par PRISE au 31 décembre 2017 par type d'intervention

Type d'intervention	Budget prévisionnel en USD	Montant du contrat en USD	Economies en USD	Economies en %
Latrines publiques	7 042 916	6 478 013	564 904	3,8%
Ecoles	10 703 446	10 204 748	498 698	3,4%
Centres de santé	9 123 638	8 722 977	400 661	2,7%
CMG	550 449	488 926	61 524	0,4%
Bureau du Projet	82 718	69 017	13 701	0,1%
Direction Nationale de l'Hygiène	180 475	168 111	12 364	0,1%
Voirie urbaine	11 474 680	8 862 331	2 612 350	17,7%
Service	12 228 550	3 267 945	8 960 606	60,6%
Equipements	1 109 088	946 518	162 570	1,1%
Fonctionnement	2 859 083	2 859 083	-	0,0%
Construction pour AEP Tshikapa	1 055 780	984 443	71 337	0,5%
Fournitures pour AEP Tshikapa	2 556 732	1 643 980	912 752	6,2%
Equipements scolaires	1 121 781	1 057 020	64 761	0,4%
Equipements de santé	3 278 633	2 822 748	455 885	3,1%
Total	63 367 970	48 575 860	14 792 110	100,0%

C'est dans les services que le Projet a épargné le plus avec 8 960 606 USD représentant 60,6% des économies réalisées. Ils sont suivis par les travaux de l'AEP Tshikapa qui représentent près d'un quart des économies réalisées avec 2 612 350 USD (17,7% des économies) pour la voirie urbaine et 6,2% soit 912 752 USD pour les fournitures. Il faut noter que les économies réalisées dans la construction des latrines publiques avec 564 904 USD, les écoles avec 498 698 USD et les Centres de Santé avec 400 661 USD ainsi que dans l'acquisition des équipements de Santé avec 455 885 USD avoisinent 2 millions USD représentant 13% des économies réalisées par le Projet au 31 décembre 2018.

Le Projet a aussi perdu des fonds à cause de pertes de change. En effet, à la signature de l'accord de don pour le PRISE, 1 UC valait 1,50396 USD mais les décaissements des fonds sont opérés en UC au taux du jour de paiement pour honorer les factures établis en USD. C'est ainsi qu'il y'a eu de perte change car l'Unité de Compte s'est déprécié vis-à-vis du dollar américains. Mais il y'a eu des provisions de 2,431 millions d'UC qui ont été faits pour faire face à l'inflation. Elles ont donc été entamées et la situation par composante nous est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 3.20 : Pertes de change réalisées par PRISE au 31 décembre 2017 par composante

Composante	Perte de change en UC	%	Provisions pour inflation en UC	Solde des prévisions pour inflation en UC	Solde des prévisions pour inflation en USD
Composante A	1 088 236	74,3%	2 075 000	986 764	1 484 053
Composante B	160 343	11,0%	161 700	1 357	2 042
Composante C	215 365	14,7%	194 000	- 21 365	-32 133
Total	1 463 944	100,0%	2 430 700	966 756	1 453 962

Il ressort de ce tableau que le Projet a perdu au 31 décembre 2017 1 463 944 UC dont 74,3% dans les activités de la composante A et 14,7% pour la composante C. Comme il y'avait 2 430 700 UC de provisions pour faire face à l'inflation, il reste un solde 966 756 UC pour continuer à faire face à la dépréciation de l'Unité de Compte face au dollar américain dont 986 764 UC pour la composante A. Il convient de signaler que la composante C qui avait des provisions de 194 000 UC a connu une perte de change de 215 365 UC et connaît déjà un déficit de 21 365 UC.

III.6 LES ACTIVITES DU GENRE DANS PRISE

a) Etudes

La cellule a participé et suivi le processus de passation de marchés pour le recrutement de la Firme en charge d'organisation des enquêtes pour la situation de référence, l'étude socioéconomique genre, l'élaboration du répertoire de la société civile et des PTF Genre. Toutefois l'ANO est déjà accordé et la structure prévoit démarrer les activités en mars 2018.

b) Construction et équipement du Centre Multifonctionnel Genre à Mbuji-Mayi

Le Centre Multifonctionnel Genre a été la 1^{ère} Infrastructure construite dans le cadre du PRISE, ce qui prouve à suffisance toute la place qu'occupe la prise en compte du genre dans la mise en œuvre du projet.

Il a été construit à Mbuji-Mayi, inauguré en juin 2016 et comprend

- une salle de conférence,
- un restaurant et une cuisine,
- deux dépôts,
- une salle d'exposition,
- deux salles d'accueil,
- six bureaux,
- des latrines et
- cinq chambres non encore équipées.

Ce centre abrite à ce jour, les 5 commissions (politique, juridique, économique, socioculturelle, jeune et petite fille) issues des recommandations de Beijing et constitue un cadre de concertation des femmes de la Province.

c) Formation

Dans le cadre de formation et renforcement des capacités des bénéficiaires, un voyage d'études avait été effectué avec les gestionnaires du CMFG à Moanda et à Kimpese sur l'apprentissage des méthodes de séchage des poissons et de la transformation des produits agroalimentaires en 2016. 18 personnes ont participé à ce voyage d'études dont 15 Femmes et 3 hommes respectivement : 6 membres du CPF, 5 membres du comité de gestion du CMFG, 1 représentante des vendeuses des poissons, 1 représentant des pêcheurs, 3 points focaux et l'Expert.

D'autres formations attendent l'ANO de la Banque en rapport avec les TDR pour le renforcement des capacités des gestionnaires du CMFG et la mise en place du logiciel comptable pour le Centre ainsi que le début des prestations de la Firme en charge de des activités d'IEC qui a la charge de la formation de 1000 femmes pour la promotion des AGR. Notons pour ce recrutement la participation de la cellule Genre au processus de passation du marché.

A l'initiative des Gestionnaires du CMFG et du Point Focal Genre local, des formations en alphabétisation sont organisées, tous les jours pairs :

- 151 femmes sont bénéficiaires de ces formations dont 78 femmes analphabètes et 73 semi-analphabètes.

On y organise également d'autres formations notamment la technologie appropriée et la transformation des aliments réalisées par les formateurs qui avaient été formés avec le financement du PRISE à Moanda et Kimpese dans la Province du Kongo Central. Pour ces dernières formations, les bénéficiaires, sont les membres des associations identifiées en vue d'un partenariat avec le CMFG.

d) **Fonds revolving de microréalisation**

Un processus de mise en place d'un mécanisme de gestion et de formation des gestionnaires du CMFG est en cours de finalisation. Il s'agit de la mise en place du logiciel comptable selon la gestion OHADA et de la formation des utilisateurs en cours de finalisation. Ceci constitue un préalable pour que soit déclenché le processus de mise en œuvre du processus d'octroi des micro-crédits aux structures des femmes et des jeunes qui devront à leur tour préparer des micro-projets afin d'être éligible.

Toutefois en 2017 deux manuels de gestion du Centre ont été élaborés, validés par la Banque et par les bénéficiaires. Il s'agit des manuels suivants :

1. Manuel de gestion administrative, financière du CMFG ;
2. Manuel de gestion des microcrédits.

e) **Equipements et matériels**

Le Centre a été équipé en 2016 avec les équipements suivant : 10 ordinateurs et accessoires, 8 imprimantes, 2 photocopieurs, 5 mégaphones, 2 écrans téléviseurs, 1 téléphone fixe et internet, 6 flipchats, 8 fauteuils, 16 chaises de bureau, 8 armoires, 15 tables et 30 chaises pour la salle des conférences, 5 meubles bureaux et 8 motos.

En 2017 (Décembre), Des équipements complémentaires ont été livrés au Centre. Il s'agit de :

- 6 congélateurs dont 2 électriques, 2mixtes (pétrole et électricité) et 2solaires ;
- 8glacières isothermes et de collectes.

Un processus est en cours pour l'acquisition d'autres équipements ou petits matériels de pêche dont les filets de pêches, les porte-tout ...

f) **Activités organisées au CMFG**

Le Centre a servi, au mois de Mars 2017, de cadre pour la commémoration de la Journée Internationale de la Femme ainsi que des conférences organisées pendant ce mois de la Femme.

Le CMFG est géré au quotidien par des Gestionnaires nommés par le Gouverneur de Province qui coordonnent et suivent les différentes activités qui s'y déroulent. Ils ont élaboré des notes d'offre de services qui sont déposées auprès des Organisations et Partenaires Techniques Financiers de la place en vue de mettre à leur disposition différents services notamment la location de la salle de conférence. Au cours de 2017, cette salle a été louée et sollicitée pour des réunions et ateliers au moins 7 à 8 fois pour des activités respectivement de 2 à 4 jours. Une comptabilité est tenue par la Chargée des finances conformément aux dispositions validées dans le manuel de gestion du CMFG.

Dans le cadre de suivi des recommandations du voyage d'études, de la mission de l'EGDS ainsi que du voyage du Coordonnateur au Kasai Oriental ; des petites activités mais pas à la dimension de Moanda et Kimpese sont menées par les Associations sous la coordination de la Commission Socioéconomique du CMFG. Les Membres reversent 20 USD au CMFG chaque mois à la caisse du CMFG suivant les recettes réalisées pendant le mois. Les femmes ont également installé des petits marchés de fortune aux abords des constructions des infrastructures.

g) Gestion et le Suivi-évaluation du CMFG

Le CPE et le Comité de gestion du CMFG ont élaboré leur plan d'action mais n'ont pas encore des financements pour réaliser leur rêve de voir tous les secteurs sollicités : le service de restaurant, l'hébergement...

Dans le cadre de suivi des activités du CMFG et de sensibilisation des bénéficiaires, 2 missions de terrain ont été réalisées au cours de 2017, une par l'Expert et une autre par le PF national Genre. Plusieurs recommandations ont été formulées aux différentes parties prenantes à l'issue desquelles certaines activités sont en train d'être menées et les résultats commencent déjà à être visibles. Sauf que beaucoup de femmes des Associations n'arrivent pas encore à braver la distance qui sépare le CMFG du Centre-Ville de Mbuji Mayi, ce qui ne facilite pas son accès pour les femmes qui doivent déboursier des frais de transport pour s'y rendre. Le CMFG commence à devenir un lieu de rendez-vous des femmes des Associations de Mbuji Mayi qui en sont les principales bénéficiaires mais également il y a des Visiteurs de passage à Mbuji Mayi qui passent visiter le CMFG. Des partenariats sont en train d'être conclus par le CMFG et certaines institutions de la place en vue de mener des actions conjointes au sein du CMFG. Le CMFG constitue un cadre d'échange et de concertation des femmes et deviendra sous peu le centre de rayonnement des activités des Associations et des femmes.

h) Activités d'IEC pour un changement de comportement et de formation

Notons la participation de la cellule au processus de recrutement de la firme en charge des activités d'IEC. Et le processus en est au niveau de la demande de l'ANO de la Banque. Cette firme est encore en charge des formations des acteurs locaux et de la mise en place des comités de gestion des infrastructures d'eau et d'assainissement.

Dans le cadre de la prise en compte de la dimension Genre au PRISE, la cellule Genre au cours de l'année 2017 a participé aux processus de passation des marchés pour le recrutement :

1. de la Firme en charge de l'élaboration de la situation de référence, du répertoire de la société civile et des PTF Genre ainsi que de la réalisation de l'étude socioéconomique Genre ;
2. de la firme en charge des activités d'IEC (Information, Education et Communication) pour le changement de comportement ;
3. de la structure en charge de la fourniture des équipements complémentaires du CMFG (processus clôturé et fourniture de 6 Congélateurs et 8Bacs isothermes réalisée en décembre 2017);
4. des jeunes stagiaires dans le cadre du programme d'apprentissage (recrutement de 6stagiaires réalisés dont 3filles et 3garçons ainsi que leur mise à niveau) ;
5. du bureau pour la conception et l'installation du logiciel comptable et de gestion du CMFG ;
6. des Experts nationaux : un expert-comptable et un expert en gestion financière ;
7. pour le consultant chargé de la réalisation d'une étude en vue de l'élaboration de la stratégie pour la mise en œuvre du PNAEAP en milieu rural et périurbain ;

i) Suivi des activités Genre dans les sites des travaux

L'année 2017 a été riche en activités au sein de PRISE, nous devons noter particulièrement les différentes constructions et l'équipement des infrastructures particulièrement les centres de santé, les écoles et les latrines. Ceci revêt une grande importance pour les femmes qui ont été associées dans toutes les étapes de ces activités en rendant divers services sur les différents chantiers qui

étaient ouverts. Elles étaient particulièrement présentes pour l'approvisionnement en eau et le transport des graviers. Leur nombre était très souvent inférieur à celui des hommes qui eux se retrouvaient dans la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité et la charpente.

La cellule a mis en place deux fiches de collectes des données dans les sites des travaux afin de mesurer le niveau d'intégration du genre et après compilation des données ; les sites ci-après ont fourni des informations demandées :

- **Pour le Kasai Occidental** dans son ancienne configuration, **13 sites** à savoir : Bakwambuyi, Bakuakenge, Bena- Samba, Ditalala, Domingo I, Kabwe, Mushenge, Domingo II, Nsapu Kumwamba, Tshinongo, Tshitesha, Kamonia Mayi Munene.
- **Pour le Kasai Oriental** (dans son ancienne configuration), **19 Sites** : Mbuji Mayi PMKO, Tshibumba, Tshilunde, Bakwa Tshijiba, Keena Nkuna, Matadi, Bakwa Tshiluila et Tshikuyi, Dikundi, Kankelenge, Nzevu, Katako, Lodja, Lubao, Tshiofa, Kanyama, Lusuku, Tshilenge-Cité, Cité de Miabi, Lupatapata Villade de Bakwa Lukoka, Bakwa Mbuyi/Lupatapata, Kabeya Kamwanga, Village Lac Munkamba, Dikundi/Kabeya Kamwanga, Kamiji, Hinterland de Mbuji Mayi/Site Tshibombo.

Elaboration du rapport relatif à la prise en compte du genre dans les sites des travaux de construction des infrastructures. Sur les 17 sites de construction de l'ancienne province du Kasai Oriental dont nous avons compilé les données nous envoyées, on trouve 9 chantiers pour la construction des centres de santé, 7 chantiers pour les écoles et 3 chantiers pour la construction des latrines. La main d'œuvre présente sur les sites est essentiellement masculine. C'est seulement à Matadi (66%) et à Lusuku où les femmes sont majoritaires (80% pour les chantiers de centres de santé) et il y a parité entre les hommes et les femmes (50%) pour les chantiers de construction des latrines. Il faudra noter que la présence massive des femmes est due au fait qu'elles s'occupent du transport de sable et des graviers, ce qui constitue un travail pénible. Les femmes exercent également le petit commerce au niveau des chantiers tels que la vente de la nourriture et tous le nécessaire pour le personnel masculin sur le chantier. La compilation, afin de bien tirer d'autres conclusions se poursuit.

La cellule a également assuré le suivi de la mise en œuvre des recommandations du voyage d'étude et des différentes correspondances qui ont été échangées entre le projet PRISE et le Secrétariat Général du Ministère du Genre, Enfant et Famille comme partie prenante du projet PRISE et principal bénéficiaire du CMFG en vue de leur implication dans la maximisation du fonctionnement du CMFG.

Quant à la prise en compte de la dimension Genre au PRISE, nous notons avec satisfaction l'implication des femmes au sein de la structure de gestion du Projet (Comité de pilotage, UEP,) dont l'implication du Ministère du Genre, des points focaux Genre au niveau national et Provincial et de l'assistant technique Expert en charge du Genre et de développement social.

La participation des femmes et des filles dans les travaux de construction des différentes infrastructures à savoir Centres de santé, écoles et latrines publiques et dans le même ordre d'idée, nous souhaitons la présence des femmes dans les différents comités de gestions des ouvrages d'eau potable et d'assainissement, la gestion des infrastructures, les travaux à haute intensité de main d'œuvre, et les associations des usagers de l'eau.

La cellule a élaboré une fiche de projet dans le souci de voir les femmes autonomisées dans toutes les zones de mise en œuvre de PRISE, à l'attention de la Direction Genre de la BAD en vue de solliciter un financement complémentaire pour la construction des infrastructures du genre

CMFG au total, 5 autres CMFG peuvent être construites en vue de l'autonomisation des femmes de cette partie de notre pays souvent sujettes à des discriminations dont elles sont l'objet.

III.7 L'INTÉGRATION DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DANS PRISE

L'Activité Principale relative au Suivi Environnemental et Social du Projet PRISE a été axée sur la vérification pour tous les contrats de travaux de la mise en œuvre des PGES y afférent et a été consolidée par les missions de terrain de faites par les Experts de l'Agence Congolaise de l'Environnement «ACE» et l'Expert Environnementalisme du projet pour un suivi sur des échantillons de sites de travaux d'écoles, de Centres de Santé et de latrines publiques dans les Provinces du Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental et Lomami ainsi qu'à Tshikapa pour les travaux de lutte antiérosive pour la protection des ouvrages hydrauliques de l'AEP de la ville.

Les sites examinés d'écoles, de Centres de Santé et de latrines publiques ont été choisis de manière hétérogène par rapport à toute la zone d'influence du projet.

- a) d'une manière générale, les travaux du PRISE ont un impact très favorable sur la situation socio-économique des villages et leurs environs et en symbiose avec le background authentique du contexte local de référence.
- b) selon la conception de l'intérêt général, appliquée à une croissance qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins est assurée : *les Nouvelles générations du milieu local bénéficieront d'une école publique adéquate, d'un assainissement public et d'un Centre Sanitaire de Base Fiable.*
- c) Le Taux d'Application du PGES Apprécié est moyen à ce stade de l'exécution des travaux, mais les Entrepreneurs sont prêts à mieux et se conformer aux recommandations des missions de suivi environnemental et social.

En ce qui concerne les travaux de « *Protection Antiérosive des ouvrages du système d'AEP de la ville de Tshikapa* », les considérations finales sont les suivantes :

- a) Un impact très favorable des travaux sur la situation Socio-économique de la ville et ses environs.
- b) La notion de Développement Durable, est assurée : *les Nouvelles Générations du Milieu Local, bénéficieront d'un Système d'Adduction, Traitement et Distribution de l'Eau bien protégé contre l'érosion.* La réduction des maladies liées à l'utilisation d'eaux insalubres est garantie.
- c) Toute la communauté locale de la ville de Tshikapa, profitera *d'un réseau routier moderne dans la ville, qui réduit le temps du déplacement, favorise le développement des activités commerciales, relance le transport en commun ; amélioré la qualité de la vie, encourage la scolarisation des jeunes générations, implémente la qualité du Système Sanitaire de Base et assure l'Ordre Public.*
- d) Quelques têtes d'érosion ont été mises en sécurité et une partie de la population peut bénéficier d'un niveau d'assainissement fiable.

IV. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.

Au cours de l'exécution du Projet depuis la signature des accords de financement, les difficultés suivantes ont été relevées :

- Le retard dans la mobilisation de l'équipe de coordination du Projet intervenue effectivement au 15 juillet 2014, soit sept (7) mois par rapport au calendrier initial du projet.
- Les sites d'interventions du projet n'ont été identifiés qu'en décembre 2014 et validés au mois de février 2015, soit une année et deux mois de retard en considérant la date de mise en vigueur du projet. La réalisation de ces préalables essentiels au démarrage des activités sur terrain n'ayant pas été pris en compte lors de l'élaboration du Projet et du calendrier prévisionnel de mis en œuvre, ils auront une incidence sur la date d'achèvement et les taux de décaissements annuels. La réalisation des études sur les bâtiments scolaires, sanitaires et des latrines ; des études géophysiques et de mini réseaux dont la durée réelle a pris une année sans tenir compte des délais d'approbation des processus de recrutement des firmes. Toutes ces études préalables, ont engendré un retard important d'environ deux ans sur le chemin critique du Projet.
- Concernant les mini-réseaux d'AEP, les ressources y affectées sont de l'ordre de 30% du coût du Projet et leur impact est réel sur les taux d'engagements et de décaissement. Le retard le lancement des travaux d'AEP Mbuji-Mayi dont l'actualisation des études et le DAOI sous financement de la KFW/REGIDESO ont été achevés au mois de mai 2016 au lieu de juin 2014 initialement prévu, soit près de 24 mois de retard. Il convient de signaler que pour cette activité, il n'était pas prévue au départ un co-financement avec la KFW mais au cours de l'étude, il s'est avérée indispensable pour une meilleure synergie des travaux sur terrain de lancer un seul processus d'acquisition pour recruter une seule entreprise pouvant exécuter simultanément les deux lots des travaux avec le financement de deux bailleurs compte tenu des implications techniques. La durée des travaux prévue étant de 32,5 mois et il convient de noter qu'il y aura une incidence certaine sur la date d'achèvement du projet. Cette activité prend plus de 25% des ressources du projet et son non lancement en 2017 a eu influencé la faiblesse des taux d'engagements et de décaissement en fin 2017. Les différents processus d'approbation des marchés requièrent une attention particulière et une célérité sur ce dossier et permettront de booster les activités du Projet en 2018.
- Les contraintes avec le retard du processus de recrutement des missions de surveillance et de contrôle des travaux ont entraîné l'annulation du processus qui ne se justifiait plus au regard de l'état d'avancement des travaux sur terrain ont impacté le suivi des travaux sur le terrain avec une augmentation des charges de fonctionnement et des équipes du Projet non prévues initialement ;
- La déclaration de la mise en vigueur du Prêt FAD n'est intervenue effectivement qu'en Août 2016 ; soit plus de 32 mois après la signature du Protocole d'accord. Ce retard a eu comme conséquence majeure la réduction du budget du Prêt en USD à cause de la dépréciation de l'UC, monnaie dans l'accord, par rapport au dollar américain qui est la monnaie des opérations. Au taux initial des accords, le Prêt évalué à 1.475.000UC pour 2.218.341USD, à la mise en vigueur du Prêt en août 2016, ce montant a été réduit à 2.050.250USD, soit une perte de ressources d'environ 7,6% et à l'achèvement des travaux en décembre 2016, le montant du Prêt s'est vu réduit à environ 1.917.500 USD représentant juste 86% du montant initial. Ici, il faut saluer le management du Projet qui a eu à anticiper sur ce risque qui pouvait être très important en lançant tous les processus avant la ratification et la performance de l'entreprise qui a achevé les travaux dans les délais sur préfinancement total, ce qui a limité l'ampleur de l'impact sur les activités prévues.

Il convient aussi de souligner que les fonds du Prêt ont permis de doter la ville de Tshikapa dans le cadre des travaux de lutte antiérosive de protection des ouvrages d'AEP, de bénéficier de :

- 1,028 km d'un tronçon additionnel en enrobé (chaussée souple) avec la construction de la route Lumumba du rond-point Djendje au Rondpoint 6h00 en passant par le Gouvernorat;
- 1,405 km de voirie en terre construite (avenue de la banque et avenue Kompunda /captage) avec 14.250 m³ de remblais pour le traitement des érosions ;
- 2.363 ml des caniveaux en béton armé construits avec les ouvrages connexes ;
- 47 ml de dalots.

En somme, avec l'intervention du PRISE, la ville de Tshikapa a bénéficié pour la première fois de 6,883 km de voirie moderne, 6.611 ml des caniveaux en béton armé construits et 198,2ml de dalots. Aujourd'hui comme impact immédiat, on est passé de zéro (0) taxis et taxis bus pour le transport en commun au mois de juin 2016 à plus de (trente) 30 voitures taxis et taxis bus au mois d'octobre 2016, plusieurs sites et les installations de la REGIDESO ainsi que le Gouvernorat de Province jadis menacés par la progression foudroyante des érosions ont été sauvés. Au cours de la période juillet-septembre 2017, le Projet avec la MDC et l'entreprise prépare la réception définitive pour la clôture du contrat.

Il faut aussi noter :

- La faible capacité des entreprises à répondre aux exigences des DAON ayant entraîné plusieurs relances des processus et le retard dans le démarrage des travaux des écoles, centres de santé et latrines publiques sur certains sites;
- L'insécurité dans plusieurs Territoires du projet ayant entraîné le retard de la mobilisation des entreprises et l'arrêt des travaux dans certains sites, c'est le cas notamment de Dibaya, Hinterland de Kananga, Demba, Dimbelenge, Kabeya Kamuanga, Miabi, Mwene Ditu, Tshikapa et Luiza. Toute la zone d'intervention du Projet a été touchée étant donné ces Territoires constituent les points d'accès ou de passage pour l'approvisionnement des autres Territoires des cinq nouvelles Provinces de l'espace kasaïen. Cette insécurité a eu aussi comme conséquence que voulu. Ceci a entraîné parfois certains retards.
- Le nombre insuffisant de personnel de l'UEP face à l'ampleur et la complexité des activités du Projet, surtout pour les processus des marchés nécessitant un recours aux personnes externes, provenant d'autres institutions, qui ne sont toujours pas disponibles dans les délais prévus du Projet nécessitant une attention particulière,
- Le désistement des candidats Consultants Assistants Techniques en Suivi-Evaluation et Genre/Développement Social à la signature des contrats a retardé le lancement de certains processus mais, sans attendre le Projet a poursuivi le programme des activités en produisant le guide de gestion du CMFG, les AMI et TDRs pour les campagnes d'IEC, les indicateurs de références du Projet, les études socio-économiques genre, le répertoire des associations et partenaires financiers, etc.

Le retard dans la désignation des membres du Conseil Provincial de la Femme et de l'équipe de gestion du CMFG par la Province du Kasai Oriental, soit plus d'une année après , n'a pas permis au Projet d'organiser le voyage d'études et d'échange d'expériences pour renforcer les capacités des membres de l'équipe de gestion du CMFG et lancer les activités des AGRs avec la mise à disposition du fonds de roulement pour les micro-crédits dans les délais prévus.

CONCLUSION

Le PTBA du PRISE pour 2017 était de 53 706 276 USD essentiellement destinés à financer les activités de la composante A pour les Infrastructures Socio-Economiques qui représentent 91% de financement. Par catégorie, ce sont les travaux avec 68% qui prennent la grande partie des dépenses prévisionnelles avec 68% et les biens avec 17% et les services avec 12% se partagent la grande partie du reste des dépenses. Le fonctionnement et les divers n'interviennent que faiblement dans les dépenses prévisionnelles du PRISE en 2017. Pour les sources de financement, c'est du FEF (69%) et du on FAD (26%) que le PTBA du PRISE va tirer 95% de ses ressources financières. Au 31 décembre, seulement 10,6 millions USD ont été décaissés, soit un taux de réalisation du PTBA 2017 de seulement 20 % due particulièrement à la faiblesse des décaissements de la composante A (17,5%), de la catégorie des travaux (20%) à cause de la non signature du contrat de l'AEP Mbuji Mayi, des mini réseaux et celle des biens (14%) qui n'a pas encore connu décaissements depuis le début de l'année.

Au 31 décembre 2017, PRISE en cumul a signé 119 contrats pour un **montant total de 48 575 859 USD** soit un **taux d'engagements de 30,7%**. C'est la composante A pour les infrastructures qui prend la grande partie de ces ressources avec 83,4%. Les composantes B et C ont bénéficié respectivement de 7,5% et 9,2% des engagements cumulés du projet depuis le début de sa mise en œuvre. C'est dans les catégories des travaux, des biens et des services avec respectivement 72,7 et 11,4% des engagements qu'ont été signés 84,4% du montant global des contrats. Le fonctionnement, les services et les Divers n'ont bénéficié d'environ 16% de montant des engagements contactés. Les taux d'engagements physiques est de 100% pour les écoles (60 sur 60), Centres de Santé (60 sur 60) et les bâtiments administratifs et de 102 % pour les latrines (506 sur 494).

Il faut noter que le Projet a réalisé des économies de 14 792 110 USD par rapport au budget prévisionnel lors de la signature des contrats. En effet, pour certains contrats, le montant ont été inférieurs au budget prévu. Ces économies vont permettre à la revue à mi-parcours de prendre en compte les besoins supplémentaires exprimés par les bénéficiaires.

Le taux d'exécution global est 27,1% pour un taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE. En s'intéressant aux composantes, on remarque que les composantes B et C ont connu des forts taux d'exécution physique avec respectivement 97,5 et 93,1% mais la composante A qui est la clé du projet n'a connu que 69% de taux moyen d'exécution physique. Néanmoins, ce taux a connu une hausse de 17 points par rapport au deuxième trimestre 2017.

En fin 2017, le cumul des fonds décaissés par le projet a atteint **27 489 956 USD** représentant un taux de décaissement de 17,4% par rapport au budget global du projet et un taux de paiement de 56,6% par rapport aux engagements de 48 575 859 USD pris par le projet.

Au titre des risques,

Il y a lieu de noter :

- ▶ Le délai assez long des processus d'obtention de l'ANO des travaux des mini-réseaux d'AEP en milieu rural et des travaux d'AEP de Mbuji-Mayi dont le budget représente près de 50% des ressources du Projet. La sous-estimation de la complexité de la mise en œuvre de ces activités notamment pour les études préalables va certainement impacter la date d'achèvement du Projet malgré les efforts fournis par la Coordination du Projet pour raccourcir les délais de certaines étapes ;
- ▶ La forte dépréciation de l'Unité de Compte par rapport au dollar américain et l'Euro a diminué de 1 463 944 UC les ressources du Projet qui risque de ne pas faire face à certaines dépenses faute de moyens financiers. Il convient de signaler que 2 430 700 UC de provisions pour inflation avaient été prévus dans le budget du Projet. A ce montant, il reste encore 966 756 UC soit 1 453 962 USD au taux de change initial de la signature de l'accord de don pour le Projet.
- ▶ L'insécurité qui a commencé en août 2016, a sensiblement diminué permettant une accélération des activités sur terrain avec le début de livraison des travaux des écoles, centres de santé et latrines publiques en 2017 qui devaient s'accélérer au premier semestre 2018.
- ▶ La situation sécuritaire dans la zone d'intervention du Projet s'est améliorée et s'est stabilisée permettant la fabrication des équipements scolaires et leur livraison dans certaines écoles ainsi que la livraison des équipements médicaux. Les médicaments sont déjà disponibles et n'attendent que l'achèvement des Centres de Santé pour leur livraison.

A. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

B. SATISFACTION DES CONDITIONS DES PRETS ET DONNS

C. EVENEMENTS SAILLANTS AU 31 DECEMBRE 2017

D. CONTRATS SIGNES PAR PRISE AU 31 DECEMBRE 2017

E. ACTIVITES SANS ENGAGEMENTS AU 31 DECEMBRE 2017

F. QUELQUES PHOTOS RECENTES DES REALISATIONS DU PROJET

A. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET.

Depuis 2016, le Projet a connu les missions et réunions de suivi des activités, dont les principales sont reprises ci-après :

Tableau A.1 : Activités de suivi de la mise en œuvre du PRISE

Mission	Période	Réunions-et revues trimestriels	Période sous revue.
Supervision et décaissement BAD du Mois d'Avril 2016.	Avril 2016	Revue trimestriel du CSPP du 05 mai 2016	Janvier- mars 2016
Inauguration du CMGF par le Ministre du Développement Rural et celui de Genre	Juin 2016	Revue trimestriel CSPP du 28 juillet 2016	Avril-juin 2016
Audit externe des comptes 2014/2015	Mai-juin 2016	Revue trimestriel CSPP du 10 Novembre 2016	Juin et septembre 2016
Supervision BAD	Octobre 2016	Revue semestriel BAD du 05 Juillet 2016.	Janvier – juin 2016
Suivi par le Président du Comité de Pilotage des travaux de LAE et AEP TSHIKAPA	Novembre 2016	Suivi activités sur terrain	Année 2016.
Atelier de validation étude préliminaire microcentrale de Lovua (MINERH, MINIDR, REGIDESO, SNEL, UCM, BAD, PRISE, SHER)	Janvier 2016	Atelier de validation étude préliminaire microcentrale de Lovua (MINERH, MINIDR, REGIDESO, SNEL, UCM, BAD, PRISE, SHER)	Janvier 2016
Mission pour la remise de l'AEP de Tshikapa	Mars 2017	Mission pour la remise de l'AEP de Tshikapa	2016-2017
Audit externe des comptes 2016	Avril-mai 2017	Revue trimestriel CSPP du 10 Novembre 2016	Juin et septembre 2016
Revue des performances du portefeuille de la BAD en RDC au 30 juin 2017	Du 26 au 28 juillet 2017	Revue bi annuelle	1 ^{er} juillet 2015 au 30 juin 2017
Réunion CSPP	Novembre 2017	Revue trimestrielle	Juin-sept 2017
Mission de supervision BAD 26/10 au 08/11/2017 avec visites de terrain dans trois provinces	26/10 au 08/11/2017		Janvier-novembre 2017
L'Audit Général du Siège de la BAD.	Du 08 au 17 décembre 2017	Avec visites des sites de Tshikapa	2014-2017 Avec Aide-mémoire signé
Réunion de revue de performance avec l'Administrateur de la BAD en Charge de l'Afrique Centrale	Décembre 2017		2017

B. SATISFACTION DES CONDITIONS DES PRETS ET DONNS.

La mise en œuvre effective des protocoles des prêts et Dons sus évoqués est subordonnée au respect d'un certain nombre des conditions qui peuvent être regroupées en deux catégories : celles qui se rapportent au premier décaissement et aux autres types d'engagements.

Tableau A.2 : Niveau de satisfaction des conditions des Dons et Prêts

Types de condition	Description	Etat d'avancement/situation actuelle
Respect des conditions préalables au premier décaissement	Fournir à la Banque la preuve de l'ouverture de deux comptes spéciaux au nom du Projet dans une institution financière jugée acceptable par la BAD, destinés à recevoir les ressources du Don FAD et du Don IAER (RSSWI)	Réalisée en juillet et août 2014
	Fournir la preuve de la désignation des cadres nationaux tant au niveau central qu'au niveau provincial, dont les qualifications et expériences professionnelles auront préalablement été approuvées par la Banque	Réalisée par l'Arrêté Ministériel n°305/CAB/MIN/A GRIDER/CJ/KKM/2014 du 19 juin 2014, mais l'équipe n'a été effective qu'au mois de juillet de la même année
Respect des autres conditions	Transmettre à la Banque, pour approbation et Avis de Non Objection, au plus tard six mois après la date du premier décaissement des ressources, les manuels des procédures d'exécution et de gestion administrative et financière du Projet.	Réalisé Manuel transmis à la Banque à travers la lettre N°CN/074/PRISE/03/2015 du 17/03/2015
	Présenter la preuve d'affectation du personnel nécessaire de la Direction des Infrastructures et Aménagement Rural au plus tard le 31 décembre 2014	Encours de réalisation. La mise en place de la Direction des Infrastructures et Aménagement Rural dépend notamment du processus général de la réforme de l'Administration qui est en cours de réalisation
	Mise en place d'un plan de gestion environnementale et sociale du Projet. Le Projet a obtenu le certificat d'acceptabilité environnementale n° 005/CAB/MIN/EDD/15/BLN/2015 du 07 mai 2015	Réalisé Arrêté n° 024 / CAB / MIN / EDD / 03 / 22 / BLN / 2015 du 07/05/2015 du MINEDD

	Présenter la preuve de l'adoption du code de l'eau au plus tard le 31 décembre 2015	<p>Réalisée : La loi N°15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau en République démocratique du Congo a été publiée sur le journal officiel depuis le 04 janvier 2016.</p>
Entrée en vigueur de la ratification de l'accord de prêt.		<p>Réalisée : En date du 03 mai 2016 la loi n°16/002 autorisant la ratification de l'accord de prêt du 07 janvier conclu entre la RDC et la BAD au titre de Financement du PRISE a été publiée dans le journal officiel n°11 du 1er Juin 2016. Notification de satisfaction des conditions de la mise en œuvre du Prêt de la BAD n°258/CDFO/RR/O WAS/07/2016/obm du 22 juillet 2016</p>

C. EVENEMENTS SAILLANTS AU 31 DECEMBRE 2017.

Evènements	Date	Responsable
Première réunion du Comité de Pilotage pour l'adoption du PTBA 2014.	Le 08/08/2014	SGDR
Atelier National de lancement officiel du Projet.	Du 13 au 15/10/2014	MINAGRIDER/SGDR/BAD
Mission de pré-identification des sites du projet	Du 16 au 21/12/2014	PRISE
Deuxième réunion du Comité de Pilotage pour l'adoption du PTBA 2015	Le 13 janvier 2015	SGDR/MINADER
Atelier Provincial de lancement officiel du projet à Mbuji-Mayi	Le 14 /02/2015	SGDR/ MINADER/BAD
Atelier Provincial de lancement officiel du projet à KANANGA.	Le 21/02/2015	SGDR/ MINADER/BAD
Troisième réunion du Comité de Pilotage pour la validation du manuel des procédures de gestion administrative, comptable, financière et de passation des marchés	11 mars 2015.	SGDR/ MINADER/BAD
Atelier de Validation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)	Du 20 au 22 Avril 2015.	SGDR/ MINADER/BAD
Quatrième réunion du Comité de Pilotage pour l'adoption du PTBA 2016.	Le 21 décembre 2016	SGDR/MINADER
Réception provisoire et inauguration du CMFG Mbuji-Mayi	21 juin 2016	PRISE(SGDR)/ CP (SG GENRE)
Réception provisoire des travaux de la lutte anti érosive pour la protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la REGIDESO.	Le 21 septembre 2016	PRISE/ REGIDESO-OVD
Réception provisoire des travaux supplémentaires de la lutte anti érosive pour la protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la REGIDESO.	Le 15 Décembre 2016	PRISE/REGIDESO-OVD
Réception définitive des groupes électrogènes fournis à l'AEP Tshikapa et les travaux connexes	Le 19 novembre 2016.	PRISE/ REGIDESO
Entrée en vigueur de la loi n°16/002 du 03 mai 2016 autorisant la ratification de l'accord de Prêt FAD du PRISE (publiée dans le journal officiel n° 11 du 1 ^{er} Juin 2016).	Le 13 juillet 2016	Présidence de la République
Promulgation de la loi sur l'eau	le 04 janvier 2016.	Présidence de la République.
Cinquième réunion du Comité de Pilotage pour l'adoption du PTBA 2017.	Le 01 février 2017	SGDR/MINADER
Réception définitive du CMFG	Le 8 juillet 2017	PRISE/CP

D. Contrats signés par PRISE au 31 décembre 2017

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
COMPOSANTE A. DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES												
CATEGORIE TRAVAUX												
1	Travaux de construction du Centre Multifonctionnel Genre dont le démarrage des travaux était le 12 Août 2015.	445 172	021/PRISE-BAD /UEP/CN /CA/CT/AON/PM/07/2015	388 600	388 600	278 073	100%	FAD	AON	à priori	28/07/2015	100%
2	Réhabilitation/construction du bâtiment pour les bureaux de la Direction National d'hygiène à Kinshasa, date de démarrage des travaux le 24 septembre 2015.	180 475	025/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/09/2015	168 111	153 351	110 404	91%	FEF	AON	à priori	18/09/2015	100%
3	Réhabilitation des locaux pour bureaux de la Coordination Nationale de l'UEP/PRISE	30 079	027/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/DAC/PM/10/2015	24 758	24 758	17 698	100%	FEF	DAC	à priori	21/10/2015	100%
4	Réalisation des travaux Réhabilitation du bâtiment Administratif pour bureau de l'Antenne du Projet à Kananga	52 639	030/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/DAC/PM/10/2015	44 259	31 733	22 839	72%	FEF	DAC	à priori	23/10/2015	100%
5	Réalisation des travaux de la lutte Antiérosive pour la protection des conduites et des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la REGIDESO par les travaux des routes asphaltées, routes en béton et caniveaux de drainage. Le contrat a été signé le 13 novembre 2013 et la remise de site pour le démarrage des travaux le 28 novembre 2015.	8 158 170	032/PRISE-BAD /UEP/CN /CA/CT/AOI/PM/11/2015	6 791 168	6 621 281	4 731 088	97%	FAD	AOI	à priori	13/11/2015	100%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
6	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans le site de Luebo cité de Ndjoko / Punda lot 1	460 000	No 051/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	431 664	138 271	99 600	32%	FEF	AON	à postériori	05/08/2016	40%
7	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans le site de Konyi / Kakulua lot 2	430 000	No 052/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	384 683	76 937	56 004	20%	FEF	AON	à postériori	05/08/2016	36%
8	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans le site de Kamonia / Diboko lot 3	650 000	No 053/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	549 202	211 555	152 035	39%	FEF	AON	à postériori	05/08/2016	41%
9	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de santes et aménagement des latrines publiques dans le site de mayi munene lot 4	400 000	No 054/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	360 211	256 756	182 864	71%	FEF	AON	à postériori	05/08/2016	92%
10	Travaux de rehabilitation des batiments scolaires, centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans le site de Tshimbulu / Dibaya lot 1	545 000	No 055/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	533 850	482 165	345 606	90%	FEF	AON	à postériori	12/08/2016	85%
11	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans le site de Kawulu / Tshikulu / Bukonde	710 000	No 056/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	683 848	357 868	257 905	52%	FEF	AON	à postériori	12/08/2016	38%
12	Travaux réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines a Keena Nkuna / Matadi	415 000	No 058/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	353 660	173 125	124 759	49%	FEF/RWSSI	AON	à priori	17/08/2016	25%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
13	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans le site de Mashala / Dimbelenge	430 000	No 059/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	426 447	206 407	146 706	48%	FEF	AON	à postériori	24/08/2016	63%
14	Travaux réhabilitation des batiments scolaires, centres de sante et amangement des latrines a Ntambwe St Bernard / Luandanda, lot 02	650 000	No 060/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	716 285	471 189	343 373	66%	FEF	AON	à priori	31/08/2016	84%
15	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines à Diofa / Zapozapo / Tshibungu, lot 03	345 000	No 061/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	394 378	104 781	77 158	27%	FEF/RWSSI	AON	à priori	31/08/2016	14%
16	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines a Ntambwe St Bernard / Luandanda, lot 04	485 000	No 062/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	525 957	203 968	149 012	39%	FEF	AON	à priori	31/08/2016	35%
17	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines a tubuluku, lot 01	505 000	No 063/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	478 114	178 081	130 094	37%	FEF/RWSSI	AON	à priori	05/09/2016	52%
18	Travaux réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines à Katakokombe, lot 01	400 000	No 064/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	422 019	81 721	58 779	19%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	12/09/2016	48%
19	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines à Lodja, lot 02	460 000	No 065/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	485 549	162 745	116 947	34%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	12/09/2016	74%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
20	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines à Moma / Masuika / Tulumbe , lot 04	430 000	No 066/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/08/2016	349 140	97 699	71 149	28%	FAD/FEF	AON	à postériori	08/09/2016	33%
21	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines à Domiongo / Mushenge , lot 03	430 000	No 067/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	367 963	291 200	208 779	79%	FAD/FEF	AON	à postériori	07/10/2016	98%
22	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines a cité de Tshilenge , Lot 01	400 000	No 072/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	329 369	65 874	47 921	20%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	14/10/2016	23%
23	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines a l'hyterland de Mbuji Mayi, Lot 03	625 000	No 073/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	538 428	107 686	78 599	20%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	14/10/2016	13%
24	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines a Kanyana , lot 05	400 000	No 074/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	317 590	63 518	45 944	20%	FEF	AON	à postériori	14/10/2016	31%
25	Réalisation des Travaux supplémentaires de la lutte Antiérosive pour la protection des conduites et ouvrage des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la REGIDESO.	1 949 505	No 075/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/10/2016	1 949 505	1 900 768	1 398 585	98%	Prêt FAD	SED	à priori	03/10/2016	100%
26	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines à Luputa / Lusuku / Mwene Ditu , lot 07	520 000	No 077/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/10/2016	499 926	179 290	132 048	36%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	14/10/2016	88%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
27	Travaux de réhabilitation /construction des écoles, Centres de Santé et aménagement des latrines	400 000	No 080/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/10/2016	410 319	154 254	111 214	38%	FAD/FEF	AON	à postériori	15/11/2016	42%
28	Travaux de réhabilitation / construction des écoles, Centres de Santé et aménagement des latrines	430 000	No 081/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/10/2016	416 963	161 334	116 779	39%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	15/11/2016	62%
29	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques les territoires de Kabinda et de Lubao site de Kamende / Cité de Kabinda, Lot 1	255 000	No 082/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/12/2016	268 211	89 251	64 877	33%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	20/12/2016	51%
30	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans les Territoires de Kabinda, Kamiji et de Luilu dans l'ex-province du Kasai-Oriental lot 1 à Nkumba Tshizuba/Bashimikie	430 000	No 084/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	370 586	127 504	92 429	34%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	14/02/2017	32%
31	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabinda, Kamiji et de Luilu dans l'ex-province du Kasai-Oriental lot 4 à Lubi Gare/Kele Gare	435 000	No 085/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	449 500	91 842	64 960	20%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	17/02/2017	61%
32	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya – Kamwanga, Miabi, Lupatapata	430 000	No 086/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	489 101	189 717	137 098	39%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	21/02/2017	66%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
	et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 5 à Kankelenge/Tshilanda/Tshibombo											
33	Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires des Katakokombe, Kole, Lodja et Lomela dans l'ex-province du Kasai- oriental lot 3 à la Cité de Lomela	400 000	No 087/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	436 176	87 235	61 639	20%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postérieur	22/02/2017	12%
34	Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires des Katakokombe, Kole, Lodja et Lomela dans l'ex-province du Kasai- oriental lot 4 Kole Cité/Village Olenga	280 000	No 088/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	292 089	58 418	41 250	20%	FEF/RWSSI	AON	à postérieur	22/02/2017	9%
35	Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires des Katakokombe, Kole, Lodja et Lomela dans l'ex-province du Kasai- oriental lot 5 à Bene Dibebe	385 000	No 089/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	423 331	84 666	59 744	20%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postérieur	22/02/2017	24%
36	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya – Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 3 à la Cité de Katanda/Bakwa Tshiluila	460 000	No 090/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	389 331	129 367	92 225	33%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postérieur	24/02/2017	81%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
37	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya – Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 4 à Tshikuyi/Bibanga	265 000	No 091/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	231 321	60000,72	42983,16892	26%	FEF/RWSSI	AON	à postériori	24/02/2017	72%
38	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Dibaya et de Luiza dans l'ex-province du Kasai-Occidental lot 4 à Luiza cité	430 000	No 092/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	410 984	294311,25	209988,2794	72%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	24/02/2017	96%
39	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya – Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex-province du Kasai-Oriental lot 2 à Dikundi/Lac Mukamba	430 000	No 093/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	488 805	194 019	140 288	40%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	24/02/2017	58%
40	Travaux de réhabilitation/construction des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de dans les territoires de Kabeya –Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 6 à Tshilunde	400 000	No 094/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	391 023	218 339	157 985	56%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	24/02/2017	71%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
41	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya – Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 7 à Miabi Cité	430 000	No 095/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	427 089	247 735	178 566	58%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	28/02/2017	75%
42	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Kabeya – Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda dans l'ex province du Kasai-Oriental lot 8 à Bakwa Sumba/Tshilundu	450 000	No 096/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/02/2017	496 023	293 574	212 600	59%	FEF/RWSSI	AON	à postériori	28/02/2017	83%
43	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Dibaya et de Luiza dans l'ex-province du Kasai-Occidental lot 2 à Tshidimba	390 000	No 097/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/03/2017	357 729	71 546	50 442	20%	FAD/FEF	AON	à postériori		27%
44	Travaux de Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Mweka, Ilebo et Dekese Lot 1 Mweka Cité	400 000	No 098/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/03/2017	368 682	221 125	157 219	60%	FAD/FEF	AON	à postériori	17/03/2017	81%
45	Travaux de Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Mweka, Ilebo et Dekese Lot 2 MALONGO/KAKENGE	345 000	No 099/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/03/2017	317 352	40271,73	28544,3	13%	FAD/FEF	AON	à postériori	17/03/2017	29%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
46	Travaux de Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de KATAKOKOMBE, LUBEFU et LUSAMBO dans l'Ex- province du Kasai-oriental, Cité de Lusambo	430 000	No 100/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/03/2017	395 363	220 987	158 329	56%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	27/03/2017	79%
47	Travaux de Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans l'interland de Kananga et dans le territoire de Demba dans l'ex province de Kasai Occidental Lot 6 BakuaMbuyi/BakuaNkenge	400 000	No 101/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/03/2017	323 492	111 526	80 368	34%	FAD/FEF	AON	à postériori	27/03/2017	31%
48	Travaux de Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de KATAKOKOMBE, LUBEFU et LUSAMBO dans l'Ex- province du Kasai-oriental lot 2 ,Site de Tshumbe/Wembonyama	410 000	No 103/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/03/2017	365 686	45355,08	32156,4	12%	FAD/FEF	AON	à postériori	17/04/2017	20%
49	Travaux de Réhabilitation/construction des écoles, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans l'interland de Kananga et dans le territoire de Demba dans l'ex province de Kasai Occidental Lot 5 Benaleka	430 000	No 104/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/SED/PM/03/2017	451 192	51392,48	36577,56093	11%	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	17/04/2017	61%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
50	Travaux supplémentaires de Protection Antiérosive des Ouvrages du Système d'Alimentation en Eau Potable de Tshikapa /FAD	1 367 003	No 108/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CT/SED/ PM/05/2017	121 658	118 616	83 990	97%	FAD	SED	à priori	30/05/2017	100%
51	Travaux d'aménagement des latrines publiques dans les provinces du Kasai-Oriental et de Lomami lot 1, province du kasai-oriental	220 000	No 109/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/ AON/PM/06/2017	139 681	57 011	40 822	41%	FEF/RWSSI	AON	à postéri ori	09/06/2017	78%
52	Travaux d'aménagement des latrines publiques dans les provinces du Kasai-Oriental et de Lomami Lot 2, Province de Lomami	140 000	No 110/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/ AON/PM/06/2017	119 177	0	0	0%	RWSSI	AON	à postéri ori	09/06/2017	73%
53	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans le site de Katende / lac Munkamba lot 3	595 000	No 111/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/ AON/PM/06/2017	560 288	112729,71	79702,9068	20%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postéri ori	09/06/2017	48%
54	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans le site de Kasamba lot 2 Province de Lomami	205 000	No 112/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/ AON/PM/06/2017	171 208	0	0	0%	FEF	AON	à postéri ori	23/06/2017	11%
55	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques à Kamiji Mission / Malenga Lot 3 Province de Lomami	280 000	No 113/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/ AON/PM/06/2017	239 689	39839,74	28194,35	17%	FEF/RWSSI	AON	à postéri ori	23/06/2017	12%
56	Travaux de réhabilitation/construction des bâtiments scolaires, centres de santés aménagement des latrines publiques dans les territoires	650 000	No 114/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/ AON/PM/06/2017	661 939	93 515	65 381	14%	FAD/FEF	AON	à postéri ori	29/06/2017	2%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
	de Mweka, d'Ilebo et de Dekese Lot 6, Site de Dekese Cité/ Bolonga											
57	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagement des latrines publiques dans le site de Bana ba Ntumba / Bena Tshiadi / Bena Nkana lot 2	460 000	No 115/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/06/2017	467 577	132 388	92 551	28%	FAD/FEF	AON	à postériori	29/05/2017	0%
58	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de santé et ménagement des latrines publiques dans les territoires de Kazumba et Luiza dans l'ex- province du Kasai Occidental Sites de Kazumba Cité/Ndekesha Lot 1	475 000	No 118/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/07/2017	411 959	82 392	57 578	20%	FAD/FEF	AON	à postériori	31/07/2017	6%
59	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de santé et ménagement des latrines publiques dans les territoires de Kazumba et Luiza dans l'ex- province du Kasai Occidental Site de Masuika Lot 5	430 000	No 119/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/07/2017	405 381	81 076	56 664	20%	FAD/FEF	AON	à postériori	31/07/2017	4%
60	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de santé et ménagement des latrines publiques dans les territoires de Kazumba et Luiza dans l'ex- province du Kasai Occidental Site de Masuika Lot 2	400 000	No 120/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/07/2017	363 730	0	0	0%	FAD/FEF	AON	à postériori	31/07/2017	4%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
61	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Mweka, Ilebo et Dekese site de Basongo/Mapangu Lot 5	390 000	No 121/PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/07/2017	348 100	0	0	0%	FAD/FEF	AON	à postériori	11/08/2017	1%
62	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et Aménagements des Latrines dans les territoires de Tshilenge, Ngandajika, Mpanya Mutombo et dans l'Hinterland de Mbuji-Mayi Lot 6, Site de Mpanya Mutombo	400 000	No123.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/09/2017	439 605	87921,05	62489,4614	20%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	04/09/2017	0%
63	Travaux de réhabilitation/construction des bâtiments scolaires, centres de santé aménagement des latrines publiques dans les territoires de Mweka, d'Ilebo et de Dekese Lot 4, Site de IleboCité/Malumalu	460 000	No125.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/09/2017	411 564	4247,42	3002,26	1%	FAD/FEF	AON	à postériori	23/07/2017	32%
64	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques Lot 5 Site de Wikong/Kanda Kanda, Province de Lomami	327 000	No126.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/09/2017	160 769	0	0	0%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	08/08/2017	30%
65	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques Lot 6 Site de Kapaku/Kalenda Gare, Province de Lomami	270 000	No127.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/09/2017	233 055	0	0	0%	FAD/FEF/R WSSI	AON	à postériori	08/08/2017	1%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
66	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires Kazumba et Luiza dans l'ex- Province du Kasai Occidental site de Tshibala/Mbulungu	280 000	No128.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/010/2017	235 933	0	0	0%	0	FAD/FEF	AON	à postériori	2%
67	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires les territoires de Kabeya Kamwanga, Miabi, Lupatapata et Katanda, Lot 9 site de Katende/Bakwa Sumba	385 000	No129.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/010/2017	380 265	0	0	0%	0	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	0%
68	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagements des Latrines dans les territoires de Tshilenge, Ngandajika, Mpanya Mutombo et dans l'Hinterland de Mbuji-Mayi Lot 2, Site de Tshinanu/Lukalaba	420 000	No131.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/011/2017	388 799	0	0	0%	0	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	0%
69	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, Centres de Santé et aménagements des Latrines dans les territoires de Tshilenge, Ngandajika, Mpanya Mutombo et dans l'Hinterland de Mbuji-Mayi Lot 4, Site de Kaseki	400 000	No132.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/011/2017	349 410	0	0	0%	0	FAD/FEF	AON	à postériori	0%
70	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires de Katakokombe, Lubefu et Lusambo dans l'Ex-Province du Kasai Oriental	415 000	No133.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/11/2017	392 050	0	0	0%	0	FAD/FEF/RWSSI	AON	à postériori	0%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
	Lot1, Cité de Lubefu											
71	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines publiques dans les territoires Kazumba et Luiza dans l'ex- Province du Kasai Occidental Lot 3, site de Malandji/Bilomba/Mutefu/Mikalayi	460 000	No135.PRISE-BAD/UEP/CN/CA/CT/AON/PM/011/2017	406 520	0	0	0%	0	FAD/FEF	AON	à postériori	0%
Sous Total catégories travaux		39 050 044		34 893 388	17 084 832	12 282 603	48,96 %					57%
CATEGORIE BIENS												
1	Acquisition et équipement des installations d'AEP de la REGIDESO des 8 groupes électrogènes d'une puissance total de 1,628 Méga Watt, 5 citernes de 30 m3 chacun fournis et les travaux connexes réalisés pour l'alimentation de la ville de Tshikapa en eau Potable.	1 515 992	003/PRISE-BAD/UEP/CN/INFR/CB/AOI/PM/01/2015	1 157 694	1 157 694	828 877	100%	FAD/FEF	AOI	à priori	03/02/2015	100%
2	Equipement de bureau et matériels informatiques du CMFG Mbuji Mayi	45 119	028/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/10/2015	51 196	51 196	37 088	100%	FAD	ACF	à priori	21/10/2015	100%
3	Assurer l'acquisition des huit motocycles pour CMFG de Mbuji-Mayi	30 079	029/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/011/2015	23 840	23 840	17 270	100%	FAD	ACF	à priori	21/10/2015	100%
4	La Fourniture et l'installation de deux Groupes Electrogènes 12.5KVA pour le CMFG de Mbuji-Mayi	30 079	034/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/11/2015	25 290	25 290	18 321	100%	FAD	ACF	à priori	11/12/2015	100%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
5	Fourniture de 1350 bancs, 54 tables pour maîtres, 54 chaises pour maîtres et 54 armoires pour 9 écoles des Territoires de Kabinda, de Kamiji, de Lubao, de Luilu et de Ngandajika lot 2	198 625	No 050/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/08/2016	183 600	36 720	27 124	20%	FEF	AOI	à priori	04/08/2016	45%
6	Fourniture de 2100 tables bancs pour élèves, 84 tables pour maîtres, 84 chaises pour maîtres et 84 armoires pour 14 écoles de l'arrière-pays de Kananga ; des Territoires de Demba, de Dibaya et de Kazumba lot 1	308 973	No 057/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/08/2016	220 500	0	0	0%	FEF	AOI	à priori	19/08/2016	40%
7	Fourniture de 1200 tables bancs pour élèves, 48 tables pour maîtres, 48 chaises pour maîtres et 48 armoires pour 8 Ecoles des Territoires de Dimbelenge, Mweka, Ilebo et de Dekese	176 640	No 068/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016	192 720	38 544	28 472	20%	FEF	AOI	à priori	11/10/2016	40%
8	Fourniture de 1200 tables bancs pour élèves, 48 tables pour maîtres, 48 chaises pour maîtres et 48 armoires pour 8 Ecoles des Territoires de Luiza, Luebo et de Tshikapa, Provinces du Kasai et du Kasai Central-RDC	176 640	No 069/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016	192 720	38 544	28 472	20%	FEF	AOI	à priori	11/10/2016	40%
9	Fourniture 1800 bancs, 72 tables pour maîtres, 72 chaises pour maîtres et 72 armoires des Territoires pour 12 écoles de l'arrière-pays de Mbuji-Mayi ; des Territoires de Kabeya-Kamwanga, de Miabi, de Katanda, de Lupatapata et de Tshilenge, Province du Kasai-Oriental	264 834	No 070/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016	244 800	48 960	36 166	20%	FEF	AOI	à priori	11/10/2016	100%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
10	Fourniture de 1350 bancs, 54 tables pour maîtres, 54 chaises pour maîtres et 54 armoires pour 9 Ecoles des Territoire de Katakokombe, de Kole, de Lodja, de Lomela, de Lusambo et de Lubefu, Province du Sankuru	194 694	No 071/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016	206 280	41 256	30 475	20%	FEF	AOI	à priori	11/10/2016	60%
11	Acquisition des équipements médicaux en faveur de 30 Centres de Santé de l'ex-province du Kasai Occidental	1 639 316	No 078/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016	1 405 170	754 233	533 766	54%	FEF	AOI	à priori	31/10/2016	85%
12	Acquisition des équipements médicaux en faveur de 30 Centres de santé de l'ex-province du Kasai Oriental	1 639 316	No 079/PRISE-BAD /UEP/CN/CA/CB/AOI/PM/010/2016	1 417 578	497 090	351 787	35%	FAD	AOI	à priori	31/10/2016	30%
13	Fourniture des équipements AGR pour trois sites de pêche	10 528	No 116/PRISE-BAD/UEP/CN /CA/CB/CF/PM/06/2017	10 390			0%	FAD	ACF	à priori	26/06/2017	100%
	Sous Total catégories Biens	6 230 835	0	5 331 778	2 713 367	1 937 819	51%					67%
CATEGORIE SERVICES												
1	Etude et contrôle des travaux du bâtiment hygiène	15 040	13/PRISE-BAD/UEP/CN/SCI/PM/05/2015	11 200	11 200	7 871	100%	FEF	CI	à priori	25/05/2015	100%
2	Etude des bâtiments scolaires, sanitaires et assainissement réalisées dans l'ex-Province de Kasai Occidental	46 623	14/PRISE-BAD/UEP/CN/SCI/PM/05/2015	18 450	18 450	12 644	100%	FEF	CI	à priori	25/05/2015	100%
3	Etude des bâtiments scolaires, sanitaires et assainissement réalisées dans l'ex-Province de Kasai Oriental,	30 079	15/PRISE-BAD/UEP/CN/SCI/PM/05/2015	15 000	15 000	10 616	100%	FEF	CI	à priori	25/05/2015	100%
4	Assurer la Mission de contrôle des travaux de protection des conduites AEP Tshikapa + caniveau de drainage	253 362	033/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CC/PM/11/2015	228 345	223 490	178 508	98%	RWSSI	SBQC	à priori	19/11/2015	100%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
	Sous Total catégories Services	345103		272995	268140	209639	98%					100%
	Total Composante A.	45 625 982	0	40 498 161	20 066 339	14 430 060	50%					59%
COMPOSANTE ETUDES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES												
CATEGORIE BIENS												
1	Equipements et matériels informatiques	57 487	002/PRISE-BAD/UEP/CN/ERC/CB/CF/PM/01/2015	45 540	45 540	35 547	100%	RWSSI	ACF	à priori	14/01/2015	100%
2	Fourniture des matériels roulants Lot 2	197 019	005/PRISE-BAD/UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03/2015	169 132	169 132	119 213	100%	FAD	AOI	à priori	07/04/2015	100%
3	Equipements des bureaux	72 241	06/PRISE-BAD/UEP/CN/GP/CB/AON/PM/07/2015	54 975	54 975	133 159	100%	FAD/RWSSI	ACF	à priori	08/04/2015	100%
4	Fourniture des matériels roulants Lot 3	76 702	007/PRISE-BAD/UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03/2015	68 860	68 860	49 074	100%	FAD	AOI	à priori	07/04/2015	100%
5	Fourniture des matériels roulants Lot 1	197 019	008/PRISE-BAD/UEP/CN/ERC/CB/AOI/PM/03/2015	131 439	131 439	94 404	100%	FAD	AOI	à priori	23/04/2015	100%
	Sous Total catégories Biens	600 468		469 946	469 946	431 397	100%					100%
CATEGORIE SERVICES												
1	Etude microcentrale de Tshikapa	1 016 677	035/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CC/PM/01/2016	625 817	616 876	447 405	98,57 %	FAD	SBQC	à priori	08/01/2016	100%
2	Etudes (géophysiques et des mini réseaux)	4 003 542	036/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CC/PM/01/2016	655 400	622 628	455 949	95,00 %	FAD	SBQC	à priori	08/01/2016	100%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
3	Prestations de Services de l'Hôtel relatif à la tenue du Forum International sur l'Eau à Kinshasa « FIEK 2016 »	70 686	040/PRIS-BAD/UEP/CN/PM/2015	63 200	57 200	40 340	90,51 %	FAD		à priori	28/01/2016	100%
4	Expert environnementaux et GS	60 158	N°122/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CI/PM/07/2017	41 350	0	0	0%	FAD	CI	à priori	18/08/2017	20%
5	Expert PNAEPA	97 757	N°124/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CI/PM/07/2017	78 000	0	0	0%	FAD	CI	à priori	08/09/2017	30%
Sous Total catégories Services		5 248 820		1 463 767	1 296 704	943 694	89%					93%
CATEGORIE DIVERS												
2	Fourniture de 45m3 gasoil et 1 m3 de lubrifiant pour l'AEP de Tshikapa	148 892	031/PRIS-BAD/UEP/CN/CA/CB/CF/PM/11/2015	88 815	88 815	63 591	100%	FAD	ACF	à priori	06/11/2015	100%
3	Fourniture de 750 tonnes d'intrants de traitement d'eaux au bénéfice de l'AEP de Tshikapa.	983 616	037/PRISE-BAD/UEP/CN/RF/CB/AOI/PM/01/2016			712 600	100%	FAD	AOI	à priori	18/01/2016	100%
1	Fourniture de 245 m3 carburants et 14,75 m3 lubrifiants pour les générateurs de la station de traitement d'eau de Tshikapa	1 424 224	965 760	965 760		416 272	100%	FAD	ACF	à priori	06/11/2015	100%
Sous Total catégories Divers		2 556 732	589 405	589 405	1 643 980		100%					100%
Total Composante B		8 406 020		3 577 693	3 410 630	2 567 554	95%					98%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
COMPOSANTE GESTION DE PROJET												
CATEGORIE BIENS												
1	Acquérir les matériels roulants II pour l'Assistance Technique et les Antennes du PRISE.	195 515	020/PRISE-BAD /UEP/CN /GP/CB/AON/PM/07/2015	132 600	131 213	94 115	98,95 %	FAD	AON	à priori	28/07/2015	100%
	Sous Total catégories Biens	195 515		132 600	131 213	94 115	98,95 %					100%
CATEGORIE SERVICES												
1	Elaboration de manuel des procédures administratives	10 528	001 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/C.I/P M/11/2014	11 760	11 760	21 492	100,00 %	FAD	SED	à priori	22/12/2014	100%
2	Mobilisation Expert en passation des marchés	299 855	004 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/ATI/PM/03/2015	282 582	217 205	159 416	76,86 %	FAD	CI	à priori	27/03/2015	100%
3	Mobilisation Expert cadre financier et comptable	445 120	011 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/ATI/PM/05/2015	268 900	122 854	89 779	45,69 %	FAD	CI	à priori	25/05/2015	100%
4	Honoraire comptable/Expert	314 328	012 /PRISE-BAD/UEP/CN/SC/ATI/PM/05/2015	297 000	221 510	161 779	74,58 %	FAD	CI	à priori	22/05/2015	100%
5	Paramétrage TOMPRO	39 103	023/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CC/PM/07/2015	29 958	29 620	21 492	98,87 %	FAD	SED	à priori	31/07/2015	100%
6	Audit des comptes exercices des comptes 2014/2015 et 2016	120 317	N°042/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/CC/PM/05/2016	59 940	32 190	23 881	53,70 %	FAD	SMC	à priori	16/05/2016	100%
7	Mobilisation Expert Genre	156 412	N°048/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/ATI/PM/07/2016	65 200	41 982	30 578	64,39 %	FAD	CI	à priori	29/07/2016	100%
8	Mobilisation Ingénieur/Expert Eau et Assainissement	705 640	N°049/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/ATI/PM/07/2016	339 000	133 003	96 412	39,23 %	FAD	CI	à priori	02/08/2016	51%

N°	Désignation	Budget. En USD	N° de contrat	Montant du marché en USD	Montant décaissé en USD	Montant Décaissé en UC	Taux de paiement en USD	Financement	Mode d'acquisition	Type de revue	Date de signature	Taux d'exécution Physique
9	Mobilisation Expert suivi évaluation de projet	627 151	N°083/PRISE-BAD/UEP/CN/SC/ATI/PM/07/2016	108 000	14 100	10 187	13,06 %	FAD	CI	à priori	14/02/2017	35%
	Sous Total catégories Services	2 718 453	0	1 462 340	824 224	615 016	56,7%					
	Total Composante C	2 913 968	0	1 594 940	955 437	709 131	59,9%					
	TOTAL GENERAL	56 945 970	0	45 670 794	24 432 407	17 706 745	53,5%					

E. Activités sans engagements au 31 décembre 2017

Désignation	Budget. En USD (1)	Budget en UC (2)	Observations
COMPOSANTE A. DEVELOPPEMENT DES INFRAQTRUCTURES			
Contrôle & Surveillance des travaux AEP en milieu rural dans l'Ex-Province de Kasai Occidental	639 579	425 263	
Contrôle & Surveillance des travaux AEP en milieu rural dans l'Ex-Province de Kasai Oriental	639 579	425 263	
Surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de l'AEP de Mbuji-Mayi (KOR)	397 853	264 537	
Campagne IEC pour ouvrage d'AEP et Ouvrages d'assainissement dans l'ex-Province de Kasai Occidental et Oriental	1 944 620	1 293 000	
Surveillance/Contrôle travaux des Infrastructures scolaires, sanitaires et Assainissement au Kasai Occidental	601 940	400 237	
Surveillance/Contrôle travaux des Infrastructure scolaire, sanitaire et Assainissement au Kasai Oriental	601 940	400 237	
Réalisations des Travaux de 60 forages et mini-réseaux + château d'eau + branchement écoles centres de santé & fourniture et installation des équipements d'exhaure	41 564 943	27 637 000	
Réalisations des travaux de Réhabilitation. réseau AEP de Mbuji-Mayi + château d'eau +bornes fontaines	31 378 621	20 864 000	
Total Composante A.	77 769 075	51 709 536,98	
COMPOSANTE B. ETUDES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES			
PGES			
Programme additionnel de renforcement des capacités en suivi environnemental et social; en leadership, en organisation et en plaidoyer	50 000	33 246	
Réalisation d'éventuelles études d'impacts environnementaux.	60 000	39 895	

Mesure spécifiques sur la santé	200 000	132 982	
Suivi environnemental et surveillance environnementale du PGES	200 000	132 982	
Evaluation (PGES)	50 000	33 246	
Etude et mise en place d'un réseau pilote de suivi de ressources en eau du sous bassin de la rivière Kasai	109 789	73 000	
Etude de définition des indicateurs, études socio-économiques et élaboration du répertoire de la société civile	153 404	102 000	
Appui à la réforme sectoriel de l'AEP	751 980	500 000	
Fond de roulement des activités genre	114 301	76 000	
Total Composante B.	1 689 473,96	1 123 350,33	
COMPOSANTE C. GESTION DE PROJET			
Mobilisation de l'expert gestionnaire de projet	1 176 404,90	782 205	
Total Composante B.	1 176 404,90	782 205	
Total Général	80 634 954,10	53 615 092,22	

F. QUELQUES PHOTOS RECENTES DES REALISATIONS DU PROJET

Voirie de la ville de Tshikapa dans le cadre de protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la Regideso.

Situation avant



Situation actuelle



Huit électrogènes de 1,628MWT AEP REGIDESO



Bâtiment de la direction nationale de l'hygiène à Kinshasa
Situation au démarrage des travaux



Situation actuelle



**Le Centre de santé Domiongo construits à Domiongo dans le territoire de Mweka, province de Kasai.
Situation avant**



Situation actuelle



E.P. Domiongo construit dans le territoire de Mweka, province de Kasai
Situation avant



Situation actuelle



E.P. Mpashi construit dans l'hinterland de la ville de Kananga, province de Kasai central

Situation avant



Situation actuelle



Le centre de santé de Kamayi à Lwiza cité dans le territoire de Lwiza, province de Kasai central.

Situation avant



Situation actuelle



L'EP Wabalesa à Lwiza cité dans le territoire de Lwiza, province de Kasai central.

Situation avant



Situation actuelle



Centre Multifonctionnelle genre Construits à Mbuji Mayi, province de kasaï oriental

La situation avant

la situation pendant les travaux



Situation actuelle



Construction du centre de santé d' OMEKA II à la cité de Katako kombe dans le territoire de Katako kombe, province de Sankuru
Situation avant



Situation encours



Construction de l'E.P. Tshilunde dans le territoire de Tshilunde, Province de Kasai oriental

Situation avant



Situation encours



Les latrines sont construites dans les écoles, les centres de santé, bureaux administratifs et les marchés



Déploiement des mobiliers scolaires dans les écoles construites.



Équipements médicaux entreposés à Mbuji Mayi en attente de livraison dans les centres de Santé

