

**PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES
DANS LA REGION DU CENTRE DE LA RD CONGO**

« PRISE »

Rapport annuel d'avancement d'activités N° 007

Carte représentant la zone du Projet



Base vie pour les travaux d'AEP en milieu Rural

Travaux des espaces à vivre et Forage

Travaux de construction des écoles, centres de santé et latrines en cours

Période du rapport : Du 01^e janvier au 31 decembre 2021

Un projet du :

Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC)



Financé par :

La Banque Africaine de



Développement (BAD)

Fevrier 2021

Contenu

TABLE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES.....	2
I. INTRODUCTION	3
I. 1. DONNÉES DU RAPPORT	3
I. 2. PREAMBULE	4
II. PRESENTATION DU PROJET	6
II. 1. Aperçu général.....	6
II.1.1. Données synthèse du projet	6
II.1.2. La Zone d'intervention du projet	7
II.1.3. Organigramme du PRISE	7
II. 2. Description du projet.....	8
II.2.1. But et Objectif du Pprojet	8
II.2.2. Composantes et objectifs spécifiques.....	8
II. 3. Groupes Cibles.....	9
II. 4. CHAINE DES RESULTATS	10
III. EXECUTION DU PRISE EN 2021	11
III. 1. PREVISIONS DES DEPENSES POUR L'ANNEE 2021	11
III. 2. EXECUTION FINANCIERE DU PTBA 2021.....	14
III. 3. EXECUTION PHYSIQUE DU PTBA 2021.....	15
IV. SITUATION DES ACTIVITES DU PROJET AU 31DECEMBRE 2021 (suivi des marchés, exécution financière et exécutions physiques)	17
IV. 1. Situation des marchés au 31 decembre 2021 :	17
IV. 2. Exécution physique du PRISE au 31 decembre 2021.....	18
IV. 3. Exécutions financières du PRISE au 31 decembre 2021.....	20
IV. 4. La prise en compte des aspects genre dans PRISE	23
IV. 5. Prise en comptes des aspects environnementaux	25
V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.....	27
VI. CONCLUSION.....	28
VII. ANNEXE.....	30
QUELQUES PHOTOS DES REALISATIONS AU 31 DECEMBRE 2021	30

TABLE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES

Sigle	Signification
ACE	Agence Congolaise de l'Environnement
AEP	Alimentation en eau potable
AEPA	Alimentation en eau potable et assainissement
AMI	Avis à manifestation d'intérêt
ANO	Avis de non objection
AO	Appel d'offres
AOI	Appel d'offres international
AON	Appel d'offres national
APD	Avant-Projet Détaillé
APS	Avant-Projet Succinct
AT	Assistance technique
BAD	Banque africaine de développement
CDFO	Congo Democratic Field Office
CEP –O	Cellule d'Exécution des Projets de la REGIDESO
CFEN	Consultation de fournisseurs à l'échelon national
CN	Coordination Nationale
DAO	Dossier d'appel d'offres
DAOI	Dossier d'appel d'offres international
DAON	Dossier d'appel d'offres national
DNO	demande de l'avis de non objection
DP	Demande de Proposition
DPD	Demande de Paiement Direct
DSCR	Document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté
EIES	Etude d'impact environnemental et social
FAD	Fonds africain de développement
FEF	Facilité en Faveur des Etats Fragiles
GEFAE	Genre Famille et Enfant
HIMO	Haut intensité de main-d'œuvre
IEC	Information Education Communication
KFW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Coopération Financière Allemande)
KOC /KOCC	Kasaï Occidental
KOR	Kasaï Oriental
LBS	Liste des biens et services
LR	Liste Restreinte
MECNT	Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
MIN-ENER	Ministère de l'Energie
MI	Manifestation d'Intérêt
ODD	Objectifs de Développement Durable
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
OVD	Office de Voirie et Drainage
PM	Passation des Marchés
PNA/DAS	Programme National d'Assainissement/Direction d'Assainissement du MECNT
PNSD	Plan National Stratégique de Développement
REGIDESO	Régie de Distribution d'Eau de la RD Congo
RWSSI	Rural Water Supply and Sanitation Initiative
ST	Spécifications Techniques
TDR	Termes de référence
UC	Unité de compte (du Groupe de la Banque africaine de développement)
UEP	Unité d'Exécution du Projet
USD	United States Dollar (Dollar American)

I. INTRODUCTION

I. 1. DONNÉES DU RAPPORT

RAPPORT D'AVANCEMENT D'ACTIVITES			
Titre, sigle et code du projet : Projet de Renforcement des Infrastructures Socio- Economiques, « PRISE ». RDC-BAD : P-CD-E00-002		Agence d'Exécution : Unité d'Exécution du Projet/ Ministère du Développement Rural - Secrétariat Général du Développement Rural	
Secteur : AEPA; Education et Santé		Date du dernier rapport : 23 novembre 2021.	
Type de rapport : Trimestriel d'avancement d'activités		Date du présent rapport : 17 février 2021	
Période : 01 ^{er} Janvier au 31 décembre 2021		Année : 2021	
Niveau : National			
Date de démarrage des activités du projet :		Date d'achèvement des activités du projet :	
Prévue : Janvier 2014	Effective : 15 juillet 2014	Estimation initiale : 30 novembre 2018	Estimation actuelle : 30 juin 2023.
		Dernier décaissement :	
		Estimation initial : 30 juin 2019	Estimation actuelle : 31 décembre 2021

I. 2. PREAMBULE

Conformément aux dispositions des Accords qui régissent le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans la région Centre de la RDC (PRISE), ce dernier a l'obligation de présenter un rapport annuel d'avancement d'activités suivant les **prévisions initiales du Projet** mentionnées dans le rapport d'évaluation du Projet et le **Plan de Travail et Budget Annuel 2021** adopté par le Comité de Pilotage le 16 mars 2021 et envoyé à la BAD pour l'ANO. Le document PTBA 2021 a été revu suivant les observations de la BAD puis retransmis à la BAD en date du 12 Août 2021.

Le présent document est le rapport annuel d'avancement d'activités du Projet au 31 décembre 2021. Le projet a démarré effectivement en juillet 2014 pour une durée initialement prévue de cinq (5) ans avec à la signature de l'accord un budget global de 105, 178 millions d'UC équivalent à 158,184 millions USD.

Bien que les accords aient été signés le 07 janvier 2014, la mobilisation effective de l'équipe du Projet n'a eu lieu que le 15 juillet 2014 et le premier décaissement est intervenu le 07 octobre 2014. Ainsi, il convient de souligner qu'au 31/12/2021, le Projet a totalisé sept ans et demi d'opérationnalité, soit 84% de la durée du Projet initialement estimée 60 mois, prorogée de 24 mois et une dixième prorogation de 30 mois soit la clôture du projet projetée au 31 décembre 2023.

Le projet initialement prévu pour cinq ans a été prorogé progressivement à neuf ans suite au retard observé dans la mise en place de l'équipe du projet soit 7 mois après la signature des accords, l'actualisation des études de l'AEP Mbuji-mayi par la Regideso soit deux ans après la mise en vigueur du projet, un long processus de passation des marchés des travaux de l'AEP Mbuji-mayi d'abord lancé en lot unique de deux financements BAD et KFW, puis séparé en deux lots suivant les financements et enfin suspendus à cause d'une lettre anonyme avant que le processus reprenne pour signer le contrat en date du 13 septembre 2019, soit trois ans et huit mois après le lancement du premier DAO en lot unique. La durée du projet PRISE étant liée aux travaux de l'AEP Mbuji Mayi, le cinq ans prévus pour l'exécution du projet étaient dépassés de huit mois lors de la signature du contrat des travaux de l'AEP Mbuji-mayi.

Pour ce qui concerne l'avancement physique, au 31 décembre 2021, les travaux de réhabilitation de 60 écoles, 60 centres de santé, 505 latrines publiques sont achevés et remis aux bénéficiaires; les travaux d'AEP en milieu rural accusent une évolution lente dont le taux moyen d'exécutions physiques est de 41,5%. Une amélioration dans l'avancement des travaux de l'AEP Mbuji-Mayi a été observée dont le taux des exécutions physiques au 31 décembre 2021 est de 41 % .

D'une manière globale, le taux des exécutions physiques des activités du projet au 31 décembre 2021 était de 60 %, dont les activités de la Composante de développement des infrastructures scolaires, sanitaires, d'assainissement et d'AEP représentent un taux des exécutions physiques de 58%, les activités de la Composante des études et renforcement des capacités représentent un taux des exécutions physiques est de 60% et la composante gestion de projet présente un taux d'exécution physique de 83 % .

Une somme de 15 458 803 USD composée des activités qui n'ont pas été exécutées avait été réallouée pour financer les avenants probables, des Etudes géophysiques complémentaires et impacts environnementaux dans les 25 Provinces, Equipements complémentaires CMG et Energie solaire, travaux dalots Centre Multifonctionnel Genre et le fonctionnement du projet.

Concernant les aspects financiers, Les prévisions budgétaires annuelles 2021 de 25 602 838USD, et 15 911 059 USD ont été décaissés au 31 décembre 2021 soit un taux de décaissement du PTBA de 62,15% et un taux d'exécution physique du PTBA 2021 de 67%. Ce qui implique un cumul des décaissements d'une somme de 87 008 261,3 d'USD soit un taux de décaissement de 55 % par rapport aux 158 183 505USD présentant le budget global du Projet au taux initial de conversion dollars-unités de compte. En ce moment, le cumul de décaissement au 31 décembre 2021 en Unité de compte équivaut à 62 418 624,22 UC soit un taux de décaissement de 59 % par rapport au 105 178 000 UC le budget global du PRISE en unité de compte, laissant une somme disponible de 42 759 375,78 UC à décaisser à la BAD pour la durée restante du projet..

Il faudrait aussi relever que le Projet PRISE a reçu, pendant l'année 2021, la mission d'Audit externe pour l'exercice 2020, une mission de supervision de la BAD du 15 au 18 décembre 2021, une mission de revue de la performance dans la mise en œuvre du projet.

Concernant la deuxième phase du PRISE, les sites ont été identifiés dans dix provinces de Kasai, de Kasai centrale, Kasai oriental, de Lomami, de Sankuru, de Kwilu, de Maindombe, de Kwango, de Haut Lomami et de Maniema. 40 sites ont été sélectionnés pour la réalisation du PRISE II, le Rapport d'évaluation élaboré est approuvé au conseil d'administration de la BAD.

II. PRESENTATION DU PROJET

II.1. Aperçu général

Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques dans la région centre de la RDC (PRISE) fait partie des projets qui ont été conçus pour la mise en œuvre du Plan de développement de la RDC de 2011 à 2015 appelé DSCR II (Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté de deuxième génération). Le PRISE contribue à la réalisation du troisième pilier du DSCR II qui visait « l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain » en se concentrant sur l'Alimentation en Eau Potable (AEP), la construction des écoles, des Centres de Santé et des latrines publiques. Il faut signaler que le Projet s'est aussi occupé de la voirie urbaine de Tshikapa en vue de protéger contre les érosions, les conduites du système de l'AEP de cette ville.

II.1.1. Données synthèse du projet

Les données de base du Projet au 31 décembre 2021 sont reprises dans le tableau suivant :

Tableau 2.1 Données synthèses du PRISE au 31 décembre 2021

Libellé	Descriptif sommaire				
Pays	République Démocratique du Congo				
Titre du Projet :					
Numéro du Projet :	P-CD- E00-002				
Sources de financement	Prêt FAD :	Don FAD :	RWSSI	FEF	
Numéro des Dons et Prêt :	2 100 150 030 344,00	2 100 155 026 317,00	800 155 001 251,00 ⁵	5900155005901	
Date d'approbation du Don/Prêt :	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	
Date de signature d'accord :	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	
Date d'entrée en vigueur :	13/07/2016	07/01/2014	07/01/2014	07/01/2014	
Date d'entrée en vigueur du 1 ^{er} décaissement :		07/10/2014	07/10/2014	07.07.2015	
Source/Coût total du projet :	(en USD)	(en UC)	Montant (en %)		
Prêt FAD :	2 218 341,00	1 475 000,00	1,40%		
Don FAD :	65 459 859,00	43 525 000,00	41,38%		
RWSSI (soit 5,9537 millions d'euros au taux de juillet 2013 de 1UC = 1,14982 €)	7 787 504,88	5 178 000,00	4,92%		
FEF	82 717 800,00	55 000 000,00	52,29%		
TOTAL	158 183 504,88	105 178 000,00	100%		
Sources de financement/Décaissements effectués par le projet au 31 décembre 2021	Prévu/Affecté	Décaissé	Décaissé	Engagement	%/Prévu
	en USD	en USD	en %	en USD	
Prêt FAD :	2 218 341	1 949 515	87,9%	1 949 515	87,9%
Don FAD :	65 459 859	30 577 694	46,7%	51 754 684	79,1%
RWSSI	7 787 505	3 600 186	46,2%	4 667 355	59,9%
FEF	82 717 800	50 880 866	61,5%	74 309 491	89,8%
TOTAL	158 183 505	87 008 261	55,0%	132 681 045	83,9%
Composante/Décaissements effectués par le projet au 31 décembre 2021	Montant Total (en USD)		Décaissé et engagé par composante au 31 décembre 2021 (%)		
	Prévu/Affecté	Décaissé	Décaissé	Engagement	%/Prévu
Infrastructures d'AEPA, Sanitaire et Scolaire:	138 202 808	74 824 568	54,1%	119 953 954	86,8%
Etudes et Renforcement des Capacités :	7 707 019	3 797 941	49,3%	4 088 810	53,1%
Gestion et Coordination du projet :	12 273 678	8 385 752	68,3%	8 638 280	70,4%
TOTAL	158 183 505	87 008 261	55,0%	132 681 045	83,9%
Catégorie des dépenses/Décaissements effectués par le projet au 31 décembre 2021	Montant Total (en USD)		Décaissé et engagé par catégorie au 31 décembre 2021 (%)		
	Prévu/Affecté	Décaissé	Décaissé	Engagement	%/Prévu
Biens	6 644 419	5 613 445,810	84,5%	5 934 324	89,3%
Travaux	125 225 803	65 734 667,8	52,5%	109 324 003	87,3%
Services	14 421 783	7 455 060	51,7%	9 217 629	63,9%
Fonctionnement	9 966 435	6 561 108	65,8%	6 561 108	65,8%
Divers	1 925 065	1 643 980	85,4%	1 643 980	85,4%
TOTAL	158 183 505	87 008 261	55,0%	132 681 044	83,9%
Date limite estimée du dernier décaissement :	31-déc.-2023				
Durée du Projet :	9 ans (Janvier 2014 - 30 juin 2023)				
Coordonnateur National :	Deo NSUNZU (Mr)				
Responsable du projet/BAD	Bruno ZALI ZALI (Mr)				

II. 2. Description du projet

II.2.1. But et Objectif du Pprojet

L'objectif global du Projet est de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires des populations de 5 Provinces de l'ex Kasai. De façon spécifique, le Projet devra assurer durablement l'accès de la population à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation de base et aux soins de santé primaires et contribuer à créer des conditions favorables à la promotion de l'investissement privé dans la zone d'intervention du PRISE.

II.2.2. Composantes et objectifs spécifiques

Pour atteindre les objectifs du projet, les principales actions retenues sont regroupées dans les trois composantes ci-après :

Composante A : Développement des infrastructures (AEPA, écoles, Centres de Santé, Toilettes publiques et Centre Genre)

Composante B : Etudes et Renforcement des capacités

Composante C : Coordination et Gestion du Projet

Le tableau suivant donne les activités détaillées du projet et leur coût par composante :

Tableau 1.1 : Coût, sous composantes et activités par composante du PRISE

Composante	Coût (millions d'UC)	Sous-composantes	Activités
A) Développement des infrastructures (AEPA, écoles, centres de santé, toilettes publiques, Centre Genre)	89,95 (85,53%)	Milieu rural	1. Réalisation de 60 systèmes d'AEP ; 2. Construction de 494 latrines publiques ; 3. Construction et équipement de 60 écoles, 4. Construction et équipement de 60 Centres de Santé, 5. Construction et équipement d'un Centre Multifonctionnel Genre ; 6. Suivi et contrôle des travaux ; 7. Campagne d'IEC pour l'AEPA.
		Milieu urbain	1. Construction de 3 châteaux d'eau 2 Réhabilitation de 272.100 ml du réseau d'AEP de Mbuji-Mayi ; 3. Acquisition de 6 groupes électrogènes pour le système d'AEP de Tshikapa ; 4. Travaux de lutte antiérosive pour la protection des conduites du système d'AEP de Tshikapa ; 5. Suivi et contrôle des travaux ; 6. Campagne d'IEC pour AEP ;
B) Etudes et Renforcement des capacités	7,52 (7,14%)	Milieu rural	1. Elaboration de la stratégie de mise en œuvre du sous-secteur de l'AEP en milieu rural ; 2. Réalisation d'une étude de mise en place d'un réseau pilote de suivi des ressources en eau du fleuve Kasai ; 3. Réalisation des études socio-économiques ; 4. Elaboration d'un répertoire société civile et PTF du Genre ; 5. Renforcement des capacités des homologues du projet du SGDR (formations aux procédures d'acquisition, décaissement et gestion financière) ; 6. Renforcement des capacités des acteurs locaux (formations en maintenance et gestion des ouvrages) ; 7. Formation de 1000 femmes pour le développement des Activités Génératrices de Revenus ; 8. Le renforcement des capacités des membres des 60 unités de gestion des systèmes d'AEP.
		Milieu urbain	1. Réalisation de l'étude de la centrale hydroélectrique de Tshikapa ; 2. Renforcement des capacités des Ministères bénéficiaires du projet.
C) Coordination et Gestion du projet	7,71 (7,33%)	Milieux urbain et rural	1. Fonctionnement (salaires ; indemnités ; frais de missions ; consommables ; carburant...) 2. Elaboration du manuel de procédures ; 3. Audits des comptes.

II. 3. Groupes Cibles

Les groupes cibles du Projet sont les **populations du milieu rural** de la région du centre de la RDC (Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru), particulièrement les enfants et les femmes vivant dans le milieu rural de cette région. Le Projet contribue à l'autonomisation économique des **femmes et des jeunes**.

En **milieu urbain**, le choix de **la ville de Mbuji-Mayi**, le centre urbain le plus peuplé de cette région, se justifie par le fait qu'elle comptait en 2014 selon l'INS près de trois (3) millions de personnes, soit environ la moitié de la population de la Province du Kasaï Oriental, mais ne disposait que d'un embryon de système d'AEP très vétuste qui ne couvrait qu'une très faible partie des besoins de sa population. La BADEA avait déjà financé à hauteur de 8,3 millions d'UC, les ouvrages de production d'eau potable (captage et conduite de transfert jusqu'au réservoir de Bakwa Kapanga). L'intervention du Projet porte sur la réalisation des ouvrages de stockage et d'une partie du réseau de distribution. Elle sera complétée par un financement de la KFW pour un montant de 17,4 millions d'UC, qui sera utilisé pour la production de l'énergie électrique et participera également à la réhabilitation et l'extension du réseau.

A **Tshikapa**, le Projet a déjà permis de garantir le fonctionnement du système d'AEP de cette ville qui a été financé par la BAD dans le cadre du PEASU.

En effet la fourniture de l'énergie électrique pour le fonctionnement des installations de la REGIDESO, construites par PEASU, n'était pas assurée ainsi dans le cadre du PRISE :

- (i) des groupes électrogènes d'une somme des puissances 1,628 MW (avec une provision de carburant et des lubrifiants) avaient été fournis et installés ;
- (ii) une étude de faisabilité pour la construction d'une micro- centrale hydro-électrique dans la rivière Lovua avait été réalisée en prévision d'une solution pérenne pour la fourniture de l'énergie électrique dans les installations d'AEP de la Régideso à TSHIKAPA ;
- (iii) les travaux de lutte antiérosive pour la protection des ouvrages AEPA ont été réalisés à Tshikapa.

II. 4. CHAINE DES RESULTATS

Impacts

- (1.1) Taux de prévalence des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans réduit à 15% en 2020. ;
- (1.2) Taux de mortalité infanto juvénile réduit à 60 pour mille en 2020 ;
- (1.3) Taux Brut de fréquentation dans le primaire augmenté à 93,2 % en 2018
- (1.4) Pourcentage enfants (-5 ans) avec insuffisance pondérale réduit à 14% en 2020.

Effets

- (2.1) Taux d'accès à l'eau potable amélioré à 40% en 2018 ; (2.2) Taux d'accès à l'assainissement amélioré à 23 % en 2018
- (2.3) Populations bénéficiant des soins de santé augmentée à 1 000 000 en 2018 ; (2.4) Population additionnelle bénéficiant d'un enseignement primaire de qualité est de 36 000 enfants en 2018 ; (2.5) Nombre de femmes gérantes des AGR est de 1 000 en 2018.

Produits

- (3.1.) Système d'AEP pour la ville de Mbuji-Mayi réalisé et 60 systèmes AEP dont 23 solaires réalisés en milieu rural;
- (3.2) 272 100 ml de réseau réhabilité et/ou réalisés à Mbuji-Mayi; (3.3) 6 groupes électrogènes d'une puissance totale de 1350Kva installés à Tshikapa ; (3.4) 494 latrines publiques construites ;
- (3.5) 60 écoles construits ou réhabilités et équipés ; (3.6) 01 CMG construit et équipé ;
- (3.7) 60 centres de santé construits ou réhabilités et équipés ;
- (3.8.) 2 260 emplois permanents créés dont 15 00 (66 %) pour les femmes

- (4.1) 26 matériels roulants ; 61 équipements de bureaux ; 20 équipements techniques ;
- (4.2) 1000 femmes formées et appuyées ;
- (4.3) 62 Comités mixtes mis en place ;
- (4.4) 310 membres formés dont 40 % de femmes ;
- (4.5) 7 Etudes réalisées

- (5.1) 20 rapports d'avancement ;
- (5.2) 5 rapports d'audit ;
- (5.3) 20 rapports .

Activités

Composante A : Développement des infrastructures

- (A1) Travaux d'AEP ;
- (A2) Travaux d'assainissement ;
- (A3) Construction d'écoles, de centres de santé et d'un centre Genre ;
- (A4) Actions d'IEC pour AEP et Assainissement ;
- (A5) Surveillance et contrôle des travaux.

Composante B : Etudes et Renforcement des capacités

- (B1) Appui en équipements de bureau et équipements techniques de terrain ;
- (B2) Formation des membres de la coordination du projet et des acteurs locaux de terrain ;
- (B3) Etudes.

Composante C : Gestion du projet :

Activités de gestion du projet

III. EXECUTION DU PRISE EN 2021

III. 1. PREVISIONS DES DEPENSES POUR L'ANNEE 2021


Les prévisions de dépenses pour l'année 2021 se chiffrent à 25 602 838,02 USD, soit 16,2% du budget global du projet et réparties par composante et source de financement selon le tableau suivant :

Tableau 3.1.1. : Répartition des nouveaux engagements et des dépenses prévisionnelles de PRISE en 2021 par composante.

Composante	Nouveau Engagement 2021 en USD	Prévisions des décaissements en 2021 en USD	Prévisions des décaissements en 2021 en UC	Proportion prévisions des décaissements en 2021
Composante A	12 662 928,57	21 875 998,13	14 545 598,38	85,44%
Composante B	2 956 848,67	2 676 047,89	1 779 334,48	10,45%
Composante C	1 663 968,93	1 050 792,00	698 683,48	4,10%
Total	17 283 746,17	25 602 838,02	17 023 616,34	100,00%

Le graphique suivant illustre cette répartition :

Graphique 3.1.1. : Répartition des dépenses prévisionnelles du PRISE en 2021 par composante

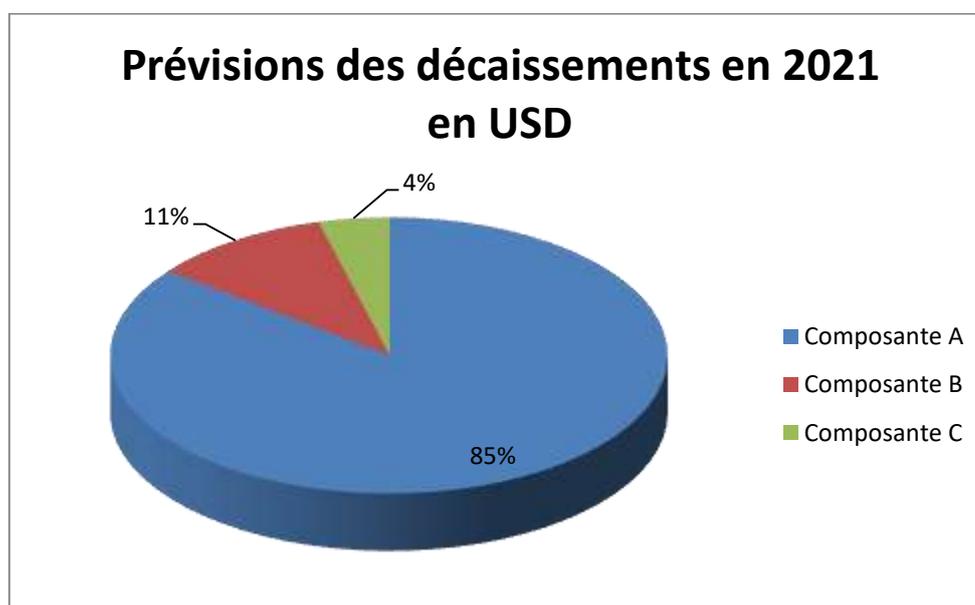

On observe dans ce graphique que les dépenses prévisionnelles du projet en 2021 sont concentrées sur la composante A qui concerne les travaux d'infrastructures (85%). Les composantes B concernant les études et le renforcement de capacités et C pour la Coordination Nationale avec respectivement 11% et 4% n'intervient que très faiblement dans les dépenses du PRISE avec seulement 6% des dépenses prévisionnelles du PRISE en 2020.


En ce qui concerne les sources de financement pour 2021, le tableau suivant nous renseigne :

Tableau 3.1.2 : Répartition des dépenses prévisionnelles du PRISE en 2021 par source de financement

Composante	Nouveau Engagement 2021 en USD	Prévisions des décaissements en 2021 en USD	Prévisions des décaissements en 2021 en UC	Proportion prévisions des décaissements en 2021
FEF		17 195 388,99	11 433 408,46	67,2%
FAD		7 442 416,89	4 948 547,10	29,1%
RWSSI		912 823,57	606 946,71	3,6%
Prêt FAD		52 208,56	34 714,06	0,2%
Total		25 602 838,02	17 023 616,33	100,0%

Ces dépenses peuvent être visualisées à travers le graphique suivant :

Graphique 3.1.2 : Répartition des prévisions des dépenses du PRISE en 2021 par source de financement

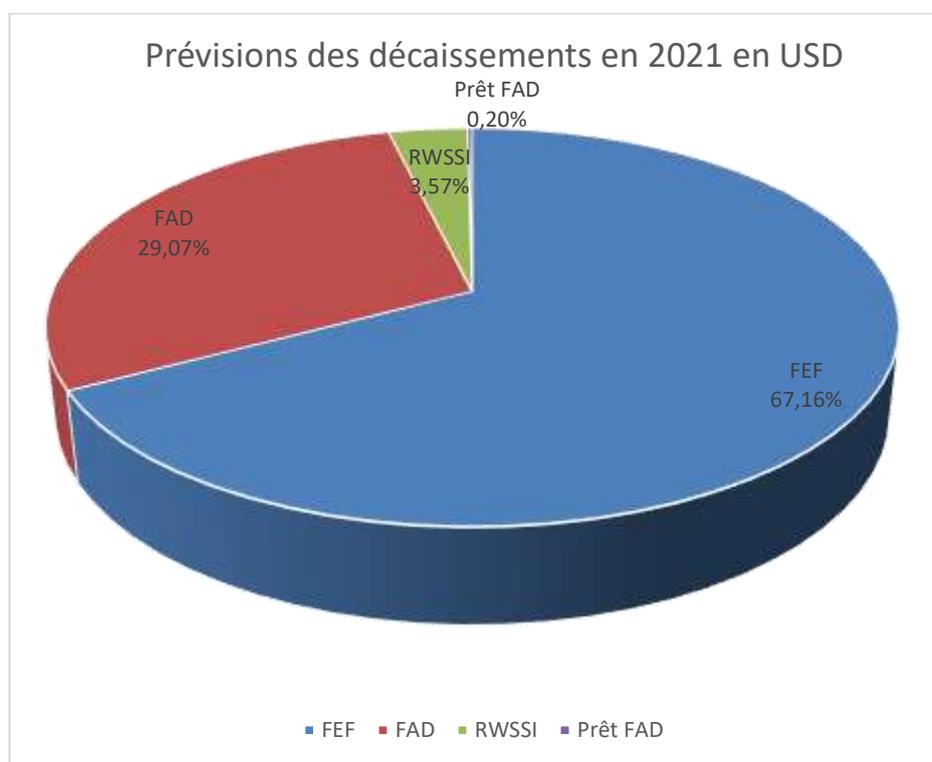

Les dépenses du Projet en 2021 proviendront essentiellement des Facilités pour les Etats Fragiles (67,16 %) et du don FAD (29,07%). Ces deux sources de financement représentent 96% des ressources du PRISE. Le RWSSI, avec 4% et le Prêt FAD du financement prévisionnel du PRISE pour cette année, ne participe que très faiblement aux dépenses du Projet.

Si on s'intéresse aux catégories des dépenses, on peut observer le tableau suivant :


Tableau 3.1.3 : Répartition des engagements et des dépenses prévisionnelles de PRISE en 2021 par catégorie

Composante	Nouveau Engagement 2021 en USD	Prévisions des décaissements en 2021 en USD	Prévisions des décaissements en 2021 en UC	Proportion prévisions des décaissements en 2021
Travaux	12 529 000,00	18 955 397,56	12 603 658,05	74,0%
Biens	133 928,57	410 242,23	272 774,70	1,6%
Services	2 882 694,67	5 273 044,23	3 506 106,70	20,6%
Fonctionnement	1 623 968,93	850 000,00	565 174,61	3,3%
Divers	114 154,00	114 154,00	75 902,28	0,4%
Total	17 283 746,17	25 602 838,02	17 023 616,34	100,0%

On observe que les travaux et les services se voient attribuer la grosse part des engagements de 2021 du PRISE qui a prévu la signature des trois contrats d'AEP en milieu rural

De ce tableau, on peut tirer le graphique suivant sur les dépenses du PTBA 2021 par catégorie.

Graphique 3.3 : Répartition des dépenses prévisionnelles en 2021 par catégorie

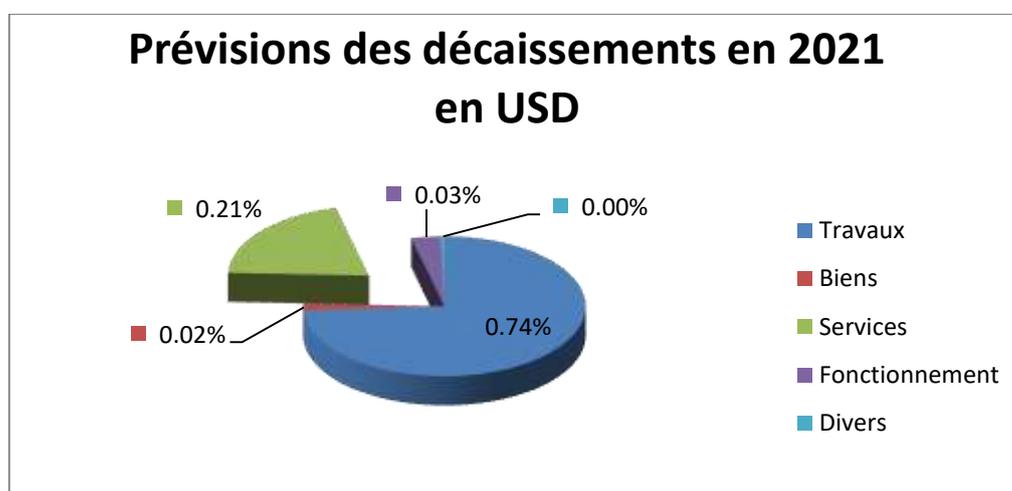

Il ressort de ce graphique que ce sont les travaux d'infrastructures qui représentent la meilleure proportion (74,04%) des dépenses prévisionnelles du Projet en 2021. Ils sont suivis par l'acquisition des services avec 20,60 % et le fonctionnement avec 3,3%. Le bien ne présente que 1,6% des dépenses des ressources annuelles.

Notons que ces 74,04 % des dépenses prévisionnelles des travaux pour l'année 2021 se répartissent comme suite :

- Les travaux des forages et mini-réseaux avec branchements particuliers dans les écoles et les centres de santé présentent 49,7%,
- Les travaux de Réhabilitation du réseau d'AEP de Mbuji-Mayi présentent 16,4% des dépenses prévisionnelles du PRISE pour l'année 2020.
- Les travaux de construction d'écoles, centres de santé et latrines représentent 8 % du PRISE pendant l'année 2021.

III. 2. EXECUTION FINANCIERE DU PTBA 2021

En ce qui concerne l'exécution du PTBA 2021, on peut se référer aux tableaux suivants qui donnent une analyse par composante, par catégorie et par source de financement.

Au 31 décembre 2021 par composante, le tableau suivant nous donne les informations pertinentes d'exécution du Projet.

Tableau 3.2.1. : Taux de réalisation du PTBA 2021 au 31 décembre 2021 par composante.

Projets/catégories	Budget de réalisation 2021			
	Budget/PTBA 2021 en USD	Flux de réalisation du 1 octobre au 31 décembre 2021 en USD	Réalisations du 01/10 au 31/12/2021 en USD	Taux de réalisation PTBA 2021 en %
	('3)	('4)	('5)	('6)=('5)/('3)
Infrastructures d'AEPA, sanitaires et scolaires	21 875 998	5 022 339	14 317 502	65,45%
Etudes et renforcement des capacités	2 676 048	91 542	115 004	4,30%
Coordination et gestion du projets	1 050 792	730 895	1 478 553	140,71%
Total	25 602 838	5 844 776	15 911 059	62,15%

Le PTBA 2021 avait prévu des dépenses de 25 602 838 USD et au 31 octobre 2021, le taux de réalisation de décaissement du PTBA est de 62,15 %. Des efforts doivent être fournis sur les travaux d'AEP qui constituent la plus importante activité du projet suivant la pondération budgétaire mais encore exécuté à 41%, les efforts doivent être doubler pour atteindre un taux de 85% à la fin de l'année 2022.

Tableau 3.2.2. : Taux de réalisation du PTBA 2021 au 31 décembre 2021 par catégorie

Projets/catégories	Budget de réalisation 2021			
	Budget/PTBA 2021 en USD	Flux de réalisation du 1 octobre au 31 décembre 2021 en USD	Réalisations du 01/10 au 31/12/2021 en USD	Taux de réalisation PTBA 2021 en %
TRAVAUX	18 955 398	4 516 683,82	12 696 249,37	66,98%
BIENS	410 242			0,00%
SERVICES	5 273 044	607 197	1 833 151	34,76%
Divers	114 154,00			0,00%
FONCTIONNEMENT	850 000	720 895	1 381 658	162,55%
Total	25 602 838	5 844 776	15 911 059	62,15%

Rien n'a été décaissé sur la catégorie des biens , cette categorie concerne pace que la facture sur les mobiliers scolaires a été renvoyée aux fournisseurs pour complement des soubassements.

Rien aussi n'a été décaissé dans la catégorie divers : En ce moment, la commission d'affectation de la Secrétaire Générale du ministère de genre, famille et enfants a été enterinée par le gouverneur de la province de Kasai oriental. Le comité de gestion de CMG est mise en place, l'ouverture des comptes pour les microcredits réallisé. La liste des associations beneficiaires des microcredits a été actualisée. Le compte RWSSI du projet PRISE doit être réactivé pour le Transfert des fonds vers le Centre multifonctionnel genre.

Pour la réalisation du PTBA 2021 par source de financement, on peut analyser le tableau suivant :

Tableau 4.2.3. : Taux de réalisation du PTBA 2021 au 31 décembre 2021 par source de financement

Projets/catégories	Budget de réalisation 2021			
	Budget/PTBA 2021 en USD	Flux de réalisation du 1 octobre au 31 décembre 2021 en USD	Réalisations du 01/10 au 31/12/2021 en USD	Taux de réalisation PTBA 2021 en %
Don FAD	7 442 417	2 610 352	6 342 896	85,23%
Prêt FAD	52 209	-	-	0,00%
Don RWSSI	912 824	198 723	893 042	97,83%
Don FEF	17 195 389	3 035 701	8 675 121	50,45%
Total	25 602 838	5 844 776	15 911 059	62,15%

Au 31 décembre 2021, un ralentissement dans l'utilisation des ressources du don FAD et don FEF est dû essentiellement au retard enregistré dans l'avancement des travaux des AEP en milieu rural et les travaux de l'AEP Mbuji-Mayi. Une amélioration dans l'utilisation du financement RWSSI dont 97,83% des prévisions de l'année ont été décaissées au 31 décembre 2021.

III. 3. EXECUTION PHYSIQUE DU PTBA 2021

Tableau 3.3.1. Asoption financière et Exécutions Physiques PTBA 2021 par composante

Composante	Prévisions des décaissements en 2021	Asorption du budget annuel 2021	Taux d'absorption en 2021 en %	Taux des des exécutions physiques en 2021 en %
Composante A	21 875 997	14 317 502	65%	73%
Composante B	2 676 048	118 795	5%	5%
Composante C	1 050 792	1 084 284	103%	100%
Total	25 602 837	15 520 580	61%	67%

Graphique 3.3.2.


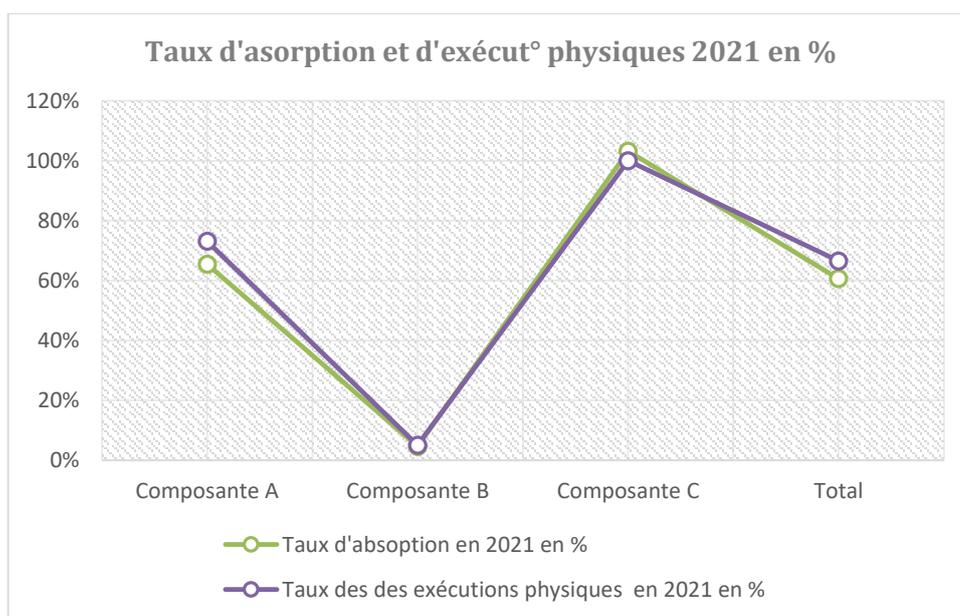


Tableau 3.3.3. Asoption financière et Exécutions Physiques PTBA 2021 par catégorie

Composante	Prévisions des décaissements en 2021	Asorption du budget annuel 2021	Taux d'absorption en 2021 en %	Taux des des exécutions physiques en 2021 en %
Travaux	18 955 397	12 696 249	67%	72%
Biens	410 242	-	0%	32%
Services	5 273 044	1 833 151	116%	47%
Fonctionnement	850 000	991 180	117%	117%
Divers	114 154	-	0%	0%
Total	25 602 837	15 520 580	61%	67%

Graphique 3.3.4.

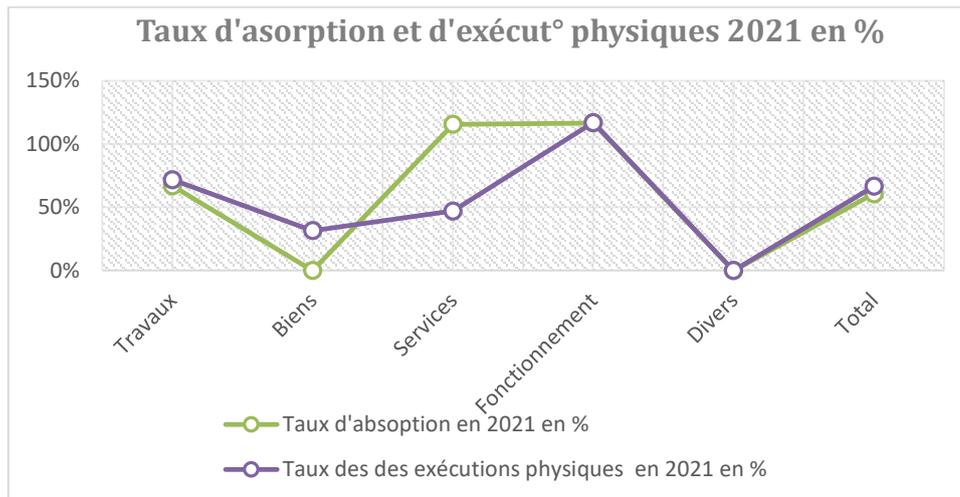

IV. SITUATION DES ACTIVITES DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2021 (suivi des marchés, exécution financière et exécutions physiques)

IV. 1. Situation des marchés au 31 décembre 2021 :

Au 31 décembre 2021, PRISE a signé 135 contrats ont été signés pour une somme de 126 075 982,6 USD et en considérant 5 840 213 USD qui est la somme des reconstitutions des fonds par le compte spécial FAD et le montant de 43 944 USD décaissé dans le compte RWSSI pour le voyage d'études, les engagements du PRISE au 31 octobre 2021 sont de 132 681 045 USD répartis par composante et catégorie de la façon suivante :

Tableau 4.1 : Répartition des contrats signés au 31 décembre 2021 par composante et catégorie

La somme totale des contrats signés 31 décembre 2022 répartis par composante dans le tableau suivant

Tableau 4.1 : Répartition des contrats signés au 31 décembre 2021 par composante et catégorie

La somme totale des contrats signés 31 décembre 2021 répartis par composante dans le tableau suivant:

Catégorie	Composante			Total
	Composante A	Composante B	Composante C	
Travaux	80	0	0	80
Biens	13	5	1	19
Services	8	9	16	33
Divers	0	3	0	3
Total	101	17	17	135

La composante A, a connu la signature de 101 contrats (soit 75 % de l'ensemble des contrats) dont 80 pour les travaux, 13 pour les biens et 8 pour les services tandis que les composantes B et C ont signé 17 contrats chacune ce qui fait une somme de 135 contrats signés pour l'ensemble du Projet au 31 octobre 2021.

Tableau 4.2 : Répartition des soldes à payer sur les engagements par composante au 31 décembre 2021

Composante	Coût total		Engagements au 31 décembre 2021		Décaissements au 31 décembre 2021		Solde à payer en USD
	Montant en USD	%	Montant en USD	%	Montant en USD	%	Montant en USD
Composante A	138 202 808	87,37%	119 953 954	90,41%	74 824 568	86,00%	45 129 387
Composante B	7 707 019	4,87%	4 088 810	3,08%	3 797 941	4,37%	290 868
Composante C	12 273 678	7,76%	8 638 280	6,51%	8 385 752	9,64%	252 528
Total	158 183 505	100%	132 681 045	100,00%	87 008 261	100,00%	45 672 783

Il ressort de ce tableau qu'une somme de 45 129 387 USD reste à payer sur les engagements réalisés dans la composante de développement des Infrastructures, la composante qui présente 90,41% de la totalité des engagements du projet. Dans la composante B qui concerne les études et le renforcement des capacités, une somme de **290 868 USD** reste à payer sur les engagements, la composante B présente **3,08%** de la totalité d'engagements du projet et une somme de 252 528 reste à payer

dans la composante de gestion et coordination du projet , cette composante presente 9,64% de la totalité d'engagements du projet.

Si on s'intéresse à la répartition, les soldes à payer sur les engagements par catégorie, le tableau qui suit nous renseigne.

Tableau 4.3 : Répartition des engagements et des décaissements de PRISE par catégorie au 31 décembre 2021

Catégorie	Coût total		Engagements au 31 décembre 2021		Décaissements au 31 décembre 2021		Solde à payer en usd
	Montant en USD	%	Montant en USD	%	Montant en USD	%	Montant en USD
Travaux	125 225 803	79,2%	109 324 003	82,40%	65 734 668	75,55%	43 589 335
Biens	6 644 419	4,2%	5 934 324	4,47%	5 613 446	6,45%	320 879
Services	14 421 783	9,1%	9 217 629	6,95%	7 455 060	8,57%	1 762 570
Fonctionnement	9 966 435	6,3%	6 561 108	4,95%	6 561 108	7,54%	0
Divers	1 925 065	1,2%	1 643 980	1,24%	1 643 980	1,89%	0
Total	158 183 505	100,0%	132 681 045	100,00%	87 008 261	100,00%	45 672 783

On observe qu'une somme de 43 589 335USD reste à payer sur les engagements de la catégorie travaux, cette catégorie présente 82,40% de la totalité d'engagements du projet.

Pour observer d'une manière brève et claire la réalisation des objectifs du projet , on peut lire le tableau suivant qui donne les produits sous contrats, le nombre des produits initialement prévus, achevés et en cours de réalisation.

IV. 2. Exécution physique du PRISE au 31 décembre 2021.

Le taux d'exécution physique global des activités du PRISE depuis 60 % au 31 décembre 2021, Il y a eu une augmentation de 6 points de % par rapport au taux d'exécution du projet au 31 octobre 2020. Une évolution du taux des exécutions physiques assez bonne. Notons que une lente évolution des travaux des AEP en milieu rural de certains contrats est observée mais d'une façon globale il y a un gain de 19 points par rapport au 31 décembre 2020 dont le taux des exécutions physiques était de 21% . une bonne avancée des travaux de l'AEP Mbuji-Mayi dont le taux des exécutions physiques est passé de 7% au 31 décembre 2020 à 41% au 31 décembre 2021.

Le taux moyen d'exécution physique des activités pour lesquelles PRISE a signé des contrats au 31 décembre 2021 est de 51 %. Il faut aussi noter que la moyenne qui a été calculée pour obtenir cet indicateur est une moyenne pondérée des taux d'exécution physique des activités.

Les tableaux suivants donnent les taux d'avancement des activités :

Tableau 4.5 : Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE par composante au 31 décembre 2021.

Composante	Coût Total en IUSD	Engagements en USD	Taux d'exécution physique	
			global	des activités engagées
Composante A	138 202 808	119 953 954	58%	47%
Composante B	7 707 019	4 088 810	60%	94%
Composante C	12 273 678	8 638 280	83%	84%
Total	158 183 505	132 681 045	60%	51%

Le tableau suivant nous renseigne sur l'exécution des travaux par catégorie.

Tableau 4.6 : Taux moyen d'exécution physique des activités du PRISE selon la catégorie au 31 decembre 2021

Catégorie	Coût Total en USDF en USD	Engagements en USD	Taux d'exécution physique (%)	
			Global	des activités engagées
Travaux	125 225 803	109 324 003	55%	44%
Biens	6 644 419	5 934 324	99%	99%
Services	14 421 783	9 217 629	70%	77%
Fonctionnement	9 966 435	6 561 108	80%	80%
Divers	1 925 065	1 643 980	94%	100%
Total	158 183 505	132 681 045	60%	51%

Toutes les activités engagées dans la catégorie diverse ont été exécutées à 100% et reste à engager l'activité des microcrédits pour financer les activités génératrices des revenus ainsi donc le taux d'exécution physique globale de la catégorie reste encore à 93,51%, le comité de gestion a été mise en place, le compte pour le microcredit est ouvert à la Banque Equity BCDC et la liste des 28 associations électionnées a été actualisée.

Tableau 4.4 : Taux d'engagement physique des produits par type d'infrastructures au 31 decembre 2021

Type d'infrastructure	Nombre contracté	Nombre prévu	Taux de production des ouvrages prévus	Nbre achevés	Encours	Non démarré
Latrines	505	494	102%	505	0	0
Ecoles	60	60	100%	60	0	0
Centres de santé	60	60	100%	60	0	0
CMG	1	1	100%	1	0	0
Bureau du Projet	2	2	100%	2	0	0
Direction Nationale de l'Hygiène	1	1	100%	1	0	0
Voirie urbaine (kms)	6,9	6,9	100%	6,9	0	0
AEP en milieu urbain	1	1	0%	0	1	0
AEP en milieu rural	60	60	10%	6	50	4

Les Centres de Santé, les écoles et les latrines publiques sont les infrastructures qui connaissent un taux d'exécution physique de 100%. Tous les travaux ont été achevés et remis au bénéficiaires. Tous les centres.

La voirie urbaine de Tshikapa de 6,9 km et 6,6 kilomètres linéaires de caniveaux en béton armé construits et 198,2ml de dalots ont été réalisés à 100% et le paiement a été effectué en totalité.

La réhabilitation des bâtiments administratifs est terminée avec des taux d'exécution de 100% pour les Bureaux du Projet, de la Direction Nationale de l'hygiène à Kinshasa et du CMFG avec des taux d'exécution physique et financière de 100%.

En ce qui concerne l'AEP en milieu rural, 6 contrats sont encours d'exécution présentant globalement un taux des exécutions physiques de 40%. En terme des travaux 29 forages sont réalisés sur 60 attendus, 18 chataux réalisés sur 60 attendus, 44 298,4 mètres linéaires réalisés sur environ 325 680 metres linéaires attendus.


En milieu Urbain, un contrat est en cours d'exécution pour les travaux de l'AEP Mbuji-Myi présentant un taux d'exécution physique de 41%, En terme de travaux 2 chateaux d'eau sont en cours de construction, 48 bonnes fontaines installés sur 208 attendues et 9 413 metres linéaires réalisés sur 181 371 metres linéaires attendus.

Sur le plan environnemental et social, le suivi est assuré par l'ACE et le Consultant individuel Environnementaliste du PRISE. Les chantiers disposent des PGES et des Experts Environnementaux des entreprises. Les activités du genre sont également bien suivies par le Projet avec les points focaux et l'Experte en Genre

IV. 3. Exécutions financières du PRISE au 31 decembre 2021.

L'ensemble des contrats signés et les engagements par le compte spécial du PRISE au 31 decembre 2021 représentent un montant de 132 681 045 USD. Le taux d'engagement au 31 decembre 2021 par rapport au budget global du Projet est actuellement de 83,88%. Les deux contrats signés pendant ce trimestre n'a pas impacté significativement le taux d'engagement du budget global du projet.

Graphique 4.1 : Taux de décaissement, d'engagement, de paiement et d'exécution physique des activités du PRISE au 31 decembre 2021.

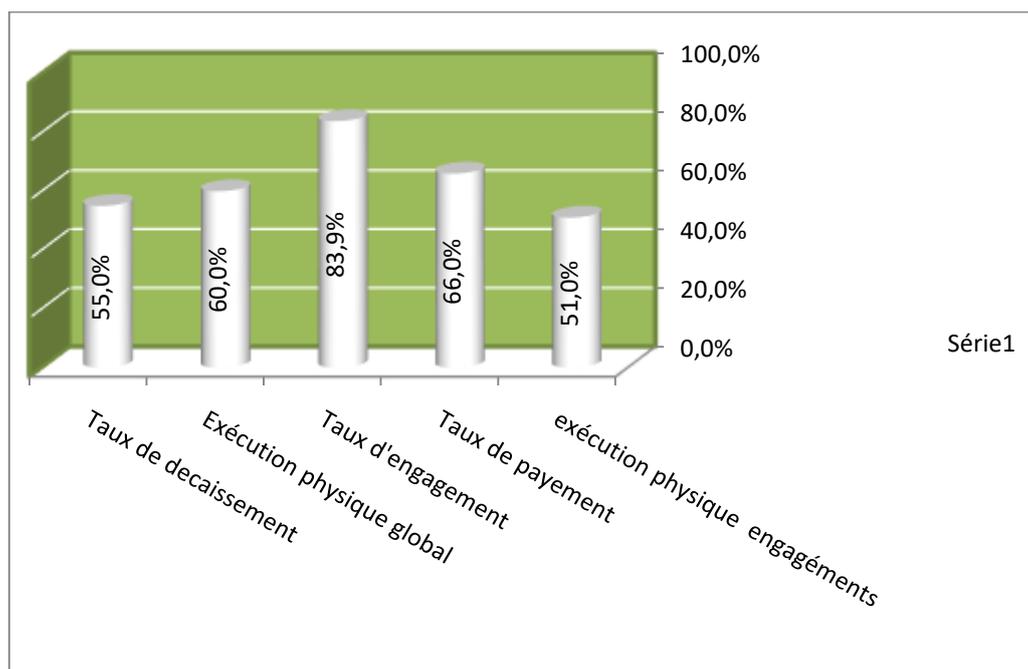

Il ressort de ce graphique que 83,8 % du budget global du projet a été engagé alors que l'exécution physique globale est de 60 % et le taux de décaissement est de 55 % en considérant le budget global du projet en dollars américains. Le taux de paiement est de 66 % et les taux des exécutions physiques sur les activités engagées est de 51%.


Tableau 4.8 : Taux de décaissement, d'engagement et de paiement (en USD) au 31 decembre 2021 par composante

<i>Composante</i>	<i>Budget Global</i>	<i>Décaissements en USD</i>	<i>Engagements en USD</i>	<i>Taux de décaissement</i>	<i>Taux d'engagement</i>	<i>Taux de paiement</i>
<i>Composante A</i>	138 202 808	74 824 568	119 953 954,48	54,1%	86,8%	62,4%
<i>Composante B</i>	7 707 019	3 797 941	4 088 809,92	49,3%	53,1%	92,9%
<i>Composante C</i>	12 273 678	8 385 752	8 638 280,12	68,3%	70,4%	97,1%
<i>Total</i>	158 183 505	87 008 261	132 681 045	55,0%	83,9%	65,6%

Au 31 decembre 2021, le taux d'engagements de la composante de développement des infrastructures est de 86,8% pour un taux de décaissement de 54,1% ;

De ce tableau, on peut tirer le graphique suivant :

Graphique 4.2 : Taux de décaissement et d'engagement au 31 decembre 2021 par composante

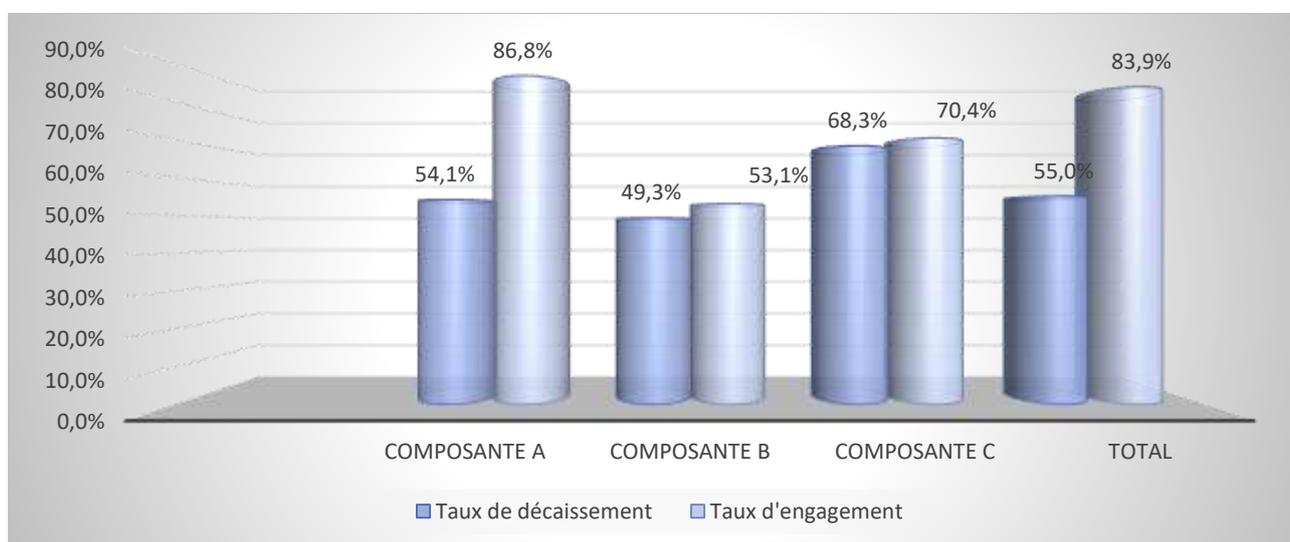

Il ressort de ce graphique que le taux d'engagement de la composante A présente 86,8 % de son budget global contre un taux de décaissement de 54,1% du budget global tandis que la composante B a un taux de décaissement de 49,1% et un taux d'engagement de 53,1 % les économies réalisées dans cette composante ont été réallouées à d'autres activités de la composante A. La composante C avec un taux de décaissement de 68,3% contre un taux d'engagement de 70,4% .

Tableau 4.09 : Taux de décaissement, d'engagement et de paiement au 31 decembre 2021 par catégorie.

<i>Catégorie</i>	<i>Budget Global en USD</i>	<i>Décaissements en USD</i>	<i>Engagements en USD</i>	<i>Taux de décaissement</i>	<i>Taux d'engagement</i>	<i>Taux de paiement</i>
<i>Travaux</i>	125 225 803	65 734 668	109 324 003	52,5%	87,3%	60,1%
<i>Biens</i>	6 644 419	5 613 446	5 934 324	84,5%	89,3%	94,6%
<i>Services</i>	14421782,92	7 455 060	9 217 629	51,7%	63,9%	80,9%
	9 966 435	6 561 108	6 561 108	65,8%	65,8%	100,0%
<i>Fonctionnement</i>						
<i>Divers</i>	1925065,015	1 643 980	1 643 980	85,4%	85,4%	100,0%
<i>TOTAL</i>	158 183 505	87 008 261	132 681 045	55,0%	83,9%	65,6%

En observant ce tableau nous constatons que le budget de fonctionnement a été ramené à 9 966 435 USD soit un supplément d'un montant de 4 140 031 USD y a été réalloué pour assurer la fonction de trois dernières années de la première phase du projet.

Graphique 4.3 : Taux de décaissement et d'engagement au 31 décembre 2021 par catégorie.


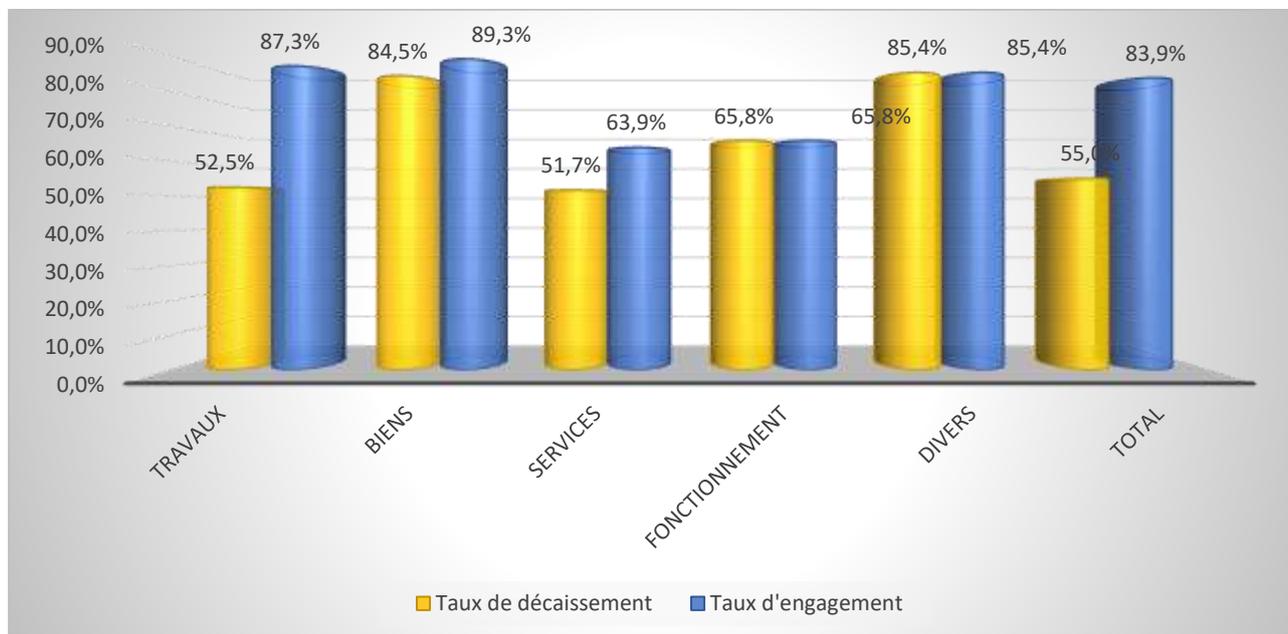


Tableau 4.10 : Taux de décaissement, d'engagement et de paiement au 31 décembre 2021 par source de financement

Source de Financement	Budget Global en USD	Décaissements en USD	Engagements en USD	Taux de décaissement	Taux d'engagement	Taux de paiement
Don FAD	65 459 859	30 577 694	51 754 684	46,7%	79,1%	59,1%
Prêt FAD	2 218 341	1 949 515	1 949 515	87,9%	87,9%	100,0%
RWSSI	7 787 505	3 600 186	4 667 355	46,2%	59,9%	77,1%
FEF	82 717 800	50 880 866	74 309 491	61,5%	89,8%	68,5%
Total	158 183 505	87 008 261	132 681 045	55,0%	83,9%	65,6%

Notons que les travaux de la lutte anti érosive pour la protection des ouvrages d'AEP de la REGIDESO à Tshikapa ont été achevés, réceptionnés définitivement et remis aux bénéficiaires. Le Prêt FAD présente un solde de 42 060,89 UC, le montant qui a été réaffecté pour les études géophysiques dans les 25 provinces de la RDC mais qui est prévu d'être annulé au courant de l'année 2022.

Graphique 4.4 : Taux de décaissement et d'engagement au 31 décembre 2021 par source de financement

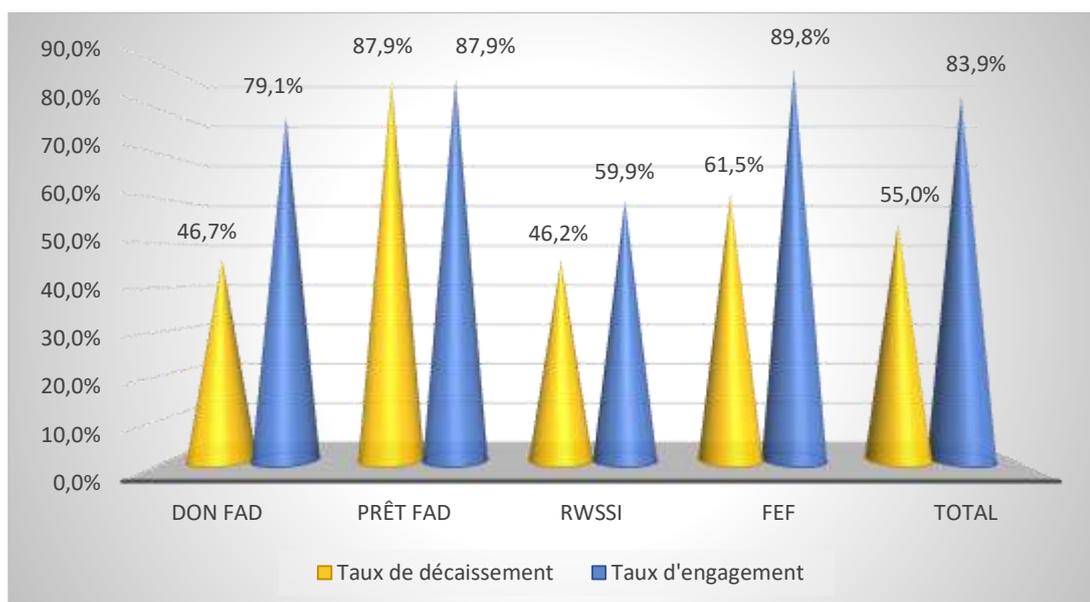

IV. 4. La prise en compte des aspects genre dans PRISE

Le Genre en tant que secteur transversal est impliqué dans toutes les composantes du Projet PRISE :

a. Composante Infrastructures d'AEPA, Sanitaires, Scolaires et Centre.

Dans le cadre de la composante Infrastructure du projet, un Centre Multifonctionnel genre a été construit à Mbuji-Mayi et équipé des mobiliers de bureaux, équipements informatiques ; 8 Motos SUZUKI TF 125 et 2 groupes électrogènes de 12 KVA chacun.

En 2017, des équipements complémentaires avaient été acquis et livrés au Centre. Il s'agit de : 6 congélateurs dont 2 électriques, 2 mixtes (pétrole et électricité) et 2 solaires ; 8 glacières isothermes et de collecte.

Les activités de la prise en compte de la dimension genre sont assurées par Un Point Focal National Genre qui y veille dans tous les aspects de mise en œuvre du projet.

b. Composante Etudes et renforcements des capacités.

Le comité de gestion du Centre Multifonctionnel Genre est entré officiellement en fonction au mois d'Avril de l'année 2021 grâce à l'Arrêté Provincial n° 01/003/ CAB.PROGOUV/K.OR/2021 portant nomination des membres du Comité de gestion du Centre Multifonctionnel Genre de MBUJIMAYI, Kasai Oriental qui abroge celui n° 017/CAB.PROGOUV/K OR du 12 juillet 2016 signé par Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province NGOYI KASANJLI.

Le CMFG dispose d'un atout, il constitue un cadre d'échange et carrefour de rencontre de toutes les femmes de Mbuji Mayi. La mise en œuvre des fonds microcrédits qui seront des légers appuis aux Associations des femmes dont 28 avaient déjà été sélectionnées et bénéficieront des microcrédits. Un compte bancaire a été ouvert en vue de loger les fonds relatifs à l'octroi des micro-crédits auprès de la Banque Commerciale de Mbuji Mayi, EQUITY BCDC, Agence de la même ville et des spécimens de

signatures des principaux Signataires, Gestionnaires du compte, qui vont l'engager ont également été déposés au niveau de la même Banque. Au mois de janvier 2022, les Associations éligibles aux microcrédits ont été approchées pour savoir si elles sont toujours partie prenante au processus, elles ont toutes attesté affirmativement par des correspondances écrites et ceci crée une certaine émulation à telle enseigne que celles qui attendent encore d'être sélectionnées ont écrit pour solliciter les crédits et une deuxième phase a été lancée en vue de demander aux Associations des femmes de soumettre leurs demandes en vue de les examiner selon le criterium établi. En janvier 2022, en vue de sécuriser les fonds et de donner du succès à ce processus qui semble être une grande première, Le Coordonnateur National a initié des rencontres avec ADVANS Banque, Une Institution financière en RDC qui a déjà fait ses preuves en matière des microcrédits et qui travaille déjà avec des Associations des femmes et d'autres parties prenantes au niveau de Mbuji Mayi. D'autres séances de travail sont prévues en vue d'approfondir les réflexions et ainsi jeter les bases d'un partenariat afin d'accompagner les femmes dans la gestion des microcrédits qu'elles recevront. Cette initiative s'avère indispensable en vue de sécuriser non seulement les fonds destinés aux microcrédits qu'on ne voudrait pas être dilapidés inutilement pour d'autres besoins certes vitaux mais il faudrait que les Associations qui recevront les crédits puissent les gérer pour rembourser, certes vrai mais également il faudrait que les fonds reçus soient remboursés mais qu'ils aident aussi à renforcer les activités des femmes dont on doit noter un changement remarquable par rapport à leur situation de départ. Il faut qu'elles arrivent à témoigner du bienfait des fonds reçus. Une comparaison avec la situation d'avant la gestion du crédit et celle d'après devra être faite.

Notons que le processus de passation des marchés pour l'acquisition des équipements supplémentaires est en cours pour renforcer la capacité de gestion du CMFG. Aussi signalons que les activités d'alphabétisation sont organisées au sein du CMFG tous les jours pairs et à ce jour, plus de 500 femmes ont déjà été formées en alphabétisation et elles ce sont les femmes et les filles mère pour la plupart. Il faut relever qu'il y a aussi des hommes et des garçons qui viennent aussi comme Apprenants. Cependant, il se dégage un constat que depuis que DON BOSCO a aussi commencé des cours d'alphabétisation moyennant un kit de nourriture à la fin de la journée de formation, on observe plus l'engouement du départ au niveau du CMFG. Toutes les Apprenantes et tous les Apprenants préfèrent aller chez DON BOSCO où ils reçoivent un petit colis à la fin de chaque journée afin de compenser le manque à gagner enregistré pour n'avoir pas vaqué à ses occupations de survie de routine plutôt que de venir au CMFG où ils ne reçoivent rien à la fin des formations.

c. Gestion et Renforcement des capacités.

De plus en plus de Partenaires manifestent un intérêt pour le CMFG et des propositions de collaboration sont en train d'être mises en place. C'est le cas de UNFPA, PNUD et HCR qui vont mettre en œuvre, dans les jours qui viennent un programme et ils ont décidé, après avoir visité le CMFG de capitaliser le cadre CMFG comme infrastructure en vue d'abriter les différentes activités des femmes et même du projet conjoint qui sera mis en place dans les prochains mois..

Les Femmes des différentes Associations qui fréquentent le CMFG ont déjà été bénéficiaires des formations et focus group organisés par UNFPA lors de leur séjour de travail à Mbuji Mayi au mois d'octobre 2019.

D'autres parties prenantes également en mission de travail à Mbuji Mayi visitent le CMFG et ne manquent pas de laisser leur impression positive sur le CMFG. C'est le cas de la Consultante en genre du BCGPCD (Bureau de Consultance en Genre, Participation Citoyenne et Développement, Madame Faïda Mwangilwa, Ancienne Ministre du Genre.

Les formations se poursuivent au niveau du CMFG en collaboration avec l'ONG ADID qui est une Association de la place et les brevets seront remis à l'issue de chaque session. Il sied de relever que le nombre des femmes et des filles apprenantes est toujours supérieur (23 pour la session en cours dont 14 jeunes filles) à celui des garçons et des hommes (12 dont 9 garçons et 3 hommes). Le nombre d'Apprenants augmente à chaque session de formation. L'intérêt pour ces formations est toujours grandissant pour tous ceux qui viennent surtout après avoir reçu leur certificat de participation, ce qui sert de stimulant pour les nouveaux Apprenants.

Il faut également relever le partenariat avec l'Antenne ENABEL (Coopération Belge) du Kasai basée à Mbuji Mayi qui manifeste de plus en plus d'intérêt à travailler avec les Associations Féminines affiliées au CMFG. A ce jour, déjà trois descentes sur terrain ont été réalisées avec la Responsable de la Commission économique du CMFG. Un rapport nous partagé a été analysé et un plan d'action a été élaboré en vue de planifier des actions futures. Le CMFG est de plus en plus sollicité pour des activités malgré la distance qui l'éloigne du Centre de la Ville de Mbuji Mayi. Tout récemment encore, on note qu'il y a de plus en plus d'activités qui se déroulent au niveau du CMFG notamment lors de l'organisation des différentes journées de la femme ou même des journées de sensibilisation sur le genre, la santé de la reproduction et autres. A la dernière descente du Point Focal Genre, en décembre 2020, un plaidoyer a été mené au niveau des Autorités Politico Administratives de la Ville en vue de les sensibiliser à orienter la tenue des toutes les activités et différentes manifestations vers le CMFG. A cet égard, une grande sensibilisation des filles sur les mariages précoces avait été organisée (250 jeunes filles) avec caravane motorisée du centre de la Ville de Mbuji Mayi vers la CMFG en vue d'attirer l'attention de tout le monde sur l'existence de ce Site. Cette activité s'est déroulée avec l'appui de UNFPA. Initialement planifiée pour Kananga dans le Kasai Central, l'activité a été orientée vers Mbuji Mayi en vue de donner un rayonnement et une visibilité au CMFG qui constitue une précieuse infrastructure moderne dans la Ville de Mbuji Mayi. Des stratégies de redynamisation sont en train d'être mises en place en vue de maximiser la rentabilité du CMFG et elles portent déjà les fruits notamment avec l'exposition permanente des produits des associations des femmes et la présence du Centre de santé à côté du CMFG fait que des boissons sont vendues dans la salle

IV. 5. Prise en comptes des aspects environnementaux

Sur le plan environnemental et social, le suivi est assuré par l'ACE et le Consultant individuel Environnementaliste du PRISE. Les chantiers disposent des PGES et des Experts Environnementaux des entreprises. Les activités du genre sont également bien suivies par le Projet avec les points focaux et l'Experte en Genre

a. Au niveau des Entreprises

Certaines mesures du PGES et les bonnes pratiques sont intégrées dans les clauses environnementales des dossiers d'appel d'offres (DAO) et les entreprises ont l'obligation de les mettre en œuvre sous la supervision du bureau de contrôle, de l'UGP et du Ministère chargé de l'Environnement (ACE).

Les Entreprises transmettent au projet PRISE le rapport mensuel de mise en œuvre des mesures du PGES et des bonnes pratiques sociales.

b. Au niveau du ministère chargé de l'Environnement

- Notons qu'un point focal du ministère de l'Environnement était détaché au niveau du projet malgré que la durée de son contrat fut échue tout au début des travaux.
- Les Experts de l'Agence Congolaises pour l'Environnement effectuent des missions ponctuelles

- pour l'évaluation des impacts environnementaux des travaux sur l'environnement,
- c. L'Expert en évaluation environnementale et sociale
- L'expert environnemental effectue des missions pour l'évaluation des impacts environnementaux et transmet et élabore le rapport au projet et le transmet et ce de manière trimestrielle.

Notons que les travaux de construction des écoles et des centres de santé n'ont pas eu d'impacts négatifs significatifs sur l'environnement.

Synthèse de l'appréciation des impacts des sous-composantes

Activités	Impacts Positifs	Impacts Négatifs
Equipements électromécaniques AEP Tshikapa	Majeur	Mineur
Fourniture et installation de citernes à gasoil pour AEP de Tshikapa	Majeur	Mineur à modérer
Travaux de 505 latrines publiques à fosses humides et à fosses sèches	Majeur	Mineur modéré par la sensibilisation et formations des usagers.
Travaux de construction de 60 écoles et 60 centres de santé	Majeur	Mineur modéré par l'aménagement de sol et installation de couverture végétale.
Travaux de construction du centre multifonctionnel Genre	Majeur	Mineur
Travaux de 6,9 voiries urbaines modernes dans le cadre de la protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa.	Majeur	Mineur, la répercussion sur le milieu n'était pas significative.

Notons que pendant ce trimestre une étude d'impact environnemental et social a été réalisée dans les dix provinces du projet PRISE Phase II où les sites d'interventions ont été identifiés.

V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES.

Au cours de l'exécution du Projet, depuis la signature des accords de financement, les difficultés suivantes ont été relevées :

- Faible performance des certaines Entreprises dans le respect du calendrier contractuel des travaux,
- On doit noter aussi le désistement de l'attributaire du Lot B Sankuru qui a contraint la Coordination de l'UEP/PRISE à relancer cette acquisition ;
- Lourdeur dans l'exonération de la fiscalité indirecte sur les importations des Entreprises de mise en œuvre du projet,
- Enclavement de la zone Centre qui ne permet pas l'approvisionnement en matériaux, on peut noter plus de six mois pour transporter une centaine des conteneurs de Lubumbashi à Mbuji-Mayi,
- L'absence de formations et les renforcements des capacités des experts du Projet ;
- Retard dans les ANO de la BAD, tels que les rapports de l'Audit Externe envoyé à la BAD en date du 29 juin 2021 n'avait reçu le feedback qu'au mois de septembre, les TDRS et AMI pour les Audits 2021, 2022 et 2023 envoyé à la Banque depuis le 11 août 2021 n'a pas encore reçu l'ANO de la Banque
- Risque de l'absence des missions de contrôle d'AEP rural si la Banque ne donne pas à temps l'avis sur les projets des contrats transmis. a reçu l'ANO de la Banque qu'à la date du 29/11/2021, ANO pour la signature par entente directe des contrats des missions de contrôle d'AEP Rural reçu le 22/12/2021 et pourtant la requête était transmise à la date du 06/10/2021. Il faut signaler que la BAD a exigé que ces contrats doivent être approuvés par l'Autorité Nationale Compétente à cet effet, exigence qui n'existe pas dans les accords et occasionné des blocages.

VI. CONCLUSION

Les Prévisions du Plan de Travail et budget annuel du PRISE pour l'année 2021 étaient de 25 602 838 USD essentiellement destinées à financer les activités de la composante développement des Infrastructures Socio-Economiques représentant 85,4% de financement, la composante études et renforcement des capacités ne finance le budget annuel que de 10,5% et 4,10% du budget était prévu pour la composante gestion de projet.

Par catégorie, ce sont les travaux avec 74,0% qui prenaient la grande partie des dépenses prévisionnelles par catégorie, les biens avec 1,6%, les services avec 20,6% et le fonctionnement avec 3,3% Les Divers n'intervenaient que faiblement dans les dépenses prévisionnelles du PRISE en 2021 avec 0,4%.

Par les sources de financement, c'est du FEF (67,2%) et du FAD (29,1%) que le PTBA du PRISE devrait tirer 96% de ses ressources financières et le RWSSI devrait intervenir à 3,6% du budget prévisionnel de l'année 2021.

Depuis le début du projet, la composante A. a connu la signature de 101 contrats (soit 75 % de l'ensemble des contrats) dont 80 pour les travaux, 13 pour les biens, 8 pour les services tandis que les composantes B et C ont connu respectivement la signature de 17 contrats et 17 contrats.

Au 31 décembre 2021, PRISE a signé 135 contrats pour une somme de 126 119 937USD et en considérant 6 561 108 USD qui est la somme des reconstitutions des fonds par le compte spécial FAD et le montant de 43 944 USD décaissé dans le compte RWSSI pour le voyage d'études, les engagements du PRISE au 31 octobre 2021 sont de 132 681 045 USD des engagements du projet soit un taux d'engagement de 83,88 %.

Sur les prévisions budgétaires annuelles de 25 602 838 USD, **15 911 059 USD** ont été décaissés au 31 décembre 2021 soit un taux de décaissement du PTBA de **62,15%**. Un cumul des décaissements **87 008 261,3** d' USD soit un taux de décaissement de **55 %** par rapport aux 158 183 505 USD présentant le budget global du Projet au taux initial de conversion dollars-unités de compte. En ce moment, le cumul de décaissement au 31 décembre 2021 en Unités de compte équivaut à **62 418 624,22 UC** soit un taux de décaissement de 59 % par rapport au **105 178 000 UC** le budget global du PRISE en unités de compte, laissant une somme disponible de **42 759 375,78 UC** à décaisser à la BAD pour la durée restante du projet.

D'une façon globale, le taux des exécutions physiques des activités du projet est de 60 % et le taux des exécutions physiques sur les marchés signés est de 51 %.

La composante A vient d'atteindre 58 % de taux global d'exécutions physiques mais encore faible à cause de la lenteur dans les travaux des AEP en milieu rural de deux contrats qui posent problème dans l'avancement d'activités et un autre contrat d'AEP en milieu rural qui a été démarré au cours de l'année 2022.

Notons que plus de 89% de la durée du projet avait été consommée au 31 décembre 2021 et les travaux qui présente 79% des ressources du projet a été exécuté à 58 % mais les travaux d'AEP en milieu rural qui représente le sous secteur du projet le plus important du projet présente encore un taux d'exécutions physiques de 40%. Ainsi il a été planifier de travailler de façon à atteindre un taux des exécutions physiques de 85% à la fin de l'année 2022 et achever tout les travaux au 30 juin 2023 date prévu pour l'achèvement du projet .

Au titre des risques et recommandations,

Il y a lieu de noter :

- ▶ Pas de renforcement des capacités de l'équipe de l'exécution du projet de renforcement des infrastructures socio-économique dans la région centre de la RDC(PRISE).
 - Faiblesse de performance dans le suivi de la mise en œuvre des activités du projet,
 - ☞ **Dispositions nécessaires doivent être prises pour organiser le renforcement des capacités des cadres et agents du ministère de Développement Rural.**
- ⇒ Des formations en Internationales sont planifiées pour l'année 2022,
- ▶ Lenteur dans l'exécution des travaux d'AEP en milieu rural
 - impacte négatif sur l'achèvement des travaux avant la durée du projet,
 - ☞ **Dispositions nécessaires sont à prendre de la part du gouvernement et de la BAD pour achever les travaux d'AEP en milieu rural avant le 30 juin 2023 date prévue pour l'achèvement des travaux au niveau du SGDR,**
- ▶ Retard dans le recrutement des structures gestionnaires des AEP en milieu rural, étant donné que plus ou moins douze mini réseaux d'AEP sont presque prêts à les rendre fonctionnels.
 - Ce retard va impacter négativement sur la pérennisation de l'activité des mini-réseaux d'AEP en milieu rural.
 - ☞ **Dispositions sont à prendre pour une gestion efficace des mini-reseaux afin de pérenniser les acquis du projet dans le sous secteur d'AEP en milieu rural.**

VII. ANNEXES

QUELQUES PHOTOS DES REALISATIONS AU 31 DECEMBRE 2021

QUELQUES PHOTOS DES REALISATIONS AU 31 DECEMBRE 2021

1. 60 Bâtiments Scolaires et 60 centres de santé construits



Centre de Santé MPKO



Hall de causerie



Salle d'accouchement



Le Centre de santé Edinga construit dans le territoire de Lodja Province du Sankuru





Situation actuelle



CS d'Edinga C-065 Lodja



CS d'Edinga Lodja C-065

E.P. NGOYI II à LUPUTA dans le territoire de LUILU, province de LOMAMI.
Situation avant



Situation actuelle



2. 505 latrines sont construites dans les écoles, les centre de santé, bureaux administratifs et les marchés dans les cinq provinces démembrées de l'ex-province de Kasai Occidental et l'ex-province de Kasai Oriental.
3. 7 kilomètres asphaltés et structures de lutte anti érosives pour la Voirie de la ville de Tshikapa dans le cadre de protection des ouvrages de l'AEP Tshikapa de la Regideso.

Situation avant



4. 32 Espaces à vivre construits dans l'espace grand Kasai encours de 60 mini-réseaux encours



Espace à vivre, construit à Kabeya kamwanga



Espace à vivre, construit à Lukelenge



12 mini-réseaux construits et 48 autres sont encours



Châteaux d'eau de Tshidimba



Châteaux d'eau de Lukalaba



Châteaux d'eau de Tshimbombo



Deux Châteaux d'eau de l'AEP Mbuji Mayi encours de construction



